



제136회 임시회 행정위원회
현장방문 보고자료



영 등 포 구
(교육지원담당관)

문래정보문화 도서관 건립현황

우리 구 관내 문래동에 건립된 검찰직원숙소 단지내 주민복지시설을 무상위탁 받아 지역주민들이 생활권내에서 편리하게 이용할 수 있는 복합 문화공간의 도서관을 신설하여 운영에 철저를 기하고자 함.

I 공사 개요

- 시설 명 : 문래정보문화도서관
- 위 치 : 영등포구 문래동3가 98,98-1
- 시설규모
 - ▷ 층 수 : 지하1층/지상5층 , ▷ 대지면적 : 1,466m²
 - ▷ 연 면 적 : 1,796,44m²
- 공사기간 : 2008. 1~ 5
- 총사업비 : 978백만원(전액구비)
- 소 유 주 : 법무부(관리청 : 대검찰청)
- 층별 용도 및 면적

구 분	바닥면적(m ²)	용 도	비 고
계	1,796.4		
지하1층	137.28	기계실, 전기실	
지상1층	278.96	어린이열람실, 홀	
지상2층	275.06	관리실, 도서정리실, 문화교실(강좌실)	
지상3층	368.38	종합자료실, 보조서고	
지상4층	368.38	열람실(여), 전자정보열람실	
지상5층	368.38	열람실(남), 매점, 카페테리아	
공 통	20.61	계단, 엘리베이터	

II 추진경과

- 2005. 2 남부지원 이전부지 검찰숙소 건립관련 민원(주민복리시설)요구
- 2005. 3 주민복리시설 위·수탁운영(도서관) 의견조희(법무부⇒영등포구)
- 2006.10 지역주민 및 우리구 의견 법무부 전달(도서관건립요구)
- 2007.11 시설관리협약체결(우리구 무상사용)
 - 협약기관 : 영등포구⇔법무부(소유주)⇔대검찰청(관리청)
 - 관리기관 : 2008. 1. 1 ~ 2010.12.31(3년단위 재연장)
- 2007.11 주민복리시설 건립준공(외부 및 실내일부)
- 2007.11 준공검사
- 2008. 1 주민복리시설 인수·인계
- 2008. 5 도서관 시설내부 칸막이(인테리어) 공사 추진

III 향후추진계획

- 도서자료·시설장비 등 도서관 물품구매 및 시스템구축 : '08. 5~ 7월
- 도서관 관리·운영 위·수탁 : '08. 5월
- 도서관 운영인력 임용 및 배치 : '08. 5월
- 도서관 개관 : '08. 8월(예정)


IV 기대효과

- 문래동 및 주변일대 정보문화 인프라 구축으로 구민수요 충족
- 지역주민들 간의 커뮤니티 공간 및 교육의 장으로 활성화

□ 도서관 현황



위 치 도

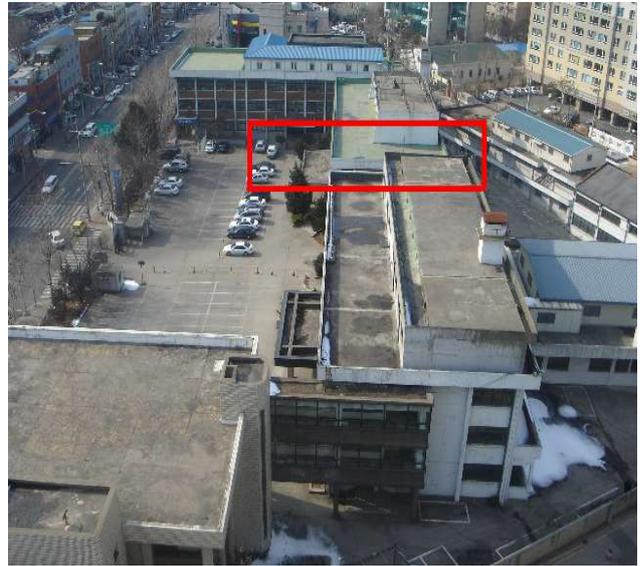

건립부지



도 서 관(실제모습)

선유정보문화 도서관 건립현황

지식정보 인프라의 핵심기관인 공공도서관에 대한 국민 수요가 증가함에 따라 생활권 중심에서 지역주민들이 편리하게 이용할 수 있는 복합문화공간의 도서관을 건립하고자 함.

I 공사 개요

- 시설명 : 선유정보문화도서관
- 위치 : 영등포구 양평동3가 88-1
- 시설규모
 - ▷ 층 수 : 지하1층/지상5층 , ▷ 대지면적 : 896.2m²(구유지)
 - ▷ 연면적 : 2,339.93m²
- 공사기간 : 2007. 9 ~ 2008. 10
- 총사업비 : 8,595백만원
 - (국비 987, 시비 720, 특별교부금 2,500, 구비 4,388)
- 층별용도 및 면적

구분	바닥면적(m ²)	용도	비고
계	2,339.93		
지하1층	539.73	주차장, 기계실, 전기실, 발전기실, 창고	
지상1층	414.95	어린이열람실, 관리사무실, 통신실	
지상2층	380.78	도서정리실, 종합자료실, 창고	
지상3층	347.28	문화강좌실, 종합자료실, 전자정보열람실	
지상4층	344.29	열람실	
지상5층	312.90	소공연장, 북카페, 창고, 방송실	
옥탑층	61.54	E.V 기계실, 공조실(면적제외)	

II 추진경과

- 2005. 4.22 선유정보문화도서관 건립계획 수립
- 2005.10.11 설계경기(현상공모)시행
- 2005. 7.25 서울시 투자심사 완료
- 2007. 1.10 설계용역 준공
- 2007. 8.29 기공식 개최
- 2007. 9. 5 공사착공
- 2008. 5월 현재 공정율 : 33%

III 향후추진계획

- 도서관 건립준공 : '08.10월
- 도서자료·시설장비 등 도서관 물품구매 및 시스템구축 : '08.10~'09.2월
- 도서관 관리·운영 위·수탁 : '09. 1월
- 도서관 운영인력 채용 및 배치 : '09. 1월
- 도서관 개관 : '09.3월(예정)

IV 기대효과

- 양평동 및 주변일대 정보문화 인프라 구축으로 구민수요 충족
- 지역주민들 간의 커뮤니티 공간 및 교육의 장으로 활성화

□ 도서관 현황



위 치 도



건립부지



조 감 도
