

제265회 구의회 임시회

2025. 10. 17. ~ 10. 27.

희망 행복 미래도시 영등포

2025년 주요업무 보고



도 로 과

보 고 순 서

I . 일 반 현 황 . . . 1

II . 주요업무 추진실적 . . . 4

III . 2026년 주요업무 추진계획 . . . 14

IV . 2026년 신규·중점 추진사업 . . . 22

I . 일반현황

1 조 직

도 로 과

- (6)개 팀

도로계획팀	도로개선팀	보도관리팀	도로굴착팀	도로조명팀	지하안전관리팀
- 도시계획시설 (도로) 개설 - 부당이득금 반환청구 소송	- 포장도로 유지관리 - 제설대책	- 보도유지관리 - 이동약자 안전 시설 유지관리	- 도로굴착허가 및 복구 - 도로굴착기금 운용관리 - 가공 배전선로 지중화 사업	- 가로등, 보안등 관리 - 노후조명시설 정비	- 지하안전관리 계획 수립 - 지하안전관리 규정 준수여부 및 실태점검 - 도로시설물 유지관리

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직 · 임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	35	-	1	6	13	6	8	-	1	-	-	-	-	-	-
현 원	32	-	1	7	6	9	9	-	0	-	-	-	-	-	-
과부족	△ 3	-	-	1	△ 7	3	1	-	△ 1	-	-	-	-	-	-

3 주요시설 및 장비

☐ 도로현황: 주요간선도로(경인로 외 27개 노선)

연장 390.6km		도 로 율
시도 76km	구도 314.6km	23.4% (서울시: 22.42%)

☐ 시설물 현황 (단위: 개소)

계	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입 체 교차로	보행육교 승 강 기
63	21	5	14	1	7	5	10

☐ 시설물 세부현황

교 량(21개소) - 시 관리	고가차도(5개소) - 시 관리
양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 선유교, 샛강다리, 한강교량(7개소 : 성산, 양화, 당산, 서강, 마포, 원효, 월드컵)	도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길
지하차도(14개소) - 시 관리	지하보도(1개소) - 구 관리
국회 앞, 여의2교, 목동교 동측, 오목교 동측, 성산, 신정교 동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속, 영등포, 대방, 여의교, 신월여의, 서부간선	여의초교 앞
보도육교(7개소) - 구 관리	입체교차로(5개소) - 시 관리
- (3종시설물 7개소) 우신초교 앞, 문래, 양평1, 양평2, 영등포역횡단, 선유도 기존, 노들로	영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측IC, 염창IC
보행육교 승강기(10개소) - 구 관리	
양평1보행육교, 양평2보행육교, 문래보행육교, 오목교, 영등포역 보도육교(북측), 영등포역 횡단보도육교(남측) 노들로승강기(북측), 노들로승강기(남측) 양평교 승강기(양평동), 양평교 승강기(안양천)	

☐ 조명시설

가 로 등 - 구 관리	보 안 등 - 구 관리
10,285개 (LED 9,735/94.7%)	9,828개 (LED 9,828/100%)

4

예 산 현 황

(단위: 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행률(%) (9. 30.기준)
계	15,431,085	11,136,195	72.2
도로건설을 통한 기반시설 확충	1,987,971	1,803,725	90.7
안전하고 체계적인 도로 및 시설물 유지관리	3,748,255	2,639,446	70.4
걷기 편한 보도환경 조성	3,270,100	1,992,946	60.9
주민 통행불편 가로환경 개선	712,730	712,227	99.9
밝고 안전한 도로조명시설 정비 및 유지관리	3,033,595	2,131,233	70.3
체계적인 도로시설물 및 지하안전 관리	1,891,276	1,356,951	71.7
인력운영경비	604,012	385,667	63.9
기본경비	183,146	114,000	62.2

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	신길동 4533-7~4524 외 3개소 도로개설공사	5
②	포장도로 유지보수공사	6
③	보행불편 해소를 위한 보도 정비공사	7
④	도로굴착복구기금 효율적 운용	8
⑤	가공 배전선로 지중화 사업	9
⑥	도로조명시설 개량 및 유지관리	10
⑦	도로시설물 유지보수공사	11
⑧	도로하부 공동조사 용역	12

1 신길동 4533-7~4524 외 3개소 도로개설공사 도로계획팀

장기미집행 도시계획시설(도로) 토지보상 완료구간에 대한 도로개설공사를 시행하여 도로 기능 유지 및 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

- 사업명: 신길동 4533-7 ~ 4524 외 3개소 도로개설공사
- 사업위치: 여의대방로23길 외 3(신길동, 대림동)
- 규모: 경계석 및 측구 929m, 아스팔트 정비 5,574㎡ 등
- 일부 저축 지장물 철거 포함(손실보상 및 협의 완료 구간)
- 사업기간: 2024. 7. ~ 2025. 12.(예정)

□ 주요 추진실적

- '24. 7. ~ 11.: 사업대상지 경계복원측량 및 실시설계용역 수행
- '25. 3. ~ 4.: 공사 발주 및 계약
- '25. 4. ~ 9.: 공사 시행 중



도로 경계 조정 및 노후 도로 정비

□ 향후계획

- '25. 12.: 공사 준공 및 도시계획시설(도로) 공사완료 공고

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
900,000 (시비)	544,477 (시비)	60.5

주민 생활에 불편을 초래하는 노후·파손된 도로를 신속히 정비하여 도로상 안전 사고를 예방하고 쾌적한 도로 환경 조성

□ 사업개요

- 공 사 명: 2025년 포장도로 유지보수공사
- 공사구간: 관내 전지역(구도 / 연장 314.6km, 면적 1.87km²)
- 규 모: 포장도로 정비 56,700m², 보도블록 포장 700m²
- 사업기간: '25. 3. ~ 12.
- 예 산 액: 2,435백만원(구비)

□ 주요 추진실적

- '25. 2. ~ 3.: 공사 발주 및 계약
- '25. 4. ~ 9.: 1~8차 공사 시행
 - 정비규모: 차도 정비 53,100m², 측구 및 경계석 550m
 - 정비 전후 사진



□ 향후계획

- '25. 12.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
2,435,000 (구비)	2,256,595 (구비)	92.7

3 보행불편 해소를 위한 보도 정비공사

보도관리팀

노후·파손·평탄성 불량 등 보행 불편사항을 적기에 해소하고 시각장애인, 휠체어, 유아차 이용자 등 보행약자의 안전하고 편리한 보행환경 조성

□ 사업개요

연번	사업명	위치	공사내용 (사업기간)	사업비 (천원)
	합 계	2건		4,698,000
1	관내 보도정비공사 (연간계약)	관내	• 보도블록 정비 8.900㎡ (’25. 1. ~ 12.)	3,657,000
2	이동약자 보행환경 개선공사(연간계약)	관내	• 턱나춤 및 점자블록 정비 120개소 (’25. 1. ~ 12.)	1,041,000

□ 주요 추진실적

○ ’25. 3. ~ 11.: 보도 및 턱나춤 등 정비

연번	사업명	정비실적
1	관내 보도정비공사 (연간계약)	보도블록포장 7,400㎡ 보·차도경계석 설치 4,442m, 측구 설치 3,095m
2	이동약자 보행환경 개선공사(연간계약)	턱나춤 및 점자블록 정비 110개소

□ 향후계획

○ ’25. 12.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,698,000 (국 1,000,000, 시 2,231,000, 구비 1,467,000)	2,879,189 (시 1,579,602, 구비 1,299,587)	61

4 도로굴착복구기금 효율적 운용

도로굴착팀

원활한 도로굴착복구공사 및 도로의 사후관리를 위한 기금의 합리적 운용 및 효율성 극대화로 건전한 재정운영과 수익성 제고

□ 사업개요

- 도로복구 원인자부담금 수입 및 기금의 이자수입을 통한 기금 조성
- 회계연도마다 기금운용계획수립, 이행점검 및 결산보고서 작성
- 기금 사용의 용도
 - 도로굴착복구공사, 노후불량도로정비, 불량맨홀 정비 등

□ 주요 추진실적

- 기금 조성 현황('25. 9월말 기준)

(단위: 백만원)

2024년 조성액(①)	2025년 운용			2025년 조성액(①+④)	비고
	수입(②)	지출(③)	증·감 (④=②-③)		
7,387	4,215	1,440	2,775	10,162	

- '25. 1. ~ 9. : 도로 정비(기금 사용)

연번	공 사 명	정비실적
1	도로굴착복구공사	아스콘포장 4,740㎡, 보도블럭포장 3,888㎡ 측구 정비 1,230m, 경계석 정비 720m
2	노후불량도로정비공사	아스콘포장 9,260㎡, 보도블럭포장 812㎡ 측구 정비 1,340m, 경계석 정비 1,000m
3	불량맨홀정비공사	불량맨홀 정비 130개소

□ 향후계획

- '25. 12.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,000,000 (기금)	3,087,322 (기금)	77.2

5 가공 배전선로 지중화 사업

도로굴착팀

무질서하게 서 있는 전력, 통신용 전주 및 공중선이 도시 미관을 저해하고, 자연재해 시 사고발생 등으로 이어짐에 따라 도심 지역 지중화 필요성 증대

□ 사업개요

○ 사업기간: '20. 1. 1. ~ '27. 12. 31.

(단위: 백만원)

연번	도로명	시점	종점	규모(m)	공사비	추진현황
1	양평로	양평동사거리	당산역	300 (양방향)	4,237	- 관로공사 및 케이블공사 완료 - 전신주 철거 추진중
2	양평로	당산역	당산중학교 교차로	830 (양방향)	4,978	- 관로공사 및 케이블공사 완료 - 전신주 철거 완료 - 공사 준공 준비 중
3	신평로	신평역	영진아파트 앞	600 (양방향)	4,351	- 관로공사 완료 - 케이블공사 완료 - 전신주 철거 추진중
4	당산로	영등포구청역	영등포유통상가 교차로	540 (양방향)	2,871	- 관로공사 완료 - 케이블공사 완료 - 전신주 철거 추진중
5	당산로	영등포구청역	당산역	1,500 (양방향)	9,238	- 협약서 체결완료 - 공사설계 시행완료 - 2025.10. 착공

□ 주요 추진실적

- '24. 6.: 당서초 그린뉴딜 지중화사업 실시설계 완료(한전)
- '24. 7.: 당서초 그린뉴딜 지중화사업 통신관로(kt) 이행협약 완료
- '24. 8.: 당서초 그린뉴딜 지중화사업 지상기기 위치 협의완료
- '25. 9.: 당서초 그린뉴딜 지중화사업 공사 분담금 납부 완료

□ 향후계획

- '25. 12.: 당산로 및 신평로 지중화 케이블 매립공사 완료
- '26. 12.: 당서초 그린뉴딜 지중화 사업 관로공사 완료
- '27. 12.: 당서초 그린뉴딜 지중화 사업 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
712,730 (구비)	712,227 (구비)	99.9

도로조명시설 개량 및 유지관리로 야간에 밝고 안전한 도로환경 조성을 통해 야간 주민들의 보행 안전 및 도시 미관 저해요인 해소

□ 사업개요

구 분	사 업 명	사업개요	사업기간	예산액 (백만원)	비 고
합 계				1,925	
도로조명시설 유지관리 (연간계약)	가로등 시설물 정비공사	가로등 유지관리 (10,285개)	'25. 1.~12.	240	구비
	보안등 시설물 정비공사	보안등 유지관리 (9,828개)	'25. 1.~12.	400	
노후 도로조명시설 개량	노후 도로조명시설 정비공사	가로등 교체 (42본) 케이블 정비 (860m)	'25. 5.~10.	500	특교금
	여의대방로 가로등 정비공사	가로등 교체 (48본) 케이블 정비 (1,440m)	'25. 5.~10.	560	시비
	골목길 노후 보안등 정비공사	보안등 교체 (102등) 양방향 점멸기 설치 (333개)	'25. 5.~ 9.	225	구비

□ 주요 추진실적

- 도로조명시설 유지관리(2건)
 - '25. 1. ~ 9. : 가로등 및 보안등(연간계약) 작업지시 4차 시행 중
- 노후 도로조명시설 개량(3건)
 - '25. 5. ~ 9. : 가로등 정비공사(2건) 시행중(공정률 80%)
 - '25. 5. ~ 9. : 골목길 노후 보안등 정비공사(공정률 90%)

□ 향후계획

- '25. 9. : 골목길 노후 보안등 정비공사 준공
- '25. 10. : 가로등 정비공사(2건) 준공
- '25. 12. : 도로조명시설 유지관리(2건) 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,925,000 (시 1,060,000, 구비 865,000)	1,585,530 (시 948,132, 구비 637,398)	82.4

공공 도로시설물·도로부속물의 지속적인 유지관리 및 노후·파손 시설의 신속한 보수로 안전하고 쾌적한 시설환경 조성

□ 사업개요


- 사업명: 2025년 도로시설물 설치 및 보수공사(연간계약)
- 위치: 영등포구 관내
- 기간: '25. 1. ~ 12.
- 사업비: 810백만원(시 170, 구 640)
- 규모: 과속방지턱 보수(도색) 1,200 m^2 , 구조물 세척 3,600 m^2 , 구조물 도장(보도육교 등) 및 보수, 보행자 방호울타리 설치 및 보수 등

□ 주요 추진실적

- '25. 1. ~ 2.: 실시설계 및 공사 발주
- '25. 3. : 공사 계약 및 착공
- '25. 4. ~ 9.: 1~3차 작업지시 완료 및 4차 작업지시 시공 중
- 시설물 도색, 석축, 계단 보수 등



계단 정비 전

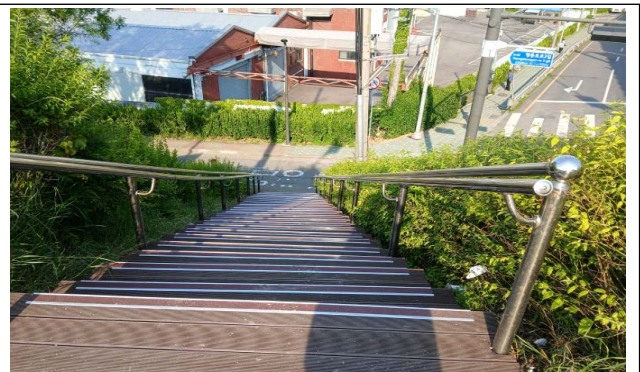

계단 정비 후

□ 향후계획

- '25. 12.: 공사 준공

□ 예산현황

(단위: 천원)

예산액	집행액	집행률(%)
810,000 (시 170,000, 구비 640,000)	583,376 (시 70,000, 구비 513,376)	72

관내 도로의 효율적인 관리를 위해 공동탐사(GPR탐사)를 실시하여 지반 침하로 인한 불안 해소 및 안전한 도로환경에 기여

□ 용역개요

- 용역명: 2025년 도로 하부 공동조사 용역
- 위치: 영등포구 당산동·양평동(구도) 및 긴급 탐사 구간
- 규모: 탐사연장 129.8km(차선적용: 당산동·양평동 56km, 긴급 10km, 특별 63.8km)
 - 긴급탐사 구간: 지하굴착 공사장(건축현장), 도로침하 민원 구간 등 수시점검 시행
- 용역비: 254백만원(시 110, 구 144)
- 기간: '25. 2. ~ 12.

□ 도로 하부 공동조사 권역도



☐ **주요 추진실적**

- '25. 2. ~ 3.: 실시설계 및 용역 발주
- '25. 4. : 용역 계약 및 착수
- '25. 5. ~ 9.: 도로하부 GPR(지표투과레이다) 탐사 시행

☐ **향후계획**

- '25. 10. : 공동원인 조사 및 신속복구(굴착복구 포함) 등
- '25. 11. ~ 12.: 용역 완료(조사결과 분석 및 종합보고서)

☐ **예산현황**

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
254,000 (시 110,000, 구비 144,000)	199,000 (시 89,000, 구비 110,000)	78.3

Ⅲ . 2026년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

- ① 포장도로 유지보수공사 15
- ② 보행불편 해소를 위한 보도 정비공사 16
- ③ 도로굴착복구기금 효율적 운용 17
- ④ 도로조명시설 개량 및 유지관리 18
- ⑤ 도로시설물 유지보수공사 19
- ⑥ 도로하부 공동조사 용역 20

포장도로의 노후·파손 및 통행불편 구간에 대하여 우선 순위에 따른 단계별 정비 시행으로 쾌적한 도로환경 조성

□ 사업개요

- 위 치: 관내 전지역(구도)
- 사업기간: '26. 3. ~ 12.
- 규 모: 포장도로정비 65,600 m^2 (연장10.9 km /전체면적대비 3.49%)

※ 도로현황

합 계		구 도		시 도		구도면적
연장(m)	면적(m^2)	연장(m)	면적(m^2)	연장(m)	면적(m^2)	
390,665	4,416,634	314,665	1,877,794	76,000	2,538,840	- 도로율 : 23.4% - 서울시 9위

□ 세부 추진계획

- 사전점검 내실화 및 맞춤형 도로관리 시행
 - 정기(연2회), 수시(연5회) 점검을 통한 유해요인 사전 조치로 도로 및 시설물 기능 유지
 - 계절별 불편요인 집중관리(해빙기-균열, 재료 분리/ 우기-물고임, 함몰, 포트홀, 침하 등

□ 추진일정

- '26. 1. ~ 2.: 사업대상지 조사
- '26. 3. ~12.: 공사 시행

□ 소요예산: 총 3,162,600천원(구비)

2 보행불편 해소를 위한 보도 정비공사

보도관리팀

노후·파손·평탄성 불량 등 보행불편 사항을 적기에 해소하고 시각장애인, 휠체어, 유아차 이용자 등 보행약자의 안전하고 편리한 보행환경 조성

□ 사업개요

연번	사업명	위치	공사내용	사업비(천원)
	합 계	2건		2,700,000
1	관내 보도정비공사	관내	• 보도정비 15,000㎡	2,000,000
2	이동약자 보행환경 개선공사	관내	• 턱낮춤 205개소, 점자블록 정비 400㎡	700,000

□ 세부 추진계획

- 불량·노후 보도에 대하여 중장기 정비계획 수립 후 순차적 정비 시행
- 보행약자의 안전하고 편리한 보도환경 조성
 - 횡단보도 부분 턱낮춤 정비(부분 턱낮춤 → 전체 턱낮춤)
 - 보도 턱낮춤 구간 단차 제거(1cm이하 → 0cm)
 - 규정에 맞지 않는 점자블록 정비

구분	노후보도 정비	횡단보도 턱낮춤	점자블록 정비
개선 전			
개선 후			

□ 추진일정

- '26. 1. ~ 2. : 공사 설계 및 발주
- '26. 3. ~ 12. : 공사 시행

□ 소요예산: 총 2,700,000천원(구비)

3 도로굴착복구기금 효율적 운용

도로굴착팀

원활한 도로굴착복구공사 및 도로의 사후관리를 위한 기금의 합리적 운용 및 효율성 극대화로 건전한 재정운영과 수익성 제고

□ 사업개요

- 도로복구 원인자부담금 수입 및 기금의 이자수입을 통한 기금 조성
- 회계연도마다 기금운용계획수립, 이행점검 및 결산보고
- 기금 사용의 용도
 - 도로굴착복구공사, 노후불량도로정비, 불량맨홀 정비 등

□ 세부 추진계획

- 2026년 도로굴착복구기금 조성 계획

(단위: 백만원)

2025년 조성액(①)	2026년 운용계획			2026년 조성액(①+④)	비고
	수입(②)	지출(③)	증·감 (④=②-③)		
7,705	4,743	4,510	233	7,938	

- 2026년 도로굴착복구기금 사업 현황

(단위: 백만원)

연번	사 업 명	예 산 액	사업개요
계		4,500	
1	도로굴착복구공사	3,500	아스콘포장 13,000㎡, 보도블럭포장 3,000㎡ 등
2	노후불량도로정비공사	650	아스콘포장 4,000㎡, 보도블럭포장 1,000㎡ 등
3	불량맨홀정비공사	350	불량맨홀 정비(1,400천원*250개소)

□ 추진일정

- '26. 2.: 2025회계연도 도로굴착복구기금 결산보고
- '26. 3.: 2026년 관내도로굴착복구공사 및 불량맨홀정비공사 발주 및 공사시행
- '26. 7.: 2025년 도로굴착복구기금 성과분석보고
- '26. 9.: 2027회계연도 도로굴착복구기금 운용계획 보고
- '26. 12.: 2026년 관내도로굴착복구공사 및 불량맨홀정비공사 준공

□ 소요예산: 총 4,500,000천원(구비)

도로조명시설의 고장, 파손 등의 민원 발생 시 신속하게 정비하고, 민원 발생이 잦은 노후 도로조명시설을 개량하여 밝고 안전한 도로환경 제공 및 전기안전사고 예방

□ 사업개요

구 분	사 업 명	사업개요	사업기간	예산액 (백만원)	비 고
합 계				1,613	
도로조명시설 유지관리 (연간계약)	가로등 시설물 정비공사	가로등 유지관리 (10,285개)	'26. 1.~12.	300	구비
	보안등 시설물 정비공사	보안등 유지관리 (9,828개)	'26. 1.~12.	500	
노후 도로조명시설 개량	버드나루로 가로등 정비공사	가로등주 교체(61본) 케이블 정비(2.3km)	'26. 1.~10.	690	시비 (요청)
	선유동1로 가로등 정비공사	가로등주 교체(14본) 케이블 정비(500m)	'26. 1.~10.	123	특교금 (집행잔액활용)

□ 세부 추진계획

- (유지관리) 야간 도로 이용자 불편 최소를 위한 상시 유지관리 추진
- (노후시설 개량) 주민의 안전사고 위험 및 미관 저해 구간에 대해
시비 및 국비 선제적 예산 확보를 통해 개량 추진

□ 추진일정

- (유지관리)
 - '26. 1. : 공사 발주 및 계약체결
 - '26. 2. ~ 12. : 수시 작업 지시 시행(민원 및 고장 등) 및 준공
- (노후시설 개량)
 - '26. 1. ~ 2. : 현장조사 및 추진계획수립
 - '26. 2. ~ 4. : 공사 발주 및 관급자재 구매
 - '26. 5. ~ 10. : 공사 착공 및 준공

□ 소요예산: 총 1,613,000천원(시 813,000, 구비 800,000)

공공 도로시설물·도로부속물의 지속적인 유지관리 및 노후·파손 시설의 신속한 보수로 안전하고 쾌적한 시설환경 조성

□ 사업개요

- 사업명: 2026년 도로시설물 설치 및 보수공사(연간계약)
- 위치: 영등포구 관내
- 기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업비: 800백만원(구비)
- 규모: 구조물 도장(보도육교 등) 및 보수 2,700 m^2 , 방호울타리 설치 및 보수 2,400m 등 1식

□ 세부 추진계획

- 관내 주요 도로시설물(육교, 옹벽 등)에 대한 정기안전점검 등을 통해 효율적이고 체계적인 보수·보강 조치
 - 육교 및 지하보도 8개소, 옹벽(석축) 30개소 등
- 어린이보호구역 등 무단 횡단 방지가 필요한 구간에 대한 현장 조사를 통해 무단 횡단방지시설(안전펜스) 설치 및 다중이용 밀집 지역의 노후파손된 펜스 보수·보강 등으로 안전사고 예방에 기여

□ 추진일정

- '26. 1. ~ 2.: 물량조사 및 실시설계
- '26. 3. : 공사 발주 및 착공
- '26. 12. : 공사 준공

□ 소요예산: 총 800,000천원(구비)

관내 도로의 효율적인 관리를 위해 공동탐사(GPR탐사)를 실시하여 지반 침하로 인한 불안 해소 및 안전한 도로환경에 기여

□ 사업개요

- 용역명: 2026년 도로 하부 공동조사 용역
- 위치: 영등포구 관내
- 기간: '26. 1. ~ 12.
- 사업비: 220백만원(구비)
- 규모: 총 탐사연장 100km(차선적용)
- 내용: 지표투과 레이더(GPR) 탐사를 통한 공동(空洞)조사 및 복구시행

구분	1권역 (24년)	2권역 (25년)	3권역 (26년)	4권역 (27년)	5권역 (28년)
행정동	여의도동	양평동 당산동	문래동 영등포동 영등포본동	신길동	도림동 대림동

□ 세부 추진계획



복구	신속		■ 유동성채움재로 공동 복구 - 소규모 공동 복구	용역사
	굴착		■ 원인 조사 및 보수 - 원인규명 및 보수 필요한 경우	도로과

☐ 추진일정

- '26. 1. ~ 2. : 물량조사 및 실시설계
- '26. 3. : 용역 발주 및 계약
- '26. 4. ~ 11. : 공동원인 조사 및 신속복구(굴착복구 포함) 등
- '26. 12. : 용역 준공

☐ 소요예산: 총 220,000천원(구비)

IV. 2026년 신규·중점 추진사업

1 보안등 양방향 IoT 점멸기 확대 설치

도로조명팀

야간 보행 안전 취약지역에 양방향 IoT 점멸기를 설치하여, 보안등 원격감시 및 제어를 통한 신속 정비로 야간 최상의 보행환경을 제공하고자 함

□ 추진방향

- 야간 보행 안전 취약지역에 양방향 IoT점멸기 연차별 확대 설치
- 주민신고 및 순찰로 고장 유·무 확인 후 정비하던 일반점멸기를 고장알림문자를 통해 신속히 확인가능한 IoT점멸기로 순차적 교체

□ 사업개요

- 사업기간: '26. 1. ~ 7.
- 위 치: 당산 1~2동 일대
- 규 모

합 계	일반점멸기	양방향 IoT점멸기	비 고
9,020대	6,389대(70.8%)	2,631대(29.2%)	

- 사업내용: 양방향 IoT점멸기(550대) 교체 (사업완료 시 교체율 35.3%)
- 총사업비: 190백만원(구비)

□ 세부 추진계획

- 양방향 IoT점멸기 설치가 필요한 지역으로 사업대상지 선정하여 추진
- 구비 외 국·시비 예산 확보 노력을 통해 지속적 확대 설치 추진

□ 추진일정

- '26. 1. ~ 2.: 설치대상지 현장 조사 및 공사 발주
- '26. 3. ~ 7.: 관급자재 구매, 공사 착공 / 준공

□ 소요예산: 총 190,000천원(구비)

겨울철 강설에 대비하여 제설대책본부를 운영하고 강설시 제설작업에 만전을 기함으로써 원활한 교통소통 및 주민 불편 사항을 최소화하기 위한 제설대책 추진

□ 추진방향

- 철저한 사전대비 및 제설대응체계 구축
 - 강설 사전예측으로 한발 앞선 초동 제설체계 유지
 - 설해 분야 현장조치 행동매뉴얼 작성 운영
- 취약지점 집중관리
 - 고가차도, 고갯길 등 취약지점 제설함 설치 운영
 - 취약지점 담당제 지정 운영
- 내 집, 내 점포 앞 눈치우기 자발적 참여 유도

□ 사업개요

- 사업기간: '25.11.15.~'26.3.15.(4개월)
- 대 상: 388.8km(간선도로 61.9km, 보조간선도로 및 이면도로 326.9km)
- 단계적 근무체계

구 분 \ 단계별	평 시	보 강	1 단계	2 단계	3 단계
상황 기준	상황실 운영 (24시간)	강수확률 30%이상 기온 2°C미만 적설량 1cm미만	강설예보시 (적설량 5cm 미만 예보시)	대설주의보 발령시 (적설량 5cm 이상 예보시)	대설경보 발령시 (적설량 10cm 이상 예보시)
제설 총괄 지휘	도로개선팀장		도로과장	안전교통국장	구 청 장 (부구청장)
총 근무 인원	1명	13명	150명	565명	905명

□ 세부 추진계획

- 제설작업 민간위탁 용역 추진
 - 사업규모
 - 장 비: 덤프트럭[15톤(5대), 5톤(5대), 1톤(23대)], 백호 2대
 - 인 력: 44명(상황요원 2명, 작업반장 1명, 작업인부 6명, 운전원 35명)
 - 예 산 액: 470,045천원

- 자동제설장비(도로열선) 설치 추진
 - 설치위치: 신길종합사회복지관 외 4개소
 - 규 모: 도로열선 설치 L=669m
 - 예 산 액: 690,000천원 【명시이월】

□ 추진일정

- '25. 10.: 제설자재 구입 및 도로열선 설치
- '25.11.15. ~ '26.3.15.: '25/26년 제설대책 추진

□ 소요예산: 총 1,160,045천원(시 690,000천원, 구비 470,045천원)
