

제146회 영등포구의회
2009년도 제1차 정례회
'09. 7. 1 ~ 7. 14



2009년도

주요업무 추진현황



도 로 과

순 서

- 일반 현황 1
- 정책 목표와 방향 4
- 주요업무 추진실적 및 계획 · 5
- 주요 투자 사업 17

1. 일반 현황


1

인 력

구 분	계	일반직					기능직				
		5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	10급
정 원	35	1	4	4	6	4		1	4	7	4
현 원	32	1	4	8	2	4	2	2	6	3	
과부족	-3			4	-4		2	1	2	-4	-4

2

조 직

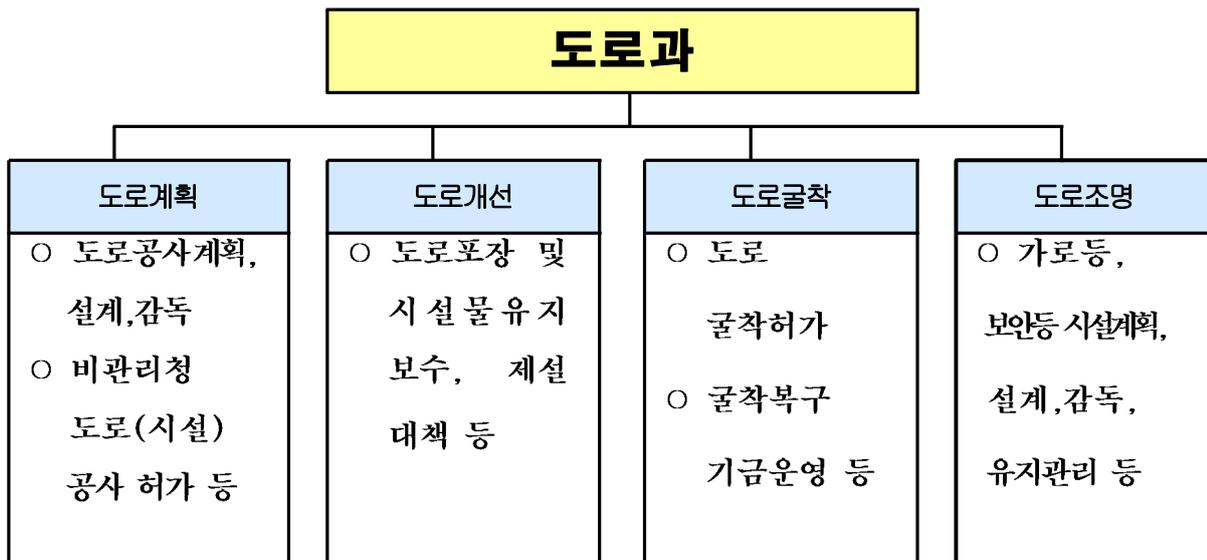

3

주요시설 및 장비

- 도 로 : 387Km [도로율 23.16% (서울시:21.68%),포장율100%]
- 간 선 도 로 : 75.66Km (경인로 외 27개소)
- 교 량 : 12개소 (양화교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 신정교, 양평교, 염창교, 여의교, 구로교)

- 고 가 차 도 : 6개소 (문래, 선유, 도림, 도림천, 신길, 영등포역)
- 보 도 육 교 : 11개소 (우신초교앞 보도육교 외 10개소)
- 지 하 차 도 : 10개소 (국회앞, 영등포, 대방, 신길, 여의2교, 여의교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측)
- 지 하 보 도 : 3 개소 (여의초교앞, 원효대교앞, KBS별관앞)
- 입체교차로 : 5개소 (영등포R, 여의하류, 목동교 동측IC, 염창IC, 여의상류)
- 공 동 구 : 6.18 Km (전력선, 통신선, 지역난방, 상수도관)
- 가 로 등 : 8,538 등
- 보 안 등 : 9,356 등

□ 유관기구 현황

명 칭	구 성 인 원 (명)		목 적	비 고
	내 부	외 부		
기술자문위원회	부구청장외1인	13	공사설계 등 전문기술 자문	15인 이내
도로관리심의회	부구청장외5인	7	도로굴착관련 전반적 사전심의	10 ~ 20인
도로굴착복구 기금운용심의위원회	건설교통국장 외5인	3	도로굴착복구기금 운영 심의	

□ 장 비 현 황

장 비 명	단 위	수 량	용 도	비 고
고 소 작 업 차	대	2	가로등 보수용	
덤 프 트 럭	대	1	도로보수 작업용	
다목적도로관리차	대	3	제설작업등	

4

예산 현황

□ 예산 현황

(단위 : 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행율(%)
합 계	15,566,323	6,328,538	40.7
도로개설 및 확장	7,057,608	1,692,853	24.0
도로개설 지원	24,829	6,018	24.2
도로정비	5,427,399	2,887,187	53.2
도로관리	374,365	205,005	54.8
도로조명 관리	1,429,548	773,748	54.1
도로조명 시설 정비	686,364	437,745	63.8
행정운영경비	566,210	325,982	57.6

II. 정책목표와 방향

목 표

고객 행복을 위한
쾌적한 도로환경 조성

방 향

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

밝고 안전한 도시를위한 도로조명 관리

안전한 도로유지 관리

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

안전하고 쾌적한 도로환경 조성

1 도림로 도로확장공사(시비) 도로계획담당관, 균형발전촉진본부

□ 사업개요

- 위치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동 421-16간(신길광장)
- 규모 : B=25→35m, L=1,150m(기개설 350, 미개설 800)
 - 특별회계 : 좌측 L=500m(신길재정비촉진지구내)
 - 일반회계 : 우측 L=800m(성락교회 방향)
- 사업기간 : 1997년 ~ 2013년
- 총사업비 : 61,070백만원(보상비 56,720 공사비 4,200 설계비 150)
 - 특별회계 : 22,590백만원(보상비 21,440 공사비 1,000 설계비 150)
 - 일반회계 : 38,480백만원(보상비 35,280 공사비 3,200)
- ※ '09 예산 : 2,000백만원(보상 ; 일반회계)

□ 추진실적


- 보 상
 - '09. 3.19 : 실시계획인가(L=800m중 300m)
 - '09. 4.22 : 보상계획수립 및 공고
 - '09. 6.10 : 보상협의 통보(4필지 275㎡)

□ 향후 추진계획

- 미 협의 시 수용재결 예정('09. 8)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 도림로 도로확장공사

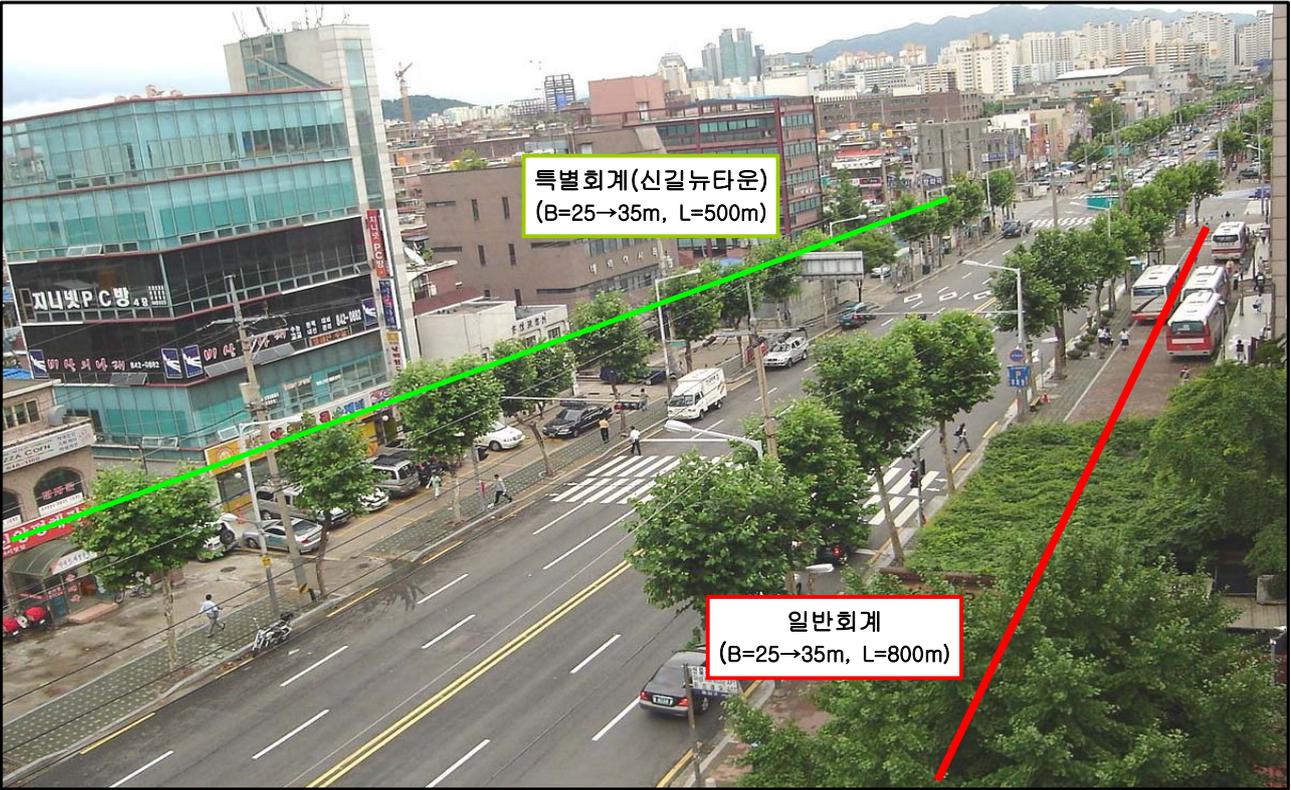

2 영진시장~대신시장간 도로개설공사(2차구간)

□ 사업개요

- 위 치 : 해군호텔앞 부지
- 규 모 : 도로개설 B=15m, L=140m
- 사업기간 : 2009년 ~ 2011년
- 사 업 비 : 7,800백만원(보상비 7,400 공사비 400)
 - '09년 예산 : 3,884백만원(보상비: 2차구간 3,700 기개설구간 184)

※ 총 사업개요

- 위치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간
- 규모 : 도로개설 B=15m, L=1,270m(미개설 : 140m)
- 사업기간 : 1994년 ~ 2011년
- 총사업비 : 23,910백만원(보상비 20,139 공사비 3,656 설계비 115)

□ 추진실적


- 보 상(잔여구간 L=140m)
 - '09. 2.12 : 사업인가 고시
 - '09. 4.23 : 보상협의 통보(4필지 1,638 m^2)
 - '09. 5.~6월 : 보상협의 촉구(2회)

□ 향후 추진계획

- 협의 불응 시 수용재결 신청('09. 7)
- 수용재결 결과 보상금 수령 거부 시 공탁예정('09. 10)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 영진시장~대신시장간 도로개설공사

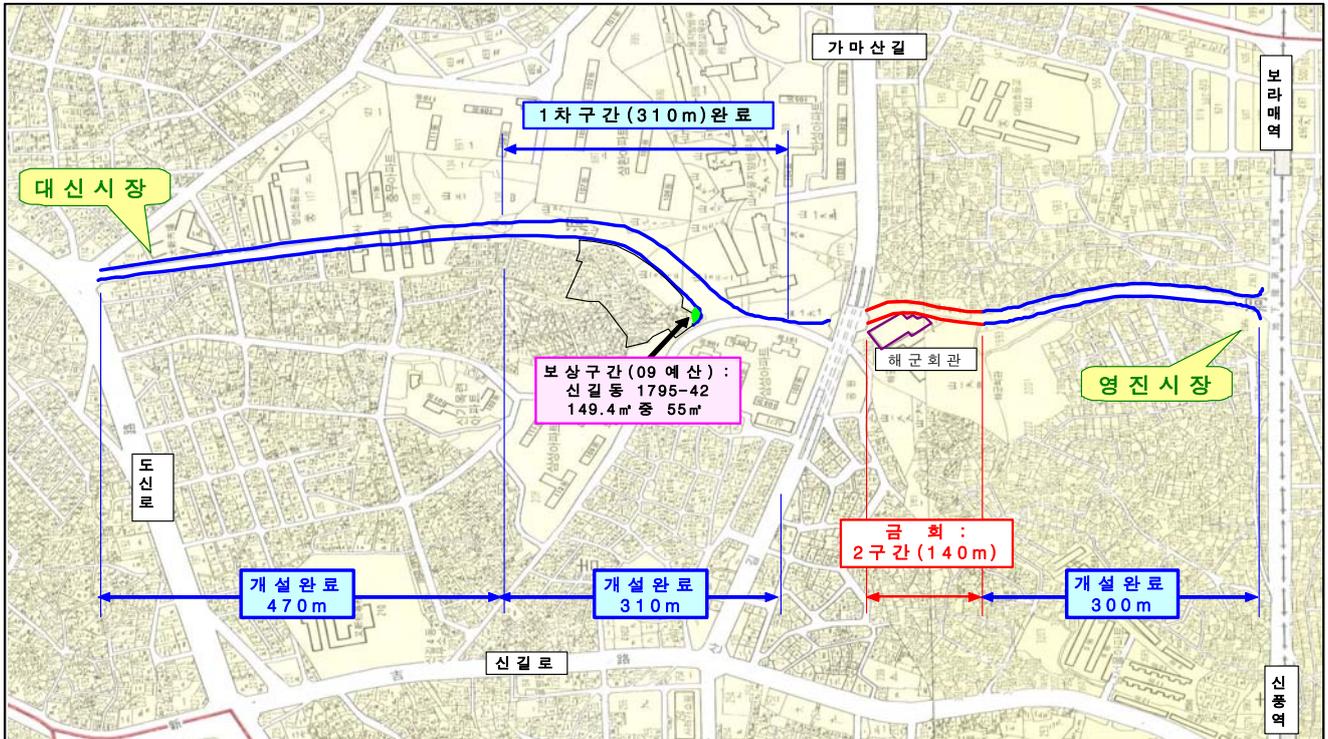

3 대방천변 도로개설공사

□ 사업개요

- 위치 : 신길동 381-9 ~ 신길동 455-19간
- 규모 : 도로개설 B=6m, L=1,080m
 - 기개설 : 660m('98년 ~ '01년)
 - 미개설 : 420m
- 사업기간 : 1998년 ~ 2012년
- 총사업비 : 9,150백만원(보상비 7,700 공사비 1,400 설계비 50)

□ 추진실적


- 대방천변 도로개설공사 실시설계 용역 실시
 - 용역기간 : '09. 1. 30 ~ 5.29
 - 사업비 : 50백만원
 - 시행사 : 대한콘설탄트 (주) 대표 정진우

□ 향후 추진계획

- '09년 6월 실시설계용역 완료 후 본청에 시비3,000백만원 요청

위 치 도

▶ 공사명 : 대방천변 도로개설공사

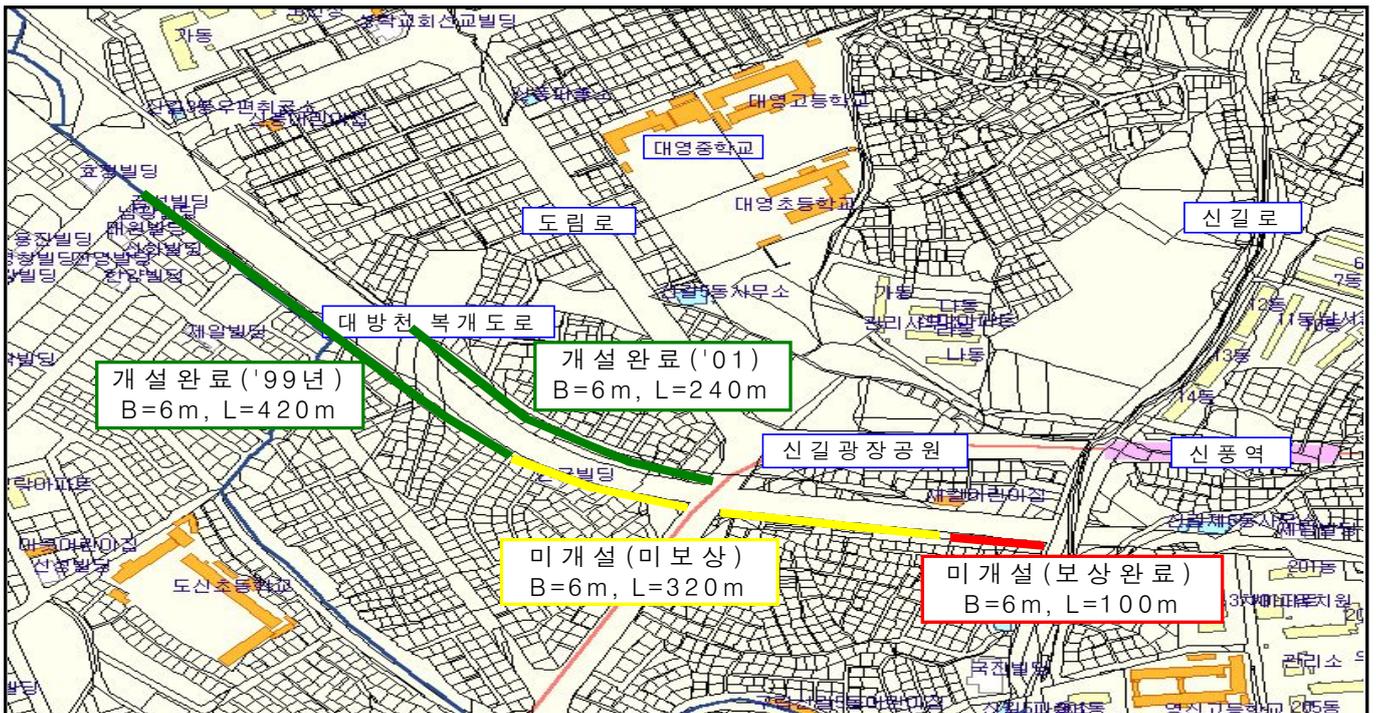

4 도시계획시설(도로) 매수청구 등 보상비 지급

□ 사업개요

○ 사업규모

- 도시계획시설(도로) 매수청구 현황 : 총 23건, 3,547 m^2
- 소송판결(부당이득금) : 총 10건 2,650 m^2 (’09년 606 m^2)
 - 소송패소 토지 : 6건 1,599 m^2
 - 부당이득금 소송비용(임료) : 4건 1,051 m^2
- 총사업비 : 6,620백만원 (’09년 예산 752백만원)
- 기 추진현황 : 매수청구 21건 3,482 m^2 2,060백만원

○ ’09년 추진계획

- 매수청구 토지매입 : 2건 69 m^2
- 소송패소 토지매입 : 2건 606 m^2
- 부당이득금 소송비용 (임료) 지급

□ 추진실적

○ 매수청구 토지매입 : 2건 65 m^2 78,460천원

- 박점순 33 m^2 44,220천원 (’09. 1. 29)
- 염정희 32 m^2 34,240천원 (’09. 4. 13)

○ 소송패소 토지매입 : 2건 606 m^2 559,579천원

- 이석순 269 m^2 172,579천원 (’09.2.13)
- 조정자외 4인 337 m^2 387,000천원 (’09.3.20)

○ 소송임료 및 기타

- 소송임료 지급 : 백순득 외 1건(2,102천원)
- 기타(측량수수료 등) : 2건(1,757천원)

□ 향후계획

○ 매수청구 토지 매입 및 임료 지급

밝고 쾌적한 거리조성

5 노후 조명시설 연차적 개선추진 (시·구비)도로관리담당관

□ 사업개요

- 사업비 : 1,446백만원(구비61,시비1,385)
- 대상노선
 - 도림천로,용호로,여의동로 : 가로등설치 254등
 - 여의도주거지역 광원교체 : 132등
- 효과
 - 가로등안전사고예방 및 도시미관향상
 - 고효율,고연색성 자재사용으로 에너지 절약

□ 추진실적

- 여의도주거지역 광원교체 : '09.5.6일 준공
- 도림천로 : 배관 및 기초공사완료

□ 향후 추진계획

- 도림천로 : '09. 8월말 준공 예정
- 용호로,여의동로 : '09.10월말 준공 예정(보도환경개선과 병행시공)

6 골목길 밝은거리 조명환경 조성

□ 사업개요

- 사업비 : 400백만원
- 위 치 : 관내 전지역
- 보안등 신설·개량(310개소), 유지보수(3,100등)

□ 추진실적

- 보안등 신설·개량 220개소 완료
- 보안등 유지보수 1,700등 완료

□ 향후 추진계획

- 주민민원요청에 따라 지속적인 보수 및 신설
- 연말까지 노후 보안등 적출, 개량으로 전기안전사고 예방

안전한 도로 유지 관리

7 도로포장 수준향상으로 주민생활 환경개선

□ 사업개요

- 정비대상 : 이면도로(구도로) : 41,750m
- 사업기간 : '09. 2 ~ 12월
- 사업규모
 - 보도정비 : A = 57a
 - 아스팔트정비 : A = 106a
 - 콘크리트포장 : A = 4a
- 총사업비 : 1,800백만원

□ 추진실적

- 공사착공 : '09. 2. 4
- 공사실적(공정 90%)
 - 문래동(5가) 5-10~8외 60개소 정비완료

□ 향후 추진계획

- '09. 11월 준공 예정

8 안전하고 쾌적한 도로시설물 관리 및 장애인편의시설 설치

□ 사업개요

- 정비대상 : 관내 시설물
- 사업기간 : '09. 1 ~ 12월
- 사업규모
 - 지하보도 3개소, 보도육교 11개소, 옹벽 및 석축 5개소
 - 난간 · 과속 방지턱 및 볼라드 설치 등 도로부속시설물
 - 횡단보도 신설 및 이전, 보도진출입부 점자블록 설치 등 장애인편의시설
- 총사업비 : 1,100백만원

□ 추진실적

- 공사착공 : '09. 1. 30
- 공사실적(공정 90%)
 - 과속방지턱 설치 및 보수 62m, 과속방지턱 도색 3,560 m^2
 - 디자인웬스설치 및 보수 220경간
 - 장애인편의시설 설치 및 보수 6a

□ 향후 추진계획

- '09. 11월 준공 예정

9 용호로 및 여의동로 보행환경 개선사업 (시비+ 구비)

□ 사업개요

- 사업위치 : 용호로(원효대교남단~여의교북단) 및 여의동로(여의교북단~여의상류IC)
- 사업규모 : 보도환경개선 B=3.8~7.5m, L=1.7km, A=120a
- 사업기간 : '09. 1 ~ '09. 11
- 총사업비 : 1,785백만원(시비 892백만원, 구비 893백만원)

□ 추진실적

- 실시설계용역
 - '09. 1월 : 실시설계용역 발주
 - '09. 3월 : 실시설계 시행
 - '09. 3 ~ 4월 : 서울시 보도디자인 심의
 - '09. 5월 : 용역준공
- 공사
 - '09. 6.12 : 공사착공

□ 향후계획

- '09. 11월 : 공사 준공

10 여의도 지하보도 일대 보행환경 개선사업

□ 사업개요

- 사업위치 : 여의도 지하보도 3개소(여의초교 앞, 원효대교 앞, KBS별관 앞)
- 사업규모
 - 지하보도 폐쇄 후 횡단보도 및 신호기 설치 2개소
 - 지하보도 환경개선 1개소(바닥타일교체 A=160m², 벽면타일교체 A=600m², 천정판 교체 A=250m², 계단보수 150m², 캐노피교체 N=2개소)
- 사업기간 : '08. 3.~'10.12
- 총사업비 : 845백만원

□ 추진실적

- 지하보도 폐쇄 : 2개소
 - 원효대교 앞, KBS별관 앞 지하보도 폐쇄
- 신호기 및 횡단보도 설치 : 4개소

□ 향후 추진계획

- 2010년 여의초교 앞 지하보도 보행환경개선사업 추진(연차적 사업)

위 치 도

▶ 공 사 명 : 옹호로 및 여의동로 보도환경 개선사업



▶ 공 사 명 : 여의도 지하보도 보행환경 개선사업



11 사회적약자를 위한 도시환경개선사업

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업내용 : 횡단보도 턱 정비 , 점자유도블럭 정비, 측구정비 등
- 사업기간 : '09. 2 ~ 11월
- 사 업 비 : 350백만원 (도로과 200, 사회복지과 150)

□ 추진실적

- '09. 2. 2 : 공사착공
- 횡단보도 턱 정비 : 58개소
- 점자유도블럭 정비 : 3.4@
- 측구정비 : 740m

□ 향후 추진계획

- '09.10월 준공 예정

12 도로굴착복구 효율적 추진

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 사업내용 : 아스팔트포장, 소형고압블럭 포장, 측구정비 등
- 사업기간 : '09. 2 ~ 12월

□ 추진실적

- '09.2.2 : 공사착공
- 아스팔트 포장 117@
- 소형고압블럭 포장 20@
- 측구설치 2,749m
- 도로굴착허가 현황
 - '09.6월 현재 : 959건 L=23,667m A=23,448m²

□ 향후 추진계획

- 도로굴착 기관으로부터 도로복구 의뢰 시 신속한 복구시행

13 초동제설 기간 중 출동체제 유지

□ 24시간 비상근무체제 운영

- 기 간 : '09.11.15.~'10. 3.15.(4개월간)

□ 제설장비 및 자재비축

- 제설장비 : 38대
 - 다목적제설차 : 3대, 제설삼발 : 3대,
 - 염화칼슘살포기 : 32대 (대형 3대, 중형 4대, 소형 25대)
- 제설자재 : 염화칼슘 및 소금 30,000포 이상 확보계획
 - 염화칼슘 29,154포 (전년도 이월량 19,154, 금년 구매 10,000포)
 - 소 금 2,859포 (전년도 이월량 2,859)

14 주민과 함께하는 제설문화 전개

□ 구민과 함께하는 내 집 내 점포 앞 눈치우기 제설문화 정착

- 내 집 내 점포 앞 눈치우기 문화 정착으로 제설 참여율 향상
- 직장 및 직능단체, 각종 보도매체를 통한 대시민 홍보강화 및 참여유도
- 취약지역 주민 및 반 단위 책임제설 담당자에게 기상상황 및 제설작업 시행통보 등 문자메시지 전송 확대 시행
- 노약자·장애인·독거노인 등 눈을 치울 수 없는 주민들에 대한 지원
 - 직능단체 등을 활용 제설자율봉사단 구성 확대

□ 디자인화된 소형 염화칼슘함 구매 및 배치(수방용 병행사용)

□ 학교주변 제설용 염화칼슘 배치(25개소, 125포)

□ 제설유공자 표창수여

- 제설참여 유도를 위해 제설작업에 공로가 큰 공무원, 환경미화원, 학생 시민, 단체 등에 표창 수여

IV. 주요 투자사업

(단위:백만원)

연번	사업명	2009 예산 (시설비)				집행액	추진사항
		계	구비	시비	국비		
	합 계	16,377	7,852	8,525		5,370	
1	도림로 도로확장공사	2,000		2,000		0	보상 협의 중
2	도시계획시설(도로) 매수청구등 보상비 지급	752	752			460	매수청구등 추진 중
3	대방천변 도로개설공사	50	50			43	실시설계용역 완료
4	영진시장~대신시장간 도로개설공사	3,884	184	3,700 (시 보조금)		184	서토위 수용재결 신청
5	신길동 4300-37~4326-2간 도로개설공사	176	176			143	완료
6	대림동 1051-9~810-56간 도로개설공사	607	607			485	건물 철거 중
7	신길동 227-6~260-3간 도로개설공사	800	800			3	보상 협의 중
8	포장도로정비등 소파보수공사	1,800	1,800			1,338	공사 중 (90%)
9	도로시설물 보수 공사 및 장애인 편의 시설 설치 공사	1,100	1,100			842	공사 중 (90%)
10	도로시설물등 안전점검 및 긴급보수공사	20	20			18	완료
11	사회적약자를 위한 도시 환경 개선사업	200	200			159	공사 중 (90%)

연 번	사 업 명	2009 예산 (시설비)				집행액	추진사항
		계	구비	시비	국비		
12	용호로 및 여의동로 보도환경개선사업	1,785	893	892		478	5월 실시설계용역 준공 6월 공사착공
13	여의도 지하보도 보행환경개선사업	400	400			390	완료
13	신길동 2045~2075간외 3개소 도로정비사업	120	120			98	완료
14	선유중학교 앞 방음벽 개량 공사	202		202		-	실시설계용역 완료 6월 착공
15	선유고등학교 앞 방음벽 설치 공사	321		321		-	실시설계용역 완료 6월 착공
16	09제 설 작업용역	95	70	25		-	시기 미도래
17	가로등시설물정비공사 (연간단가)	220	220			190	공사 중 (95%)
18	보안등 설치개량 및 유지보수공사(연간단가)	400	400			208	공사 중 (50%)
19	여의도 아파트(주거)지역 광원교체공사	60	60			57	완료
20	용호로 가로등 개량공사	290		290		63	용호로 보도환경개선사업과 연계 공사 중 (5%)
21	도림천로 가로등 개량공사	584		584		104	공사 중 (40%)
22	여의동로 가로등 개량공사	511		511		107	공사 중 (40%)
