

제138회 구의회 임시회

'08. 7. 14 ~ 7. 23



2008년도

주요업무 추진현황



건설교통국

순 서


- **일 반 현 황** 1
- **정책목표와 방향** 4
- **주요업무 추진실적 및 계획** 5

I. 일반 현황

1 인 력

구 분	계	가로경관과	도 로 과	치수방재과	교통행정과	주차문화과
정 원	193	34	35	40	50	34
현 원	189	35	32	41	47	34
과부족	△4	1	△3	1	△3	

2 조 직

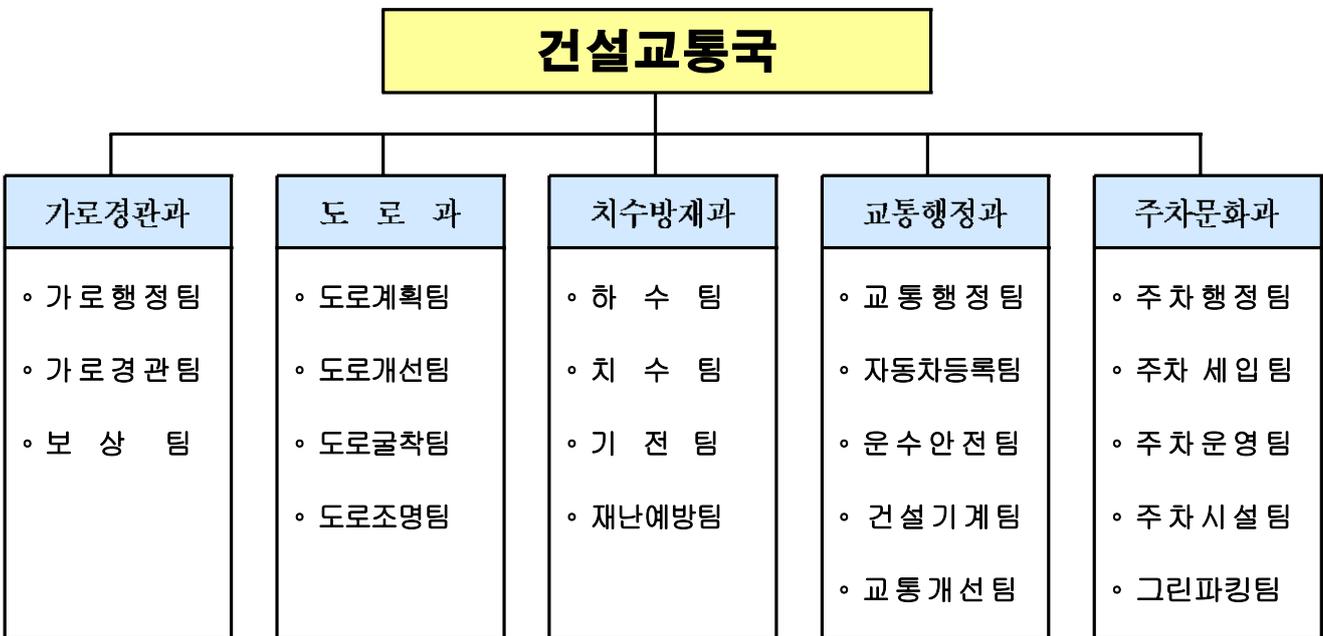

3

주요시설 및 장비

가로시설물 현황 ----- (가로경관과)

○ 가로판매대 95, 구두수선대 91, 노점상 단속초소 2

도로시설물 현황 ----- (도 로 과)

- 도 로 : 387km [(도로율 23.16% 서울시 21.68%),포장율 100%]
- 간선도로 : 75.66km(경인로 외 27개소)
- 시 설 물 : 47개소 (교량12 고가차도6 보도육교11 지하차도10 지하보도3 입체교차로5)
- 가 로 등 : 8,294등
- 보 안 등 : 9,323등

하수도시설 현황 ----- (치수방재과)

○ 하수관거 453,427m 맨홀 8,817개소 빗물받이 21,238개소

빗물펌프장 : 8개소 펌프 51대(영등포 양평1·2 문래 도림2 신길 대림2·3)

간이펌프장 : 6개소 펌프14대

하 천 현황 : 4개소 16.94km (한강,안양천,도림천,대방천)

자동차 등록 ----- (교통행정과)

계	승용 차	승합 차	화물 차	특수자동차	비 고
147,492	114,377	9,198	23,416	501	

건설기계 등록

계	영 업 용	자 가 용	관 용	비 고
16,943	15,732	1,203	8	서울시 전체(50,932대)의 33.3%

주차장 현황 : 9,203개소 168,418면 ----- (주차문화과)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소 계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소 계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소 계	그린파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	9,203	85	22	46	17	125	25	2	98	8,993	1,129	2,542	2,821	2,501
면수	168,418	8,833	6,901	1,010	922	9,205	2,247	442	6,516	150,380	1,891	8,825	68,121	71,543

CCTV 현황 : 106대

○ 불법 주·정차 단속용 : 50대 ○ 그린파킹 감시용 : 56대

4

예산 현황

□ 부서별 예산 현황

(단위 :천원)

부서명	예산액	집행액	집행율
총 계	54,133,973	15,643,534	28.9
가로경관과	523,893	148,331	28.3
도로과	8,593,277	3,502,920	40.8
치수방재과	5,199,641	1,440,885	27.7
교통행정과	1,158,891	608,572	52.5
주차문화과	38,658,271	9,942,826	25.7

□ 주요 사업예산 현황

예산총액	정책사업	단위사업	세부사업
54,133,973	10건	21건	69건

Ⅱ. 정책목표와 방향

목 표

편리하고 쾌적한
도시공간 구축

방 향

깨끗하고 아름다운 가로경관 조성

고객 행복을 위한 쾌적한 도로환경 조성

재난 걱정없는 영등포 건설

쾌적한 교통환경 조성으로 주민 삶의 질 향상

주차 수요관리 강화 및 주차문화 개선

Ⅲ. 주요업무 추진실적 및 계획

쾌적하고 편리한 가로경관 조성

1 디자인 노점거리 확대시행

□ 사업개요

- 노점의 실효성 없는 단속과 재발생의 악순환 방지
- 노점상의 시간제·규격화를 통해 체계적 관리
- 무질서한 거리환경 및 주민통행 불편 해소

□ 현 황

- '07년도 시범가로지역 신 모델 손수레 50개소 배치
 - 위 치 : 영등포로타리 ~ 영등포역 앞 지하도 입구(신세계백화점 건너편)
- '08년도 시범가로지역 선정
 - 위 치 : 신한은행 ~ 영등포 우체국 (신세계백화점 앞)

□ 추진실적

- '07년도 시범 가로지역 정비
 - 신 모델 손수레 50개 배치 완료
- '08년 시범가로 노점 실태조사 실시
 - 39개 노점상 실태조사 완료 : 소유주, 생활정도, 노점형태 등 파악

□ 향후 추진계획

- '08년도 시범가로지역 신모델 손수레 39개 배치(8월말)
- 시범가로 노점 허가조건 이행관리 철저 관리
 - 영업종료 후 노점의 도로방치 및 주변 청결상태, 영업시간 준수 여부 등

위 치 도



2 영일시장 명품거리 조성 및 조광시장 주변 정비

□ 사업개요

- 보 · 차도에 진열된 상품 및 적치물 정비
- 시민 및 차량 소통 불편 해소 및 쾌적한 가로환경 조성

□ 추진현황

- 1단계(완료) : 146개 점포(2007년도 상반기)
 - 무허가 가설점포 완전철거 및 폐기물 처리 후 도로개설
- 2단계(완료) : 120개 점포(2007년 하반기)
 - 보도블럭 포설(5.6m×420m), 불법 차양막 제거
 - 점포앞 아름다운 간판설치, 11개 점포를 자진철거하고 보도블럭 정비
- 3단계(추진중) : 36개 점포
 - 자진정비 안내문 발송(2차에 걸쳐 발송)
 - 계고장 발송 : 보도상 적치물 및 차양막 제거 행정대집행 계고 통지('08.01.08)

□ 추진실적

- 3단계 정비지역 간판 정비 완료 : (33개 새로운 간판 설치 완료)
- 상품과다 적치 및 파라솔, 이중차광막 매일 정비(정비반2명,용역6명)
- 조광시장 변상금 및 과태료부과 : 68건45,377천원('08년3월)
- 영일시장 변상금 및 과태료부과 : 57건40,388천원('08년3월)

□ 향후 추진계획

- 정비사업 완료후까지 영일시장 주변지역 지속적 순찰 및 정비
- 무질서한 주차차량, 쓰레기 적치 등 필요시 담당부서와 합동단속

위 치 도



공공용지의 효율적 관리

3 국회 도로사용 변상금 부과에 따른 소송수행

□ 개 요

- 점용구간 : 여의서로 국회 주변 연장2.1km
 - 여의도지구대(서강대교남단) ~ 여의2교 구간(의원회관 옆)
- 점용면적 : 7,488㎡(폭 3.5~7m)
 - 여의도동 8-1 : 588㎡, 여의도동 8-2 : 6,900㎡
- 변상금 부과액 : 10,149 백만원

□ 추진경과

- 국회 주변도로 원상회복 계획 : '07. 6. 14
- 도로무단사용 변상금 부과처분 사전통지 : '07. 6. 25
- 변상금 부과통지 : '07. 9. 3
- 행정소송 제기 : '07.10.31
- 1심 행정소송 판결 : '08. 4.25
- 항소장 접수 : '08. 5. 9
- 항소 이유서 제출 : '08. 6.20

□ 향후 추진계획

- 1심 판결 변상금 조정액 18억원의 부당성 부각하여 2심에 반영
- 우리구는 101억원 부과의 정당성을 현장입증 사진과 법률상의 미비점을 보완하여 101억원 부과의 정당성을 확보하기 위하여 항소
- 결과적으로 101억원 부과의 정당성 확보 및 법 기준을 세우는데 전력을 다 할 것임

4 신길로 ~도림로간 도로확장공사(시비)

신길로와 도림로를 연계하는 도로개설로 교통량 분산 및 지역발전을 도모하고 상습 침수지역 해소.

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 신길동 347-40 ~ 254-1간
- 규 모 : 도로개설 B-15 → 30m, L-780m
 - 기개설 : 420m('97년 ~ '03년), - 미개설 : 360m
- 사업기간 : '97년 ~'09년 4월
- 총사업비 : 53,200백만원(보상비 45,700 공사비 7,420 설계비 80)

□ 추진실적

○ 공 사

- '08. 3. 10 : 계약 및 착공
- '08. 6. 30 : 무허가건물 122동 중 118동 이주완료
- '08. 7월 ~ : 사라가 및 신평시장 철거
 - 무허가건물 철거 ▭ 방진막 설치완료
 - ▮ 석면 스투트 철거 중
 - 사라가건물 철거 : 내부상인 이주('08. 7. 10일까지)

○ 보 상


- '08. 4. 4 : 토지 1건(사라가) 수용재결 신청
- '08. 10월 : 토지 보상금 공탁

□ 향후 추진계획

○ 공 사

- '08. 7.30 : 철거완료
- '08. 8월 ~ : 하수암거 설치, 보도조성, 차도포장 등

위 치 도

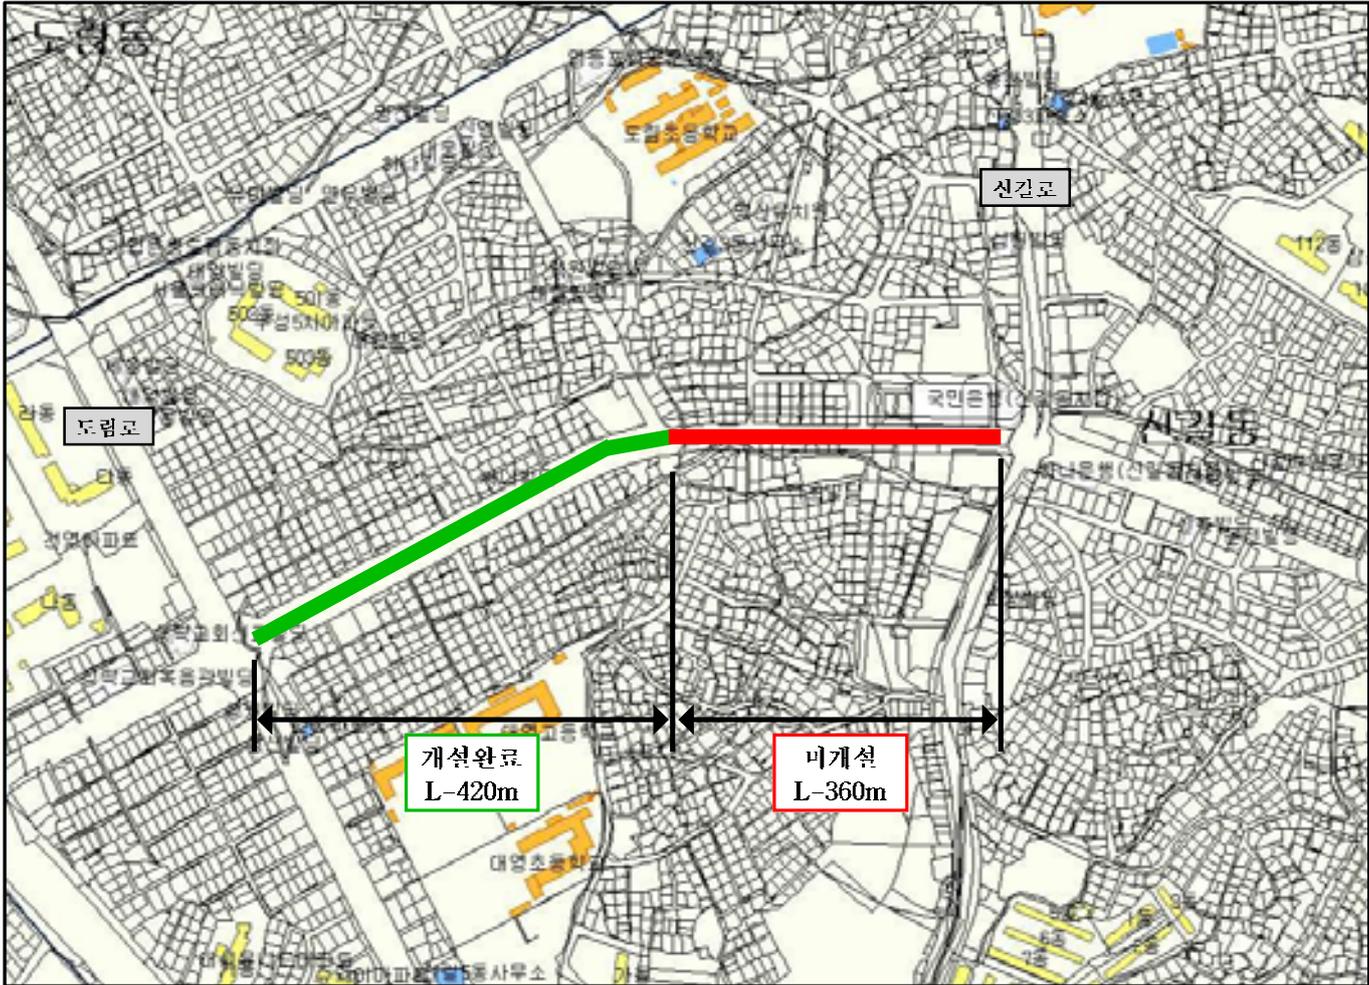

5

영진시장~대신시장간 도로개설공사

2001년 이후 중단된 도로개설사업의 재추진으로 단절된 도로망을 연계하여
교통량 분산효과 도모 및 주민숙원사업 해결

□ 사업목표 : 교통량 분산효과 및 주민통행 불편해소

□ 추진방향

○ 위 치 : 신길6동 2365(영진시장) ~ 신길1동 136(대신시장)간

○ 규 모 : 도로개설 B-15m, L-1,270m

- 기개설 : 820m('94년 ~ '00년) - 미개설 : 450m

○ 사업기간 : '94년 ~ '10년 이후

○ 총사업비 : 23,310백만원(보상비 19,539 공사비 3,650 설계비 115 시설부대비 6)

□ 추진실적

○ 공 사

- 건물 철거완료(해군건물 2동)

- 옹벽(테니스장 및 내무반앞) 설치 [총187m중 160m(높이 2~8m)]

- 도로 노상 정리 등 ※ 공정율 60%

○ 보 상

- '08. 4. 17 : 도로 실시계획 인가(영고시 제2008-26호)

· 신길동 1795-42 임야 149.4㎡(신길재정비촉진지구 결정시 도로로
가각 일부 편입)

- '08. 6. 3 : 보상물건 협의통지(토지 1, 지장물 1)

□ 향후추진계획

○ 공 사

- '08. 7 ~ 12월 : 구조물(옹벽)설치, 포장 공사 등


- '08. 12월 : 공사완료 예정

○ 보 상

- '08. 8월 : 협의 불성립시 수용재결 신청(149.4㎡중 94.4㎡ 지분)

※ 미보상부분(149.4㎡중 55㎡)은 추경예산(184백만원) 확보후 추진

위 치 도

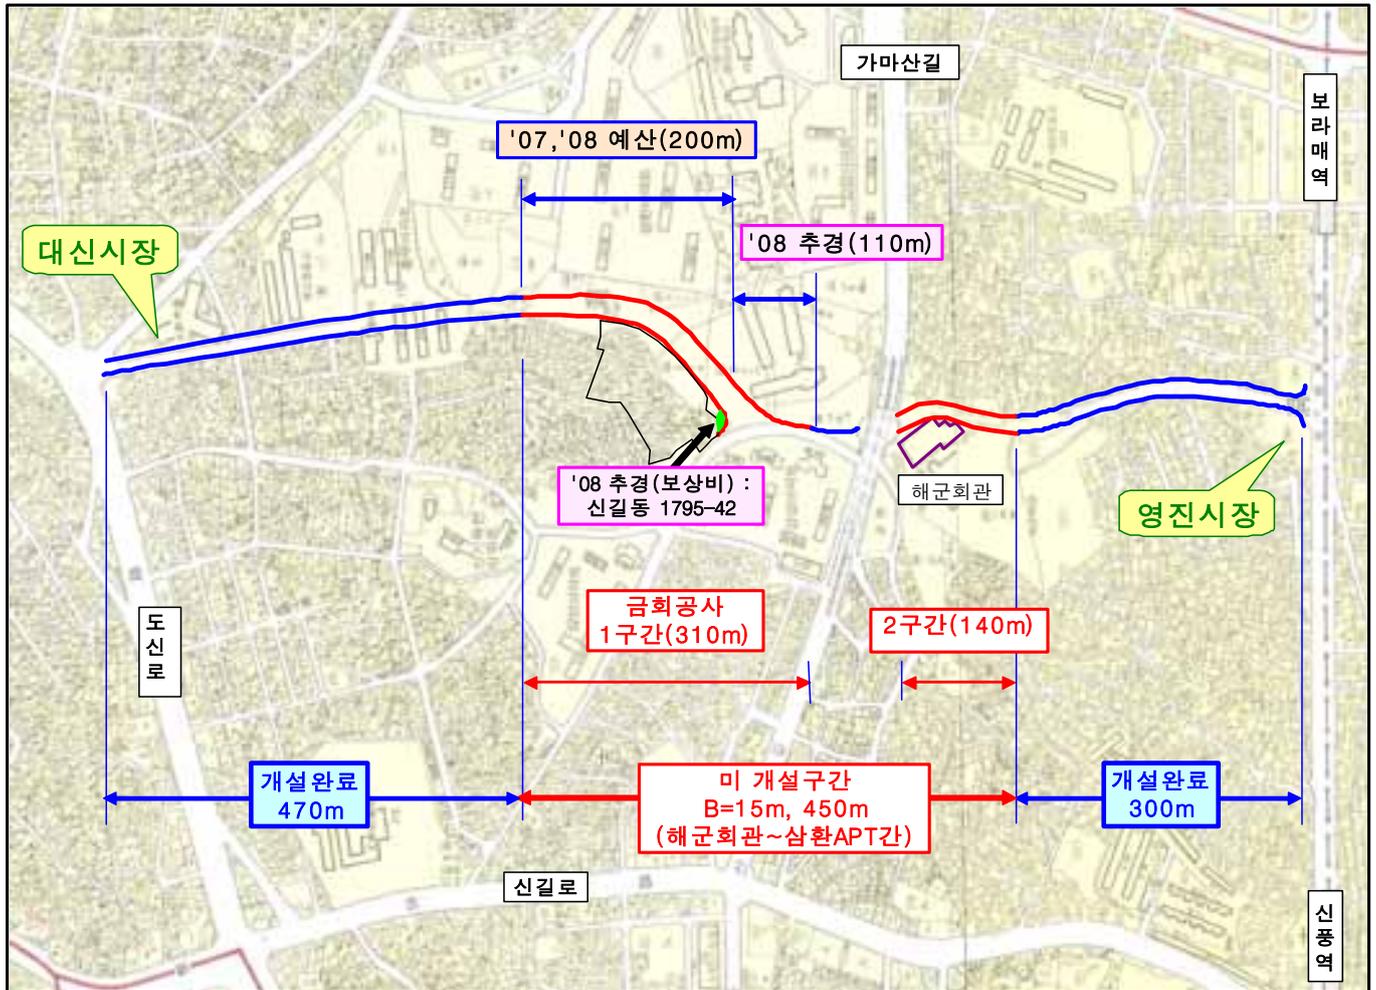

대림2생활권 지구단위계획구역내 개발활성화 및 도로연계기능 확보


- 사업목표 : 지구단위계획구역내 도시기반시설 확충

- 추진방향
 - 위 치 : 영등포구 대림동 1051-9 ~ 대림동 810-56간
 - 규 모 : 도로개설 B-6m, L-158m
 - 사업기간 : '06년 ~ '09년 6월
 - 총사업비 : 2,975백만원(보상비 2,570 공사비 355 설계 50)

- 세부 추진계획
 - 보 상
 - 보상물건 43건중 6건 협의 완료 (토지 2건, 지장물 4건)
 - '08. 6. 11. : 수용재결 신청(토지 9건, 지장물 20건, 영업권 8건)

- 향후 추진계획
 - 공 사
 - '08. 7월 : 설계완료 및 공사발주
 - '08. 9월 : 보상완료 시점에 맞추어 착공 예정
 - 보 상
 - '08. 9월 : 수용재결 결정에 따른 보상금 지급 또는 법원 공탁

위 치 도

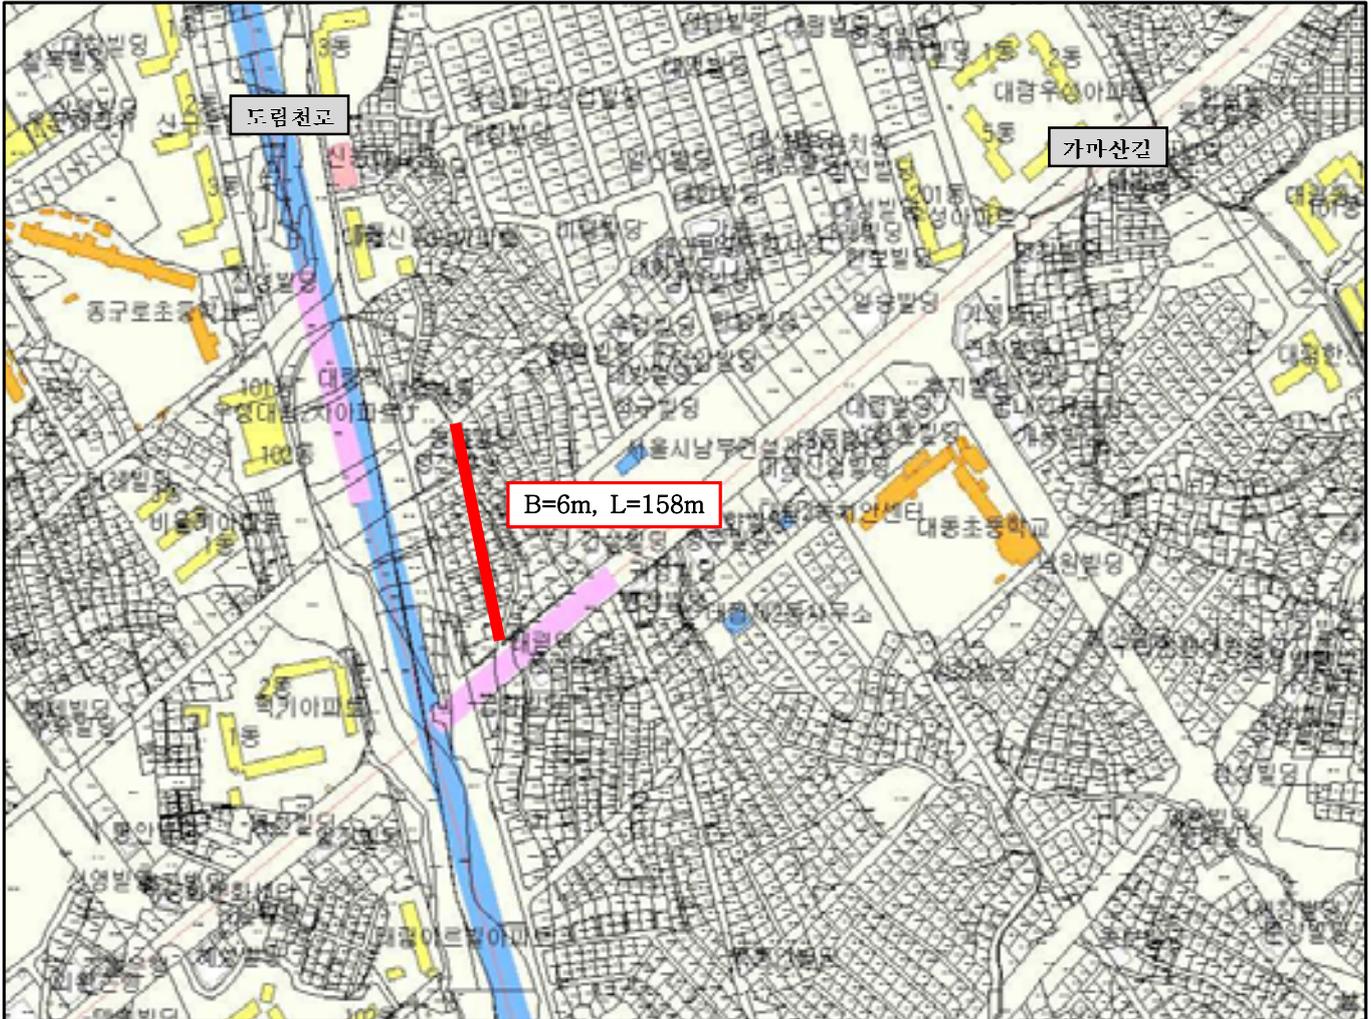

밝고 쾌적한 거리조성

7 노후 조명시설(가로등) 개선추진(시·구비)

15년이상 경과되고 기준조도가 22룩스 미만인 노후 가로등 시설을 개선하여 전기안전 및 야간 도로 이용자의 편의 증진을 도모하고자 함.

가로등 현황

- 가로등 : 69개 노선 8,294등(가로등 8,058 육교등 87 하부등 149)

추진방향

- 가로등 조도(밝기) 현행 15룩스에서 22룩스로 상향 개선
- 고효율·고연색성 자재 사용으로 에너지절약

추진 실적

(단위 : 백만원)

구 분		사업비 (등수)	실 적 [사업비 등수]	비 고
가로등	계	1,676 (407)	97(119)	
	시비	1,536 (244)	0	도림로, 선유로, 대방천길 가로등 169등 분전반 10면 발주완료
	구비	140 (163)	97(119)	여의도 주거지역 광원교체(NH100W→MHR50W) 99등 조명등 설치 20본 설치 완료

향후 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	사업비 (등수)	연 도 별				
		'07	'08	'09	'10(장래)	
가로등	계	10,420 (1,704)	1,324 (189)	1,676 (407)	2,896 (436)	4,524 (672)
	시비	7,864 (1,161)	924 (145)	1,536 (244)	1,960 (280)	3,444 (492)
	구비	2,556 (543)	400 (44)	140 (163)	936 (156)	1,080 (180)

8

고유가에 따른 가로등 격등제 추진

최근 국제유가의 지속적인 상승함에 따라 고유가 극복을 위한 에너지 절약대책의 일환으로 자율적인 가로등 격등제 및 보행등 소등을 실시하여 범국가적 에너지 절약운동 동참 및 예산을 절감코자 함.

□ 국제유가 동향

(단위: US달러/B)

油 種	'06평균	'07평균	'08.1.4 (A)	'08.7.3 (B)	년초대비 (B-A)
Dubai	61.55	68.34	91.3	140.31	49.01

□ 우리구 도로조명 현황

- 가로등 : 69개 도로 8,294등, 보안등 : 22개동 9,323등

□ 추진대상

- 조도 30룩스이상 도로 가로등 및 가로등에 부착되어있는 보행등(보안등 제외)

□ 추진기준 및 방법

【제1단계 - 국제유가 배럴당 120\$이상시】 - 전체등수의 22.7%인 1,882등 소등

- 30룩스이상노선 가로등중 16개노선 858등 소등(6차선이상의 시도)
- 보행등 24개노선 1,024등 소등
(아파트·학교지역을 제외한 상가지역 위주 소등)
- 에너지절감 효과 년평균 1,629천kwh 90,098천원

【제2단계 - 국제유가 배럴당 150달러시】 - 전체등수의 37.5%인 3,112등 소등

- 30룩스이상 전체 56개노선 50% 소등(모든 시도상)
- 에너지절감 효과 년평균 3,449천kwh 190,729천원

안전한 도로 유지 관리

9 사회적약자를 위한 도시환경개선사업

우리구와 (사)주거복지연대와 파트너쉽을 위한 협약에 의해 추진하고 있는 『사회적 약자를 위한 도시환경 개선사업』의 도로분야 기초조사가 완료됨에 따라 단·중·장기 계획을 수립 장애인편의시설 등을 개선하여 사회적 약자를 위한 복지서비스를 제공하고자 함

□ 추진근거

- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 추진 협정체결('06.10.13)
 - 주민생활지원과
- 사회적약자를 위한 도시환경개선사업 실태조사 보고(구청장방침,'07.4.10)
 - 실태조사 총 1,228건 중 도로분야 530건(43%)

□ 정비대상

구 분	계	정비대상	비예산 사업 (기동반 보수 등)	타기관 이첩
건 수	530건	243건	92건	195건

※ 금년도 계획60건 중 기 완료 36건

□ 중점정비사항

- 점자블럭 미설치구간 및 잘못 시공된 구간
- 보도턱 발생 및 보차도 미구분 지역
- 보도 요철 및 보행자 방호시설 등

□ 향후 추진계획

(단위 : 백만원)

구 분	계	'07	'08	'09~'10	'11 이후
건 수	243건	24건	60건	104건	55건
금 액	3,000	50	250	1,300	1,400
사업내용	보도정비 및 보도신설	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보도턱 낮춤 등 보도정비	보행로 확보등 보도신설

예방위주의 수방대책 확립

10 풍수해 사전 준비대책

최근 급변하는 기상이변에 효율적으로 대처하고 지역주민이 스스로 사전 대비할 수 있도록 홍보에 역점을 두어 우기 전 수방대책 사전 준비로 자연재해 걱정 없는 영등포 건설을 도모코자 함

- 사업목표 : 풍수해 사전준비 대책 추진, 주민홍보시스템 강화
- 추진방향
 - 수방시설물 사전점검 · 정비
 - 수방자재 확보 및 저지대 침수지역 모래주머니 배치
 - 주민 자발적 침수피해 예방지원
 - 대 시민 홍보시스템 강화
- 세부 추진계획
 - 수방시설물 점검 : 제작사, 자체 정비점검 등
 - 하수도 준설시행 : 우기 전 연간목표량의 60%준설(빗물받이1회 이상)
 - 수방자재 확보 : 모래주머니 50,000매 등
 - 침수방지 예방사업 추진 : 역류방지기 및 자동펌프 설치지원
 - 노후 · 불량하수도 개량 정비 및 수방시설물(펌프장, 수문 등)기능 강화
 - 대 시민 홍보시스템 강화 : 수방교육 및 홍보 캠페인 실시
배수펌프 및 강변육갑문 개폐 시운전 실시
 - 사전 수해대비 자동음성동보시스템 시행(15,000세대)

최근 세계적인 기상이변과 집중호우에 대비한 수방시설 능력 향상으로
수해로부터 구민의 생명과 재산보호

- 수방시설능력 : 설계 강우빈도 10년 ⇒ 30년으로 상향

□ 사업개요

- 위치 : 대림1동 862-4번지 일대(대림어린이공원 내)
- 사업규모
 - 저류조 : Q-2,447m³ (15.1 × 51.9 × 3.2m)
 - 유입관로 : D-1,000mm (L-92m)
- 사업기간 : '07. 5 ~ '09. 5
- 총사업비 : 1,600백만원

□ 추진실적


- '07. 6.20 ~ 11.30 : 실시설계용역 시행
- '07.12.13 : 도시계획 위원회 심의(원안가결)
- '08.01.31 : 서울시 계약심사 완료

□ 향후 추진계획

- '08. 8 : 공사발주
- '09. 5 : 공사완료 예정

위 치 도

▶ 공 사 명 : 우수유출 저감시설 설치공사

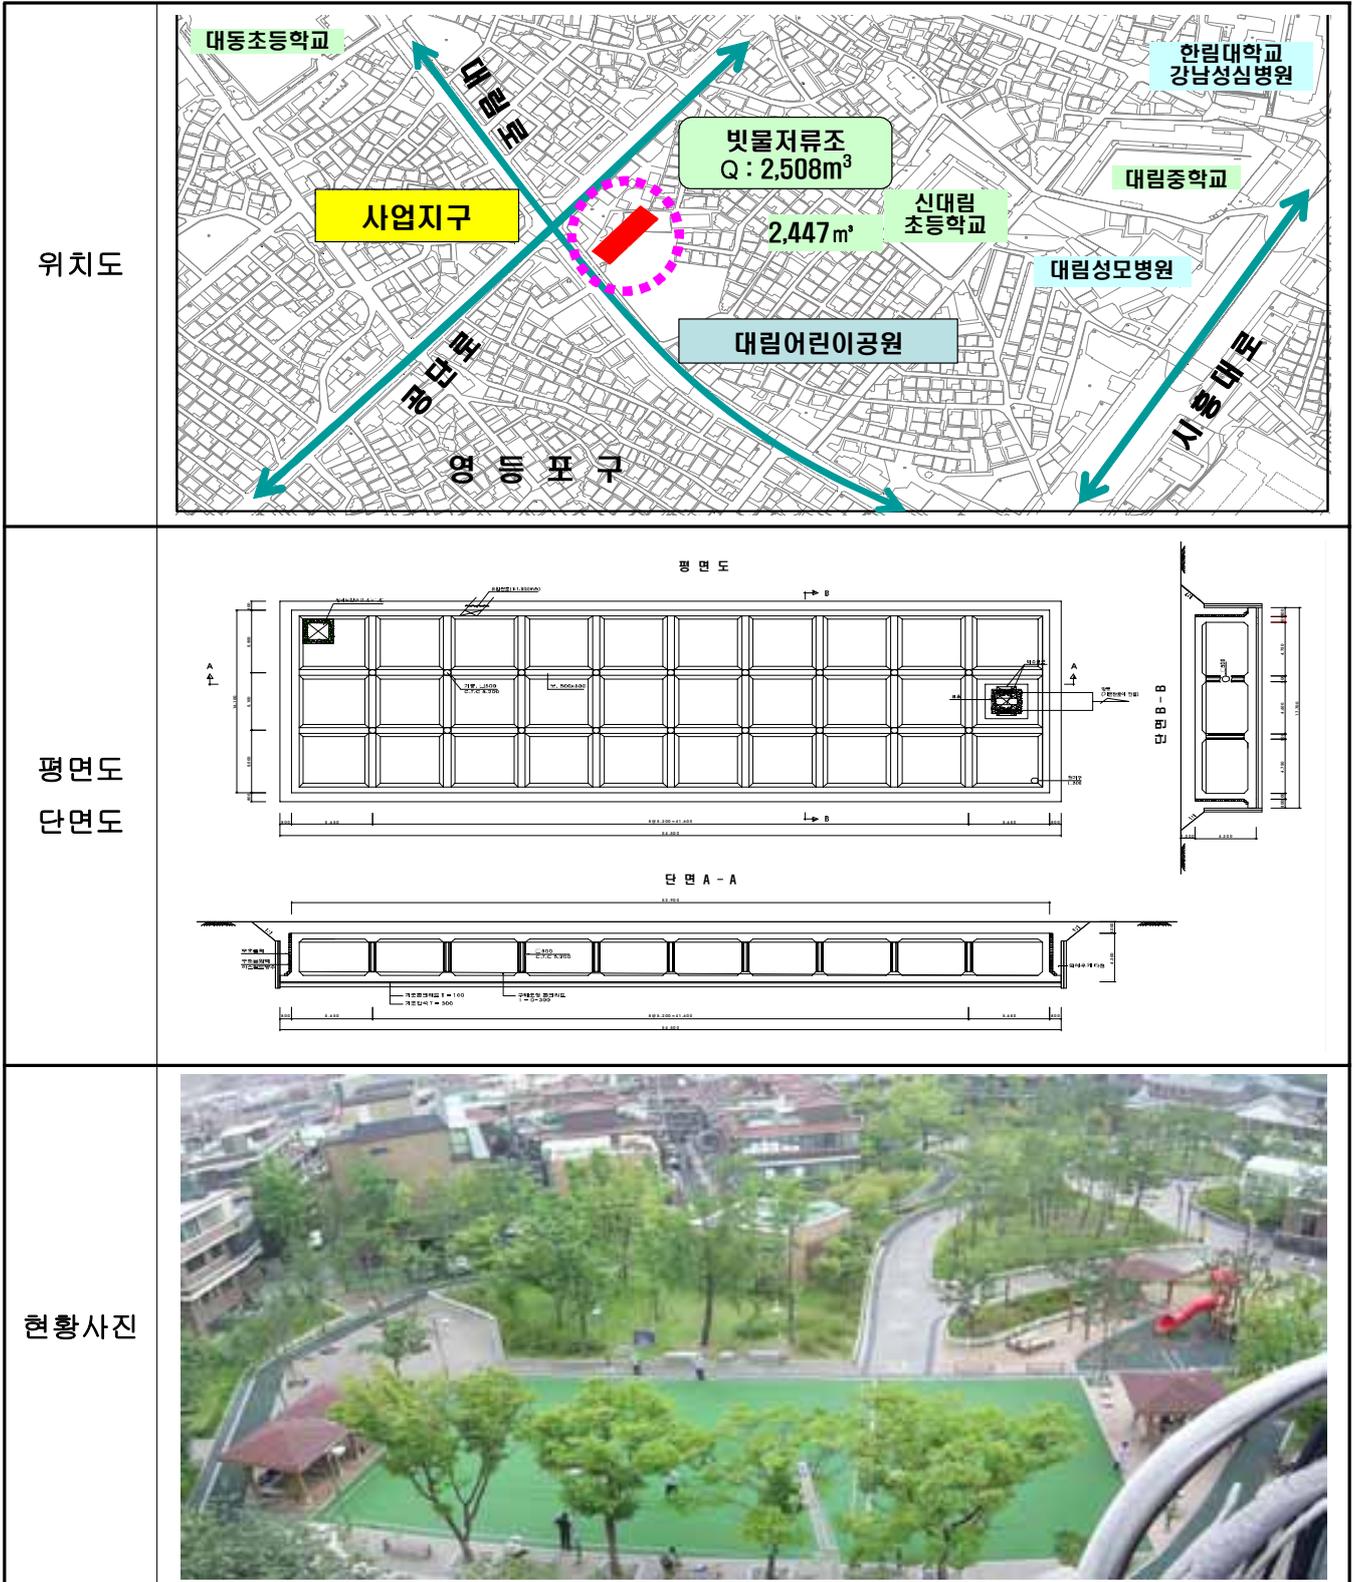

□ 사업개요

- 위치 : 신길1동 53번지
- 사업규모
 - 펌프증설 620HP×2대
 - 기존펌프 개량 350HP×5대 → 430HP×5대
 - 토출관 개량 ■2.3×2.3m(L-128.5m)
- 사업기간 : '06. 12. ~ '08. 6.
- 총사업비 : 7,747백만원('06년 2,807백만원, '07년 4,940백만원)

□ 추진실적

- '06.03.~ 10. : 기본 및 실시설계용역 시행
- '06.11.20 : 공사발주
- '07.04 ~ '08.03 : 노후펌프 개량공사 완료
- '07.07 ~ '08.02 : 기존 토출관 개량공사 완료
- '08.06 : 공사준공

□ 효과

- 기상이변과 집중호우에 대비한 수방시설능력 향상으로 수해로부터
구민의 생명과 재산 보호
 - 수방시설능력 : 설계 강우빈도 10년 → 30년으로 상향

위 치 도

▶ 공 사 명 : 신길 빛물펌프장 증설공사



□ 목 적

- 기상이변과 집중호우에 대비한 수방시설능력 향상
 - 수방시설능력 : 설계 강우빈도 10년 → 30년으로 상향

□ 사업개요

- 위 치 : 양평1 빗물 펌프장(양평동 3가 57번지)
도림2동 빗물펌프장(도림2동 254번지)
- 사업규모

구 분	사 업 내 용	사 업 비 (백만원)	비 고 (현 황)
계	2개소	16,621	
양평1 빗물펌프장	펌프용량 증대 (2,424m ³ → 4,080m ³)	8,057	630HP×12대
도림2동 빗물펌프장	펌프용량 증대 (1,301m ³ → 1,745m ³)	8,564	500HP×4대 250HP×3대

- 사업기간 : '07. 12 ~ '09. 12
- 총사업비 : 16,621백만원(시비)

□ 추진실적

- '07. 12 : 기본 및 실시설계용역 발주
- '07. 12 ~ '08. 7 : 기본 및 실시설계용역 추진 중

□ 향후 추진계획

- '08. 7 ~ 8 : 계약심사 및 공사발주
- '08. 9 ~ '09. 12 : 공사시행

위 치 도

▶ 기상이변 대비 수방시설 능력 향상 (양평1,도림2동 빗물펌프장 증설공사)



하천 및 우수지의 효율적 운영

14 도림천 하천정비 사업

□ 사업개요

- 위치 : 하천정비 L-4.28km(지방2급 하천)
안양천 합류부 ~ 구로디지털단지역
- 사업규모 :
 - 1) 제방보축 : L-307.7m (H-0.3~2.0m)
 - 2) 공간정비 : 저수호안 L-4.0km, 쉼터 3개소
자전거도로 및 산책로 L-2,788m
진입로 2개소, 기타시설 1식(체육시설 등)
- 사업기간 : '04. 4 ~ '09. 12
- 총사업비 : 8,012백만원(시비 50%, 구비 50%)

□ 추진실적

- '04. 4 ~ '05. 8 : 안양천 외 17개 하천정비 기본설계용역(서울시)
- '06.12 ~ '07.10 : 도림천 하천정비 실시설계용역(서울시)
- '08. 6 : 서울시 자치구 보조사업 지원기준 재조정
(구비 : 시비 - 70% : 30% → 50% : 50%)

□ 향후 추진계획

- '08. 7 ~ 8 : 계약심사 및 공사발주
- '08. 9 ~ '09. 12 : 공사시행

위 치 도

▶ 공사명 : 도림천 하천정비 사업



□ 사업개요

- 위치 : 양평동6가 99번지(한솔아파트 앞)
- 시설규모
 - 지하보도(폭 4m이상, 연장 180m)
- 사업기간 : '08. 10 ~ 2010. 12
- 총사업비 : 약 10,000백만원(시비)


□ 추진실적

- '07.10 ~ 11 : 시의원 건의
 - 조은주 의 1,968인 서울시의회 청원
 - 신영애 의 1,209인 집단민원
- '07.11 : 청원 수용(서울시의회)
- '07.12.28 : 민원처리결과 통보(한강사업본부 → 구)
- '08.04.16 : 시 투 · 용자사업심사분석 의뢰(구 → 한강사업본부)
- '08.06.25 : 시 투 · 용자사업 실무심사
(기본계획 및 사업추진방침 미 수립으로 반려)

□ 향후 추진계획

- 기본계획 및 사업추진방침 수립 후 재 상정(한강사업본부) 예정

양평동 한강시민공원 접근로 설치 (안)

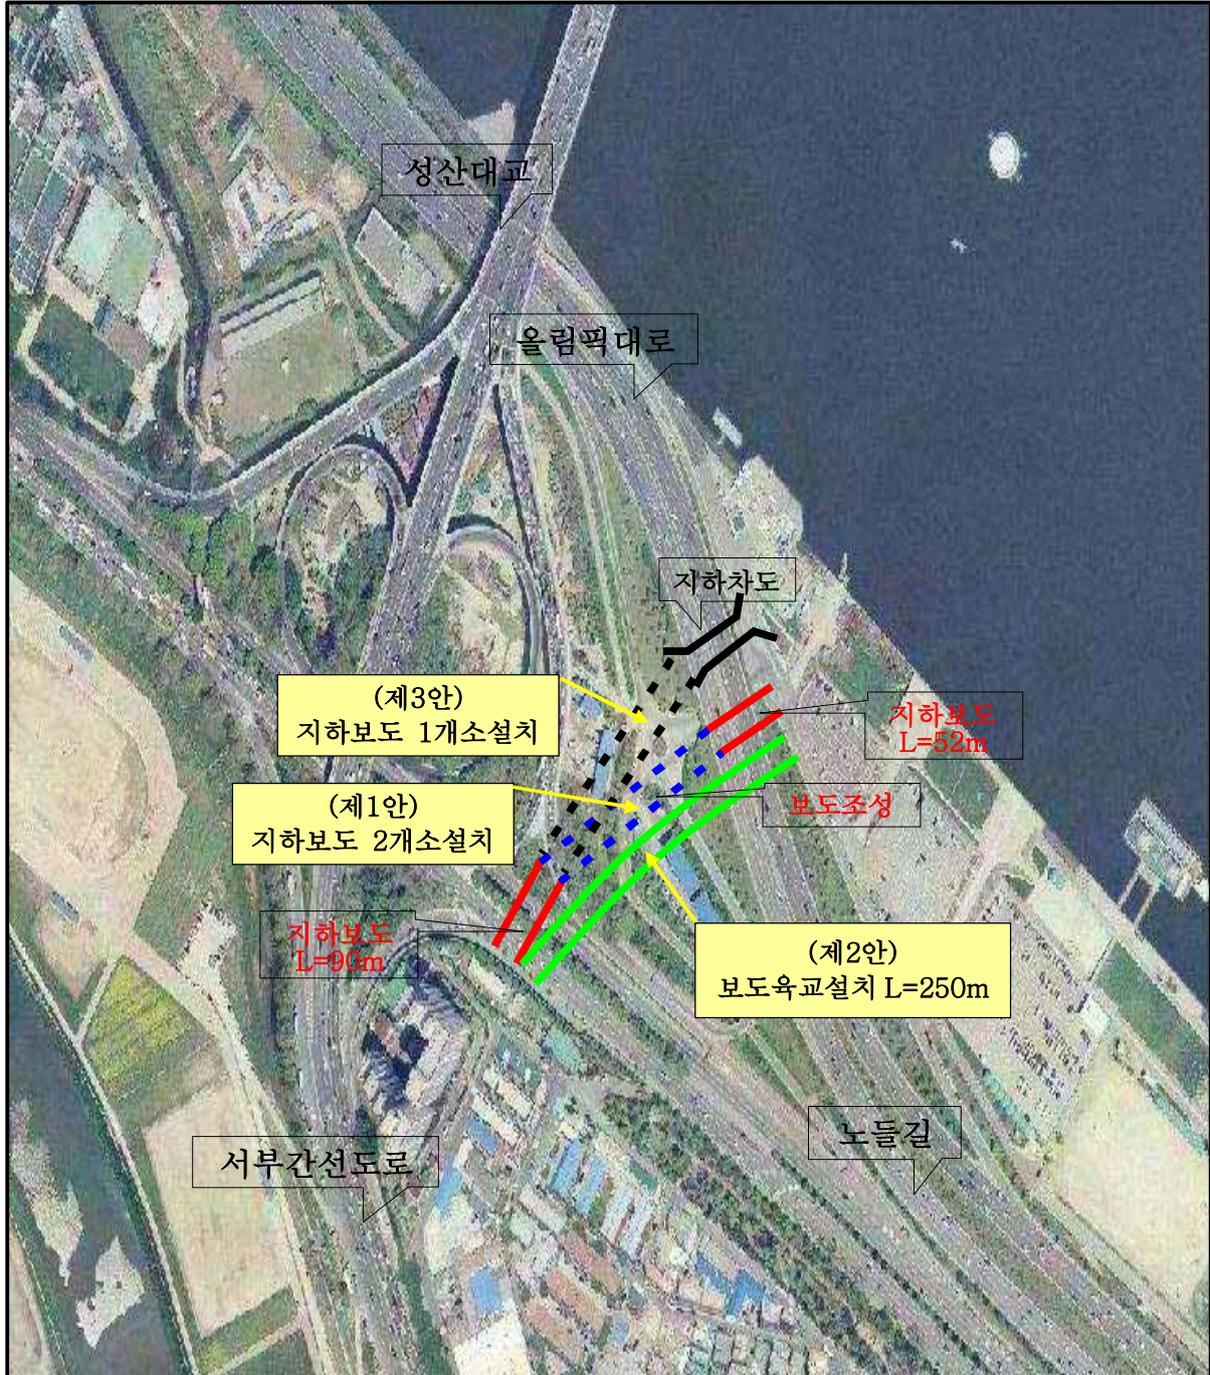

16 | 첨단기계식 자전거 주차타워 건설

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구청내 지하주차장 출입구 동측
- 규 모 : 120대 규모 (바닥면적 80m²)
- 추진기간 : 08.1.1 ~ 08.5.30
- 사 업 비 : 780백만원 (구비 328백만원, 시비 452백만원)

□ 추진실적

- 무인단말기 (KIOSK) 3대 설치 완료
- 대여자전거(40대) 확보 및 서비스제공
- 회원가입 홈페이지 개설
- 자동 공기주입기 1개 설치
- 별도의 회원카드 발급없이 T-money 또는 교통카드 사용가능토록 함

○ 위치도



○ 준공사진



□ 사업개요

○ 총 8개구간 : L-15.1km

연번	도로명	구 간	연장 (m)	추진실적
1	성원마을길	롯데제과(양평2육교) ~ 신유고교	340	규제완료 및 시비 예산심의중
2	당산서길	신유고교 ~ 당서초교	380	규제완료 및 시비 예산심의중
3	한이울길 한선길, 풍요길	양평1가20(신동아@)~당산1가 22	1,400	설계용역중 신규발굴구간
4	여의서로	서울교북단~국회뒤~서강대교남단	2,320	
5	여의동로	서울교북단~63빌딩~여의초교	2,800	
6	제물포길	경인고속도로입구~여의2교~서강대교	2,670	십자축(동서) 자전거도로
7	당산로	당산역~구청~문네역~국화@	2,500	십자축(남북) 자전거도로 (당산역~구청사거리 구간 교 제완료 및 시비 예산심의중)
5	도림로	국화@~도림고가~신길광장~대림역	2,700	십자축(남북) 자전거도로


□ 추진실적

- 성원마을길(L-340m), 당산서길(L-380m), 당산로 일부구간
(당산역~구청사거리 L-1km) 총 3개구간 1.7km에 대하여
서울지방 경찰청 교통규제 완료 및 서울시(계약심사과) 예산심의중
- 잔여구간은 설계용역으로 추진되며 현재 기본설계 용역 완료
 - 용역목적 : 서울지방경찰청의 교통규제 협의절차 수행
 - 용역기간 : '08.3.24 ~ '08.6.20
 - 용역비 : 19백만원(구비)

□ 향후 추진계획

- 3개구간 1.7km 시비확보 후 공사시행
- 잔여구간 서울지방경찰청 교통규제 협의 추진(사업비는 전액시비)

○ 08 자전거도로 사업대상 구간

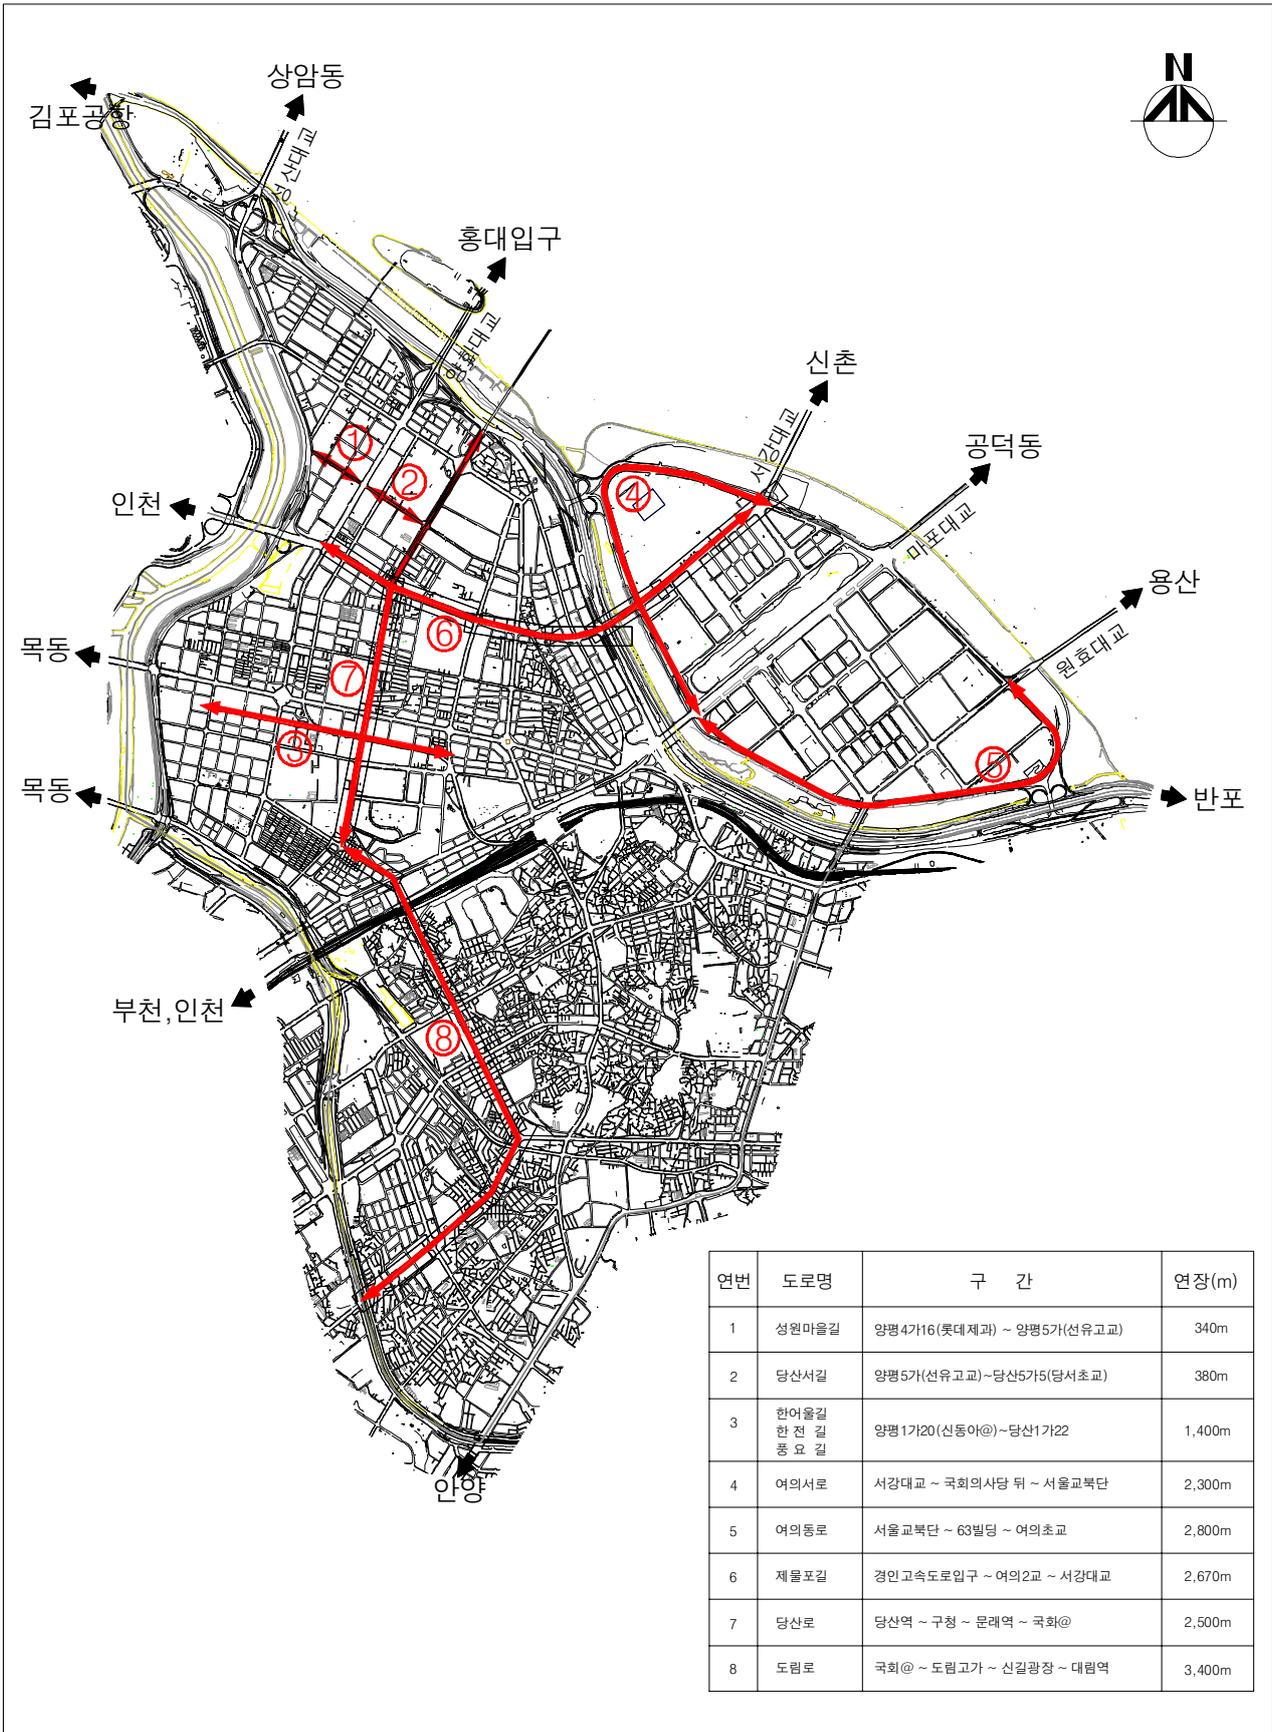

□ 사업개요

- 위 치 : 신길역1호선 승강장
- 사업내용 : 보행약자를 위한 승강편의시설(엘리베이터) 3개
- 추진목적 : 신길역1호선 보행통로끝단~지상부 승강장 이동시 보행약자(장애인,노약자)를 위한 승강편의시설 설치
- 추진방법 : 한국철도공사(50): 구비(50)으로 사업비 공동투자
 ※ 한국철도공사 지침에 의거 50% 사업비 지원한 자치구 우선설치

□ 추진실적

- 08.4.17 : 한국철도공사에 설계용역비 예산규모 통보요청
- 08.6. 4 : 한국철도공사(수도권서부지사) 협의결과 설계용역비(5천만원) 구청에서 50% 지원 요구 (08년 추경예산 확보)

□ 향후 추진계획

- 08년 추경예산으로 용역설계비 확보 및 한국철도공사 지급
- 설계용역결과에 근거 09년도 엘리베이터 3개소 설치비용 확정 및 50% 지원을 통해 09년도 준공

고객중심의 쾌적한 교통환경 조성

19 어린이보호구역(School Zone) 환경개선

□ 사업개요

- 사업대상 : 5개초등학교 및 유치원 1개소
 - 윤중, 여의도, 우신, 영림, 선유초교 및 성모유치원
- 사업내용
 - 도로시설 : 보도설치 및 칼라포장, 과속방지턱도색, 안전휀스 설치등
 - 교통시설 : 교통안전표지 설치, 횡단보도,노면,차선도색
- 추진기간 : 07.12.27 ~ 08.6.24
- 사업비 : 708백만원 (시비)

□ 추진실적

- 08.4.24 : 선유초교 개선공사 완료
- 08.6.18 : 윤중초교, 성모유치원 개선공사 완료
- 08.6.24 : 여의도, 우신, 영림초교 개선공사 완료

□ 향후 추진계획

- 03~08년간 초등학교(22개교) 및 유치원(1개소)는 어린이보호구역 개선공사 완료하고
- 나머지 유치원(6개소) 및 어린이집(8개소) 주변에 대하여 09년부터 연차적으로 어린이보호구역 개선공사 추진

○ 08년사업 위치

연번	학 교 명	위 치	비 고
1	선유 초교	양평2동 91번지	
2	윤중 초교	여의도동 38번지	
3	여의도 초교	여의도동 40-3번지	
4	우신 초교	신길동 210번지	
5	영림 초교	대림2동 993-16번지	
6	성모유치원	신길7동 890번지	

○ 어린이보호구역 개선공사



대중교통 활성화로 교통난 완화

20

교통량감축을 위한 기업체교통수요관리

□ 사업개요

- 교통감축프로그램 참여시설 확대(2008년 신청목표 : 147개소)
- 추진기간 : 2008 년중
- 민간시설물 및 공공기관 기업체 교통수요관리 프로그램 100% 참여 추진
- 참여시설에 대한 지속적인 이행 독려를 위한 점검 및 인센티브 부여
- 교통량 감축 이행프로그램 내용
 - 승용차 부제, 주차장유료화 등 탄력적 교통량 감축 프로그램운영

□ 추진실적

- 프로그램 신청현황 :139개소(6월말)
- 교통량 감축 이행프로그램 점검을 및 회수 : 90%,3회
- 교통량 경감제도 안내 및 홍보: 공한문 발송(2회)
- 경감심의위원회 개최 : 8월중

□ 향후 추진계획

- 프로그램 추가 참여실적을 위한 현장방문 및 공문발송
- 프로그램 내실화를 위한 지속적인 이행독려 및 점검(1회)
- 기업체별 업종특성에 따라 효율적인 교통수요관리 프로그램 안내
- 창의적 프로그램 운영에 대한 지원 및 경감심의 위원회 운영 강화
 - 창의적 교통수요 감축 프로그램에 대한 지원 강화로 자발적 참여 유도
 - 외부인으로 구성된 경감심의위원회의 객관적 평가를 통한 경감률 결정

주차시설 확충으로 주민 불편 해소

21 주택가 주차난 해소를 위한 주차시설 확충

주택가 공영주차장 및 학교·공원 등에 지하주차장을 건설하여 주택가의 부족한 주차시설을 확보함으로써 지역주민들의 불편을 해소하고자 함.

□ 사업목표

- 1동 1개소 주택가 공영주차장 확보 추진
 - 미확보동 : 도림1, 문래1, 양평1, 신길5
- 대림운동장 지하공영주차장 건설('08.1.11 착공)
- 신길7동 주택가 공영주차장 건설('08.9월 착공예정)

□ 추진방향

- 주차수요보다 공급이 부족한 지역 위주로 공영주차장 건설
- 공공용지(학교·공원지하 등)를 활용한 주차장 건설을 통해 토지이용의 효율성 제고 및 주택가 주차난 완화
- 주차수급율이 낮은 지역위주로 공급하되 **그린파킹 사업과 연계추진**

□ 세부 추진계획

(단위:백만원)

사업명	규모 (면수)	사업비			사업기간	추진계획
		계	구비	시비		
계		21,519	17,144	4,375		
대림운동장 지하주차장	191면 (지하2층)	4,375 (총8,912)	0 (기4,537)	4,375	2007.6~ 2008.12	'08.1.11. 공사발주 '08.12.6. 준공예정
신길7동주택가 공영주차장	23면 (평면식)	2,004	2,004		2008.2~ 2008.12	'08.6.23. 보상완료 '08.9월중 공사착공
주택가 공동주차장	일정규모	15,140	15,140	추 후 확 보	2007.~ 계속	- 년중 사업부지 확보 시행

대림운동장 주변은 신영초등학교와 연립주택·빌라·다가구 밀집지역으로서 주차장 확보면적이 부족하여 시급히 건설이 필요하므로 대림운동장 재정비사업(인조잔디구장 조성 및 정비)과 병행하여 지하주차장을 건설하고자 함.

□ 사업개요

- 공사위치 : 영등포구 대림3동 780번지(대림운동장)
- 사업규모
 - 연 면 적 : 6,349m²
 - 주차규모 : 지하2층, 철근콘크리트조,
 - 주차면수 : 191면(지하1층 94대, 지하2층 97대)
- 사업기간 : 2008.01.11 ~ 2009.01.06
- 소요예산 : 9,073백만원(구비·시비 각 50%)

□ 추진실적


- '07.12.31 : 시공사 및 감리사 계약
- '08.01.11 : 공사 착공(1.28 기공식)
- '08.02.11~'08.03.31 : 지장시설물 철거 및 수목이식
- '08.02.19~'08.04.14 : S.C.W 공사
- '08.04.15~: 토공(매립폐기물 선별, 토사반출) 및 1단 가시설공사
- '08.06.12~: 2단 가시설공사 및 버팀보 설치

□ 향후 추진계획

- '08.08.15 : 구조물공사 완료 (지하2층 슬라브)
- '08.09.01~'09.01.06 : 건축공사 및 전기, 통신 기타공사
- '08.09.30 : 구조물공사 완료 (지하1층 슬라브)
- '08.10.31 : 되메우기 완료
- '09.01.06 : 준공 예정

※ 자동계측기 설치 → 실시간 현장 파악 및 우기대비 안전시공

□ 위치도

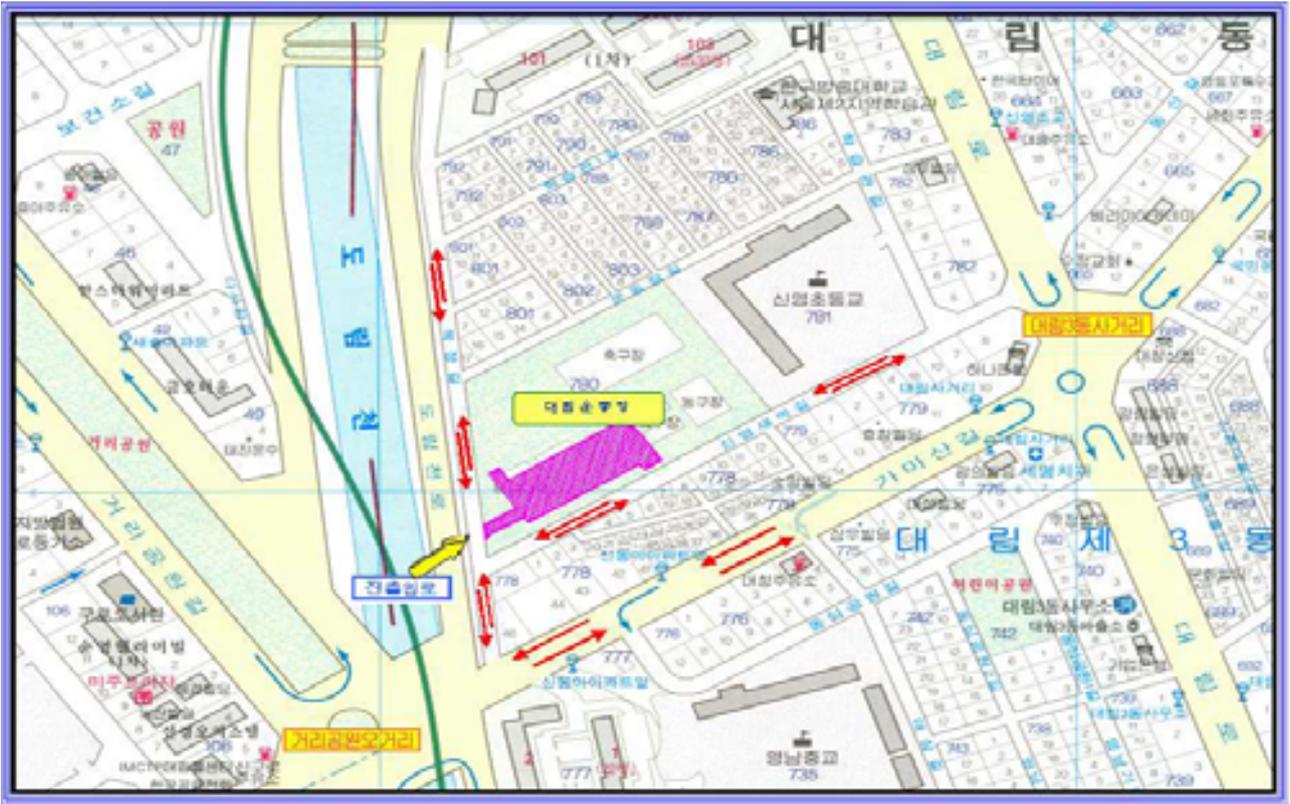

□ 현황사진



신길7동 1166-1번지(연립주택)에 주택가 주차난을 해소하고 이면도로의 통행권 확보 및 소방도로의 기능유지로 주민들의 생활편의를 도모하고 도시계획 시설(주차장)을 결정하여 부지를 매입 주차장을 건설하고자 함.

□ 사업개요

- 사업 위치 : 영등포구 신길7동 1166-1
- 사업 규모
 - 부지면적 : 529.3m²
 - 내 용 : 평면식 노외주차장 23면 설치
- 사업 기간 : 2008. 2~ 2008. 12
- 사 업 비 : 2,004백만원(부지매입비, 공사비)

□ 추진실적

- '08.02.05 : 신길7동 주택가 공영주차장 건설 계획 수립
- '08.02.05 : 도시계획시설(주차장)결정 입안
- '08.03.13 : 도시계획시설(주차장)결정 및 지적승인고시
- '08.04.03 : 도시계획시설(주차장)사업 실시계획 인가고시
- '08.04.14 : 투자심사 결정
- '08.04.07~06.23 : 보상계획 수립 공고 및 보상금지급(가로경관과)

□ 향후 추진계획

- 주거이전비 지급 및 거주자 이주대책 : '08. 7~8월 (가로경관과 협조)
- 실시설계 용역 : '08. 7~8월
- 건물철거 및 주차장 조성 : '08. 9~12월

주택가 담장과 대문을 허물어 부족한 주차장과 녹지를 확보하고 구민이 안전하고 쾌적하게 보행할 수 있는 생활도로를 조성하여 주차질서 확립과 자연친화적인 주거환경을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 대문과 담장을 허물어 주차장과 조경을 설치하여 주거환경개선 및 마을공동체 의식 회복 도모
- 저렴한 비용으로 주차시설확충 연차별 지속추진
- 차고지 확보의식 정착 및 주민 자율관리 체계 구축
- CCTV상황실의 방법, 불법주차, 쓰레기 무단투기방지와 어린이 유괴 및 성추행 방지기능 보장

□ 추진실적

(6월30일 현재)

2008년도 목표		6월말 현재 실적		비 고
가 구	주차면	가 구	주차면	
300	480	94	213	구순위 2위 (광진1위)

- 사업대상 가구의 축소로 가구 전반적으로 부진
 - 뉴타운, 재개발, 재건축 등으로 사업대상 주택 감소
- 상반기 대선기간중 사업홍보 부진

□ 향후 추진계획

- 금년도 목표 300가구 480면 조기달성
- 서울시 인센티브 평가 최우수구 실현
 - 연립주택, 다가구주택 추가 보장
 - 특수사업 시행 : 디지털 도어 록, 무단주차 차단봉 설치 등
- 주민설명회, 사진전시회 등 홍보강화

우리구 건축물 부설주차장에 대한 설치·정비 및 관리를 강화하여 불법용도 변경등으로 본래의 용도로 활용되지 못하고 있는 주차장을 본래의 기능으로 회복하여 주차난 해소에 기여코자 함.

□ 사업개요

- 점검기간 : 2008. 1. ~ 2008. 12.
- 점검대상 : 총 3,815건(상반기 1,919 · 하반기 1,896)
- 점검내용 : 주차장법 위반사항 조사(기능미유지 및 용도변경 여부)

□ 추진실적

- 상반기 조사 대상 1,919건 【'93·'94·'07년 준공분 및 기계식주차장】에 대한 1차 전수조사를 마치고 주차장법 위반사항이 적발된 부설주차장에 대해 2차 전수조사 중
- 2차 전수조사 후 기능미유지 및 용도변경 사항에 대해 시정지시(30일), 시정촉구 (20일)후 미시정시 고발 및 이행 강제금을 부과하고 위반 건축물로 등재 예정

□ 향후 추진계획

- 점검기간 : '08. 9. 1 ~ 12.31
- 점검대상 : 총 1,896개소 【'88년 이전, '07년 점검시 적출분】
- 점검 내용
 - 부설주차장 불법 용도변경 및 기능유지 여부
 - 인근설치 부설주차장의 적정 유지관리 여부
 - 부설주차장야간 개방 참여유도
 - 기타 주차장법 위반 여부
- 부설주차장 불법용도변경에 대한 강력한 행정조치
 - 주차장법 제29조, 제32조 규정에 의한 고발 및 이행강제금 부과
 - 건축법 제69조에 의한 건축물대장 위법표기

관내 거주하는 어르신의 주차질서 계도활동을 통하여 어르신 사회참여 지원 및 지역사회 유대감을 형성하고 주차질서를 개선함으로써 주민 편의를 증진코자 함

□ 사업목표

- 계도활동을 통한 기초질서확립 시민공감대 확산
- 어르신의 사회적 경륜을 활용하여 사회참여기회 확대 및 선진 주차 문화의식 고취

□ 추진실적

- 참여인원 : 1일 88명(연인원 9,504명)/4인2조(1일2시간,월12회)
- 소요예산 : 100,476천원(임금 및 운영비 등)
- 실적 : 12,526 건(이동 및 계도조치)

□ 향후 추진계획

- 주요 계도활동 지역 범위 확대
 - 이면도로 및 골목진입로, 마을버스 통행로, 일방통행로
 - 어린이 보호구역 및 그린파킹사업지구 주변
 - 주차장 입구, 점포 앞, 대문을 가로막은 차량
 - 이중 및 직각주차,소통장애 유발차량, 노상주차장주변
- 계도 활동 인원 확대 실시
 - 확대 운영계획
 - 확대운영기간 : 2008.7월~11월
 - 확대인원 : 1일 128명(증원40명) → 6인3조
 - 총 예산 : 100,476천원→126,636천원(추경 26,160천원)
