

제183회 구의회 제1차 정례회

부서 보고자료

청렴 영등포

2014년 주요업무 보고



도 로 과

보고 순서

1. 일반 현황


2. 주요업무 추진실적

3. 중점사업 추진실적

I 일반 현황



1 조 직

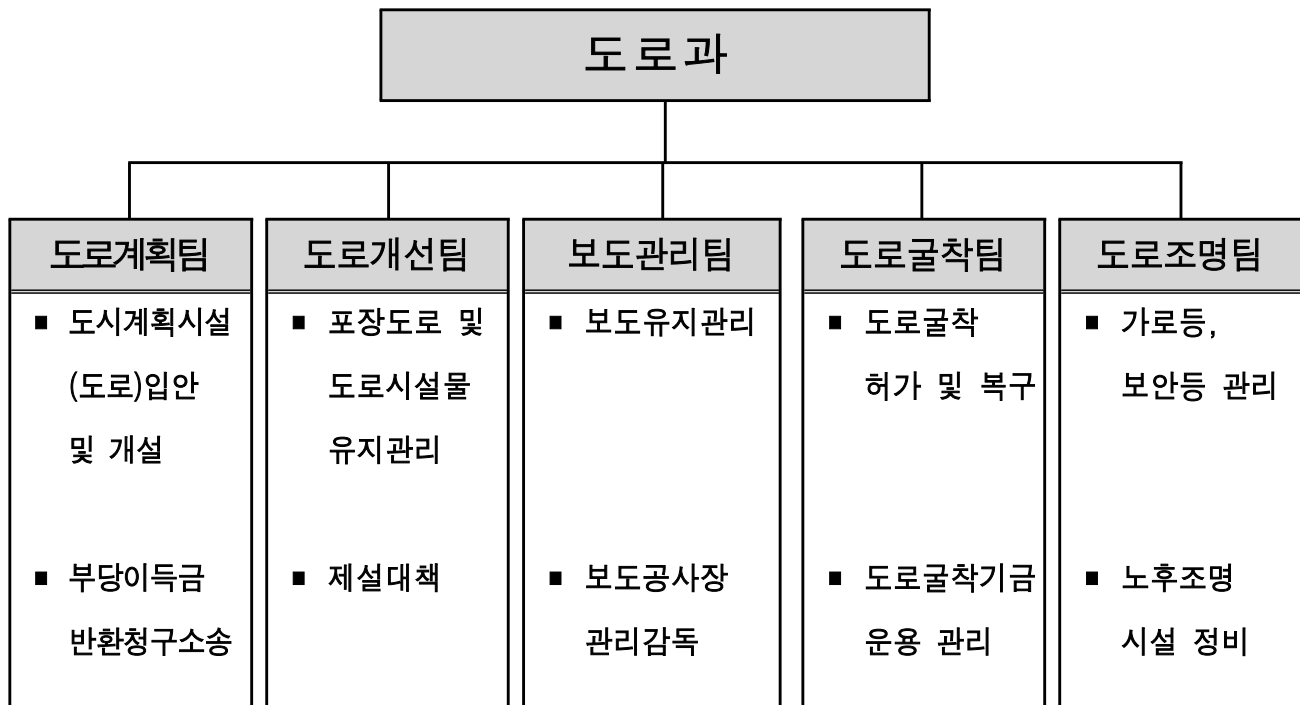

2 현 황

구 분	계	일 반 직				
		5급	6 급	7 급	8 급	9급
정 원	32	1	5	13	9	4
현 원	31	1	7	15	7	1
과 부족	△1		2	2	△2	△3

3

주요시설 현황

□ 도 로

○ 주요간선도로 : 경인로 외 27개 노선

연장 387.9km		도로율
시도 76.0km	구도 311.9km	23.35% (서울시 : 22.32%)

※ 서울시 도로 총연장 : 8,198km

□ 교량 및 고가차도

교량(20개소) - 시 관리	고가차도(6개소) - 시 관리
양화교, 신정교, 양평교, 서울교, 여의2교, 목동교, 오목교, 도림교, 구로1교, 염창교, 여의교, 구로교, 샛강다리교, 선유교, 한강교량(6개소 : 성산, 양화, 당산, 서강, 마포, 원효)	선유, 도림천, 영등포역, 보라매, 도림, 신길

□ 지하차도 및 지하보도

지하차도(12개소) - 시 관리	지하보도(1개소) - 구 관리
국회앞, 여의2교, 목동교동측, 오목교동측, 성산, 신정교동측, 노들길(서울교남단), 신길, 서울교 접속 지하차도, 영등포, 대방, 여의교	여의초교 앞

□ 보도육교 및 입체교차로

보도육교(6개소) - 구 관리	입체교차로(5개소) - 시 관리
우신초교, 양평1, 양평2, 문래, 영등포 수원지, 영등포역 횡단보도육교	영등포R, 여의하류, 여의상류, 목동교동측 IC, 염창 IC

□ 조명시설

가 로 등 - 구 관리	보 안 등 - 구 관리
8,576등	9,670등

4

예 산 현 황

(단위 : 천원)

단위사업명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	6,385,796	4,182,877	65.5%
도로개설및확장	651,800	305,499	46.9%
도로개설 지원	8,040	3,650	45.4%
도로정비	2,287,627	1,761,753	77%
도로관리	498,728	360,322	72.3%
도로조명시설정비	594,500	134,895	23.7%
도로조명 관리	1,678,385	1,196,535	71.3%
행정운영경비	666,716	420,223	63%

5

주요투자사업 추진현황

연번	공 사 명	2014예산	개 요	추진내용	비 고 (공정률)
1	도림로 확장공사(2014)	4,500,000 (시비)	◦도로확장 B = 30→35m L = 360m	◦아스팔트포장 (#467) A=9a	85%
2	당산동~샛강공원간 연결로 설치공사(용역)	1,290,000 (시1000, 구290)	◦연결로 설치 B = 5.0m L = 138m	◦건설기술심의 완료에 따른 심의사항 반영검토	50%
3	신도림역~도림동 연결로 설치공사(용역)	253,000 (시비)	◦연결로 설치 B = 2.5m L = 102m	◦교량형식 선정위원회 개최 준비	20%
4	포장도로정비 등 소파 보수공사(연간단가)	1,135,000	◦ASP 포장 190a ◦콘크리트포장 9a ◦보도포장 60a	◦포장보수 179개소	96%
5	도로시설물 설치 및 보 수공사 (연간단가)	500,000	◦지하보도 1개소 ◦보도육교 6개소 ◦옹벽석축 5개소	◦보도육교 보수14건 ◦과속방지턱 220개소 정비	85%
6	영등포동6가 35주변 도로포장공사	100,000	◦ASP포장 : B=8m, L=120m	◦착공 : 2014. 3. 3 ◦준공 : 2014. 5. 1	준공
7	오목교 엘리베이터 설치 공사	350,000 (시주민참여)	◦엘리베이터설치 및 보행환경 개선	◦엘리베이터 설치중	50%
8	여의도고등학교 앞 방음벽 교체공사(2차분)	287,000 (시비)	◦방음벽 교체 : H=4~5m, L=56m	◦착공 : 2014. 3. 3 ◦준공 : 2014. 6.19	준공
9	영등포초등학교 앞 방음벽 교체공사	120,000 (시비)	◦방음벽 교체 : H=8m, L=55m	◦착공 : 2014. 8. 4 ◦준공 : 2014. 8.20	준공
10	여의대방로(시흥대로) 안전휀스 설치	310,800 (시비)	◦안전휀스 설치 1,639m	◦착공 : 2014. 3. 1 ◦준공 : 2014. 5. 31	준공
11	보라매역 주변 투수블록포장공사	160,000 (시80, 구80)	◦보도블록포장 11.2a	◦착공 : 2014. 3.17 ◦준공 : 2014. 6.13	준공
12	관내 불량맨홀 정비공사 (연간단가)	90,000	◦맨홀정비 89개소	◦정비대상 현장조사	88%
13	2014년 가로등 시설물 정비공사(연간단가)	222,000	◦가로등 정비 22본 ◦분전함 정비 3면 ◦기타 유지보수 1식	◦가로등 정비 16본, 분전함 정비 6면, 기타 정비 1식	65%
14	2014년 보안등설치 개량 및 유지보수(연간단가)	292,500	◦설치 개량 48개소 ◦기타 유지보수 1식	◦보안등 설치 개량 60등, 보수 1,310등	65%
15	관내 LED보안등 설치공사	142,000 (국30,시32, 구80)	◦보안등 개량 127등 ◦기타 배관 및 배선1식	◦LED보안등 20등 설치	15%
16	경인로 가로등 개량공사	870,000 (시비)	◦가로등 개량 155등 ◦기타 배관 및 배선1식	◦터파기 1,200m 완료 ◦등기구 교체 43등	45%

목 차

주요업무 추진실적

1. 도림로 확장공사	6
2. 신도림역~도림동 연결로 개선공사	8
3. 대림동 812-12번지 도로개설공사	9
4. 포장도로정비 등 소파보수공사	11
5. 도로시설물 설치 및 보수공사	12
6. 영등포동6가 35주변 도로포장공사	13
7. 오목교 엘리베이터 설치공사	14
8. 여의도고등학교 방음벽 설치공사	15
9. 영등포초등학교 방음벽 설치공사	16
10. 여의대방로(시흥대로) 안전휀스 설치	17
11. 2013/14년 제설대책추진	18
12. 보라매역주변 투수블록 포장공사	19
13. 도로관리심의회 투명한 행정구현	20
14. 관내 불량맨홀 정비공사	21
15. 다가가는 현장행정 주민참여 보안등 야간순찰 강화 ..	22
16. 가로등시설물 정비공사	23
17. 보안등 설치개량 및 유지보수공사	24

중점사업 추진실적

1. 당산동~샛강생태공원간 연결로 설치공사	25
2. 관내 LED등 보안등 공사	27
3. 경인로 가로등 개량공사	28

II 주요업무 추진실적



1 도림로 확장공사

도로계획팀

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동421-16간(신길광장)
 ※ 금회 工 공사 - 신길동 373-1(도림사거리) ~ 355-677(성락주유소)
 工 보상 - 신길동 401-11 ~ 399
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m(기개설 710m, 미개설 440m)
 ※ 금회 工 공사 - 도로확장 폭 25→35m, 연장 360m
 工 보상 - 토지 7필지(466㎡), 연장 90m
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 총사업비 : 44,650백만원(시비:보상비 39,200 공사비 5,300 설계비 150)
- 연차별 투자계획 (단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진내용	용역	150	150					
	보상	39,200	29,100	3,500	500	6,100		
	공사	5,300	2,800	1,000	500	1,000		
총사업비		44,650	32,050	4,500	1,000	7,100		

□ 추진실적

- '14.2.27~12. : (성락교회측) 90m 실시계획인가고시 및 보상시행
- '14. 3. 5 : (성락교회측) 360m 공사착공
- '14. 12. : (성락교회측) 360m 공사준공(예정)

□ 향후계획

○ '15. 1. : 공사 및 보상시행

- 공사 : 도로확장 폭 25→35m, 연장 160m
- 보상 : 토지 1필지(65㎡), 연장 17m

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
4,500,000 (시비 4,500,000)	500,000	11.1%

□ 위 치 도



도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로의 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근로 및 편의성 향상을 도모코자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 102m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역	180	50	130				
	보상							
	공사	2,700		123	2,577			
총사업비		2,880	50	253	2,577			

□ 추진실적

- '13. 5.13~10.24 : 타당성조사 용역 시행
- '14. 3.11~ : 기본 및 실시설계 용역 시행중

□ 향후계획


- '14.11 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사발주(예정)
- '15. 1 : 공사시행

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
253,000 (시비 253,000)	56,900	22.5%

□ 위치도

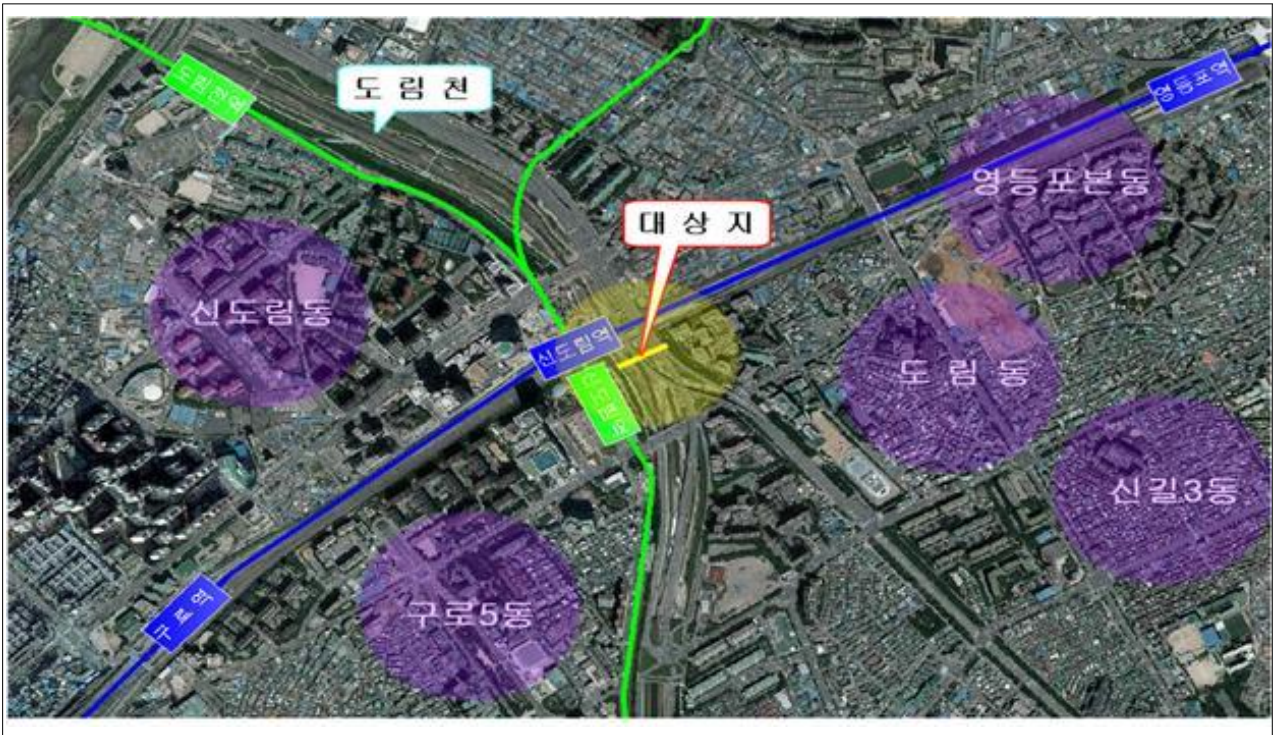

3 대림동812-12번지 도로개설공사

도로계획팀

장기미집행 도시계획시설(도로) 사업시행으로 주민숙원사업 해소 및 주거환경개선

□ 사업개요

- 위 치 : 대림동 812-12번지
- 규 모 : 도로개설 B = 6m, L = 14m
- 사업기간 : 2012년 ~ 2015년
- 총사업비 : 1,226백만원(구비)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역							
	보상	1,156	200	90	866			
	공사	70			70			
총사업비		1,226	200	90	936			

□ 추진실적

- '02. 4.27 : 도시계획시설(도로)결정
- '13. 6.18 : 보상일부 완료(토지2필지, 물건1건)
- '14. 3.11~ : 보상집행방안 검토보고-부구청장 방침(도로과-2543호)
- ※ 보상예산부족에 따라 보상집행 불가 → 예산 확보 후 보상시행

□ 향후계획


- '15. 1. : 보상시행

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
90,000 (구비90,000)	-	-%

□ 위 치 도

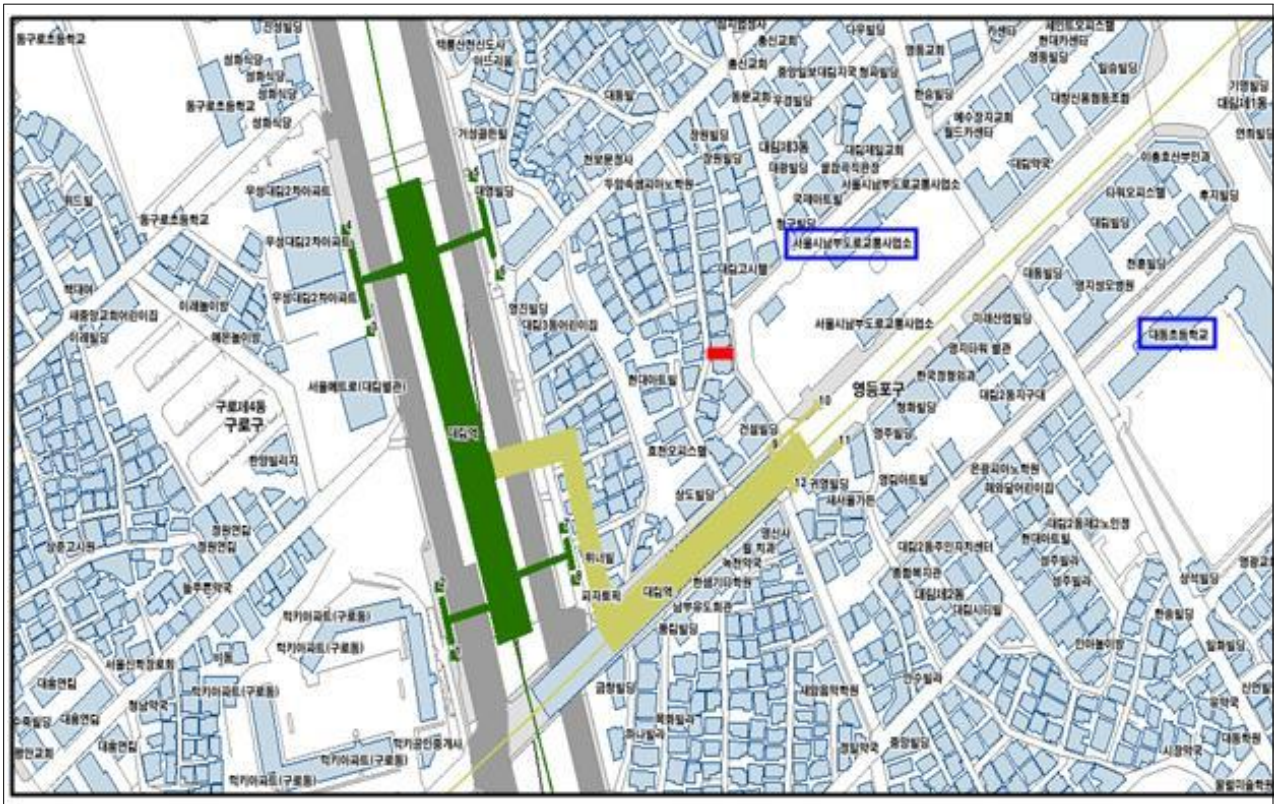

노후·파손·침하 등으로 인한 불량 도로 및 도로시설물을 보수·정비하여 도로 이용 주민 생활불편 최소화와 안전사고 예방 등 “안전한 영등포 건설”에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 아스팔트포장 190a, 콘크리트포장 9a, 보도포장 60a
- 기 간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28
- ※ “사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사” 포함 시행

☐ 추진실적

- 포장도로의 노후·파손·침하 등 주민불편사항 해소 179개소
 - 아스팔트, 콘크리트, 보도블록, 측구, 경계석 등 보수

☐ 향후계획

- 2015. 2월 : 준공

☐ 기대효과

- 포장도로 보수·정비 시행으로 통행불편 해소 및 안전사고 예방

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,135,000 (구비 1,135,000)	1,092,972	96%

※ 집행액 : 낙찰잔액, 유보액 포함

노후·파손 도로시설물을 보수·정비하여 시설물의 내구연한 확보 및 도로이용 주민 생활불편 최소화와 안전사고 예방 등 “안전한 영등포 건설”에 기여

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도육교, 과속방지턱, 안전웬스 등 도로시설물 유지관리
- 기 간 : 2014. 3. 5 ~ 12. 31

☐ 추진실적

- 보도육교 보수 14개소
- 과속방지턱 신설, 도색 등 220개소
- 지하보도, 안전웬스 등 기타 도로시설물 유지관리

☐ 향후계획

- 2014. 12월 : 준공

☐ 기대효과

- 보도육교 등 도로시설물의 상시 유지관리로 주민 생활불편 해소 및 안전사고 예방
- 시설물의 내구연한을 확보하고 및 도시미관 향상

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
500,000 (구비 500,000)	293,686	59%

☐ 사업개요

- 위 치 : 영등포동6가 35-1 ~ 32-8번지 간
- 규 모 : 아스팔트포장 7.6a
- 기 간 : 2014. 3. 3 ~ 5. 1

☐ 기대효과

- 도로파손 및 구배불량으로 인한 도로이용 불편 해소 및 안전사고 예방

☐ 공사전·후사진

공 사 중 (노후 구배불량 도로경계측구 깨기)	공 사 후 (아스팔트 포장 완료)
	

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
100,000 (구비 100,000)	73,423	73%

□ 사업개요

- 위 치 : 양평동2가 오목교 앞
- 규 모 : 엘리베이터 설치, 주변 보행환경 개선
- 기 간 : 2014. 5. 8 ~ 11. 3

□ 추진실적

- 엘리베이터 설치공사 중 (현공정 : 50%)


□ 향후계획

- 2014. 11월 : 준공

□ 기대효과

- 계단 뿐이던 오목교에 엘리베이터를 설치하여 장애인·유모차 등 교통약자들의 통행불편 해소

□ 위치도 및 엘리베이터 설치계획

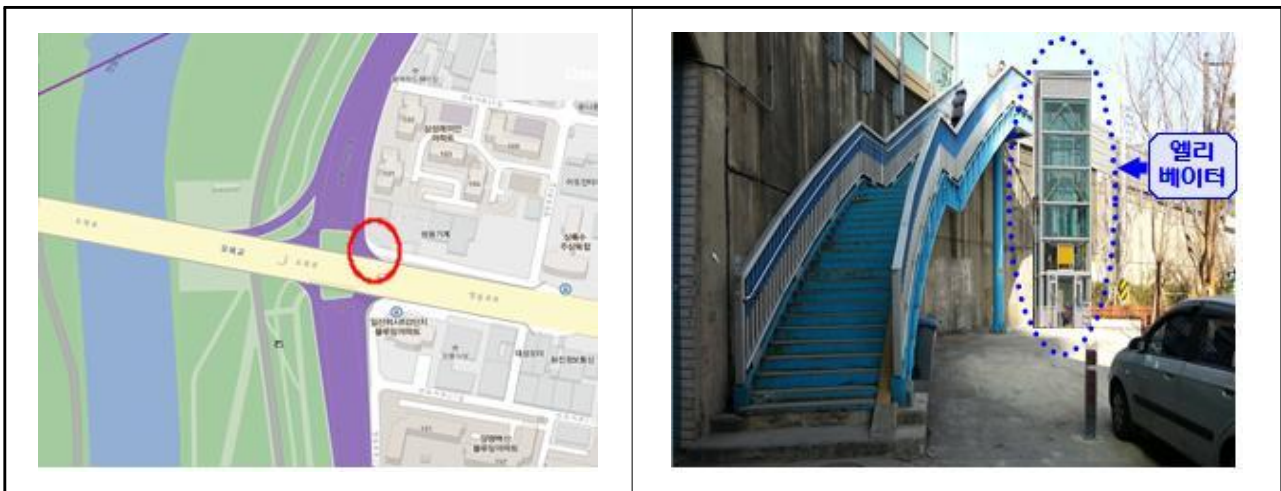

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
350,000 (시 주민참여예산 350,000)	24,630	7%

□ 사업개요

- 위 치 : 여의도동 38-1, 여의도고등학교 앞
- 규 모 : 방음벽 교체(H=4~5m, L=56m)
- 기 간 : 2014. 3. 3 ~ 6. 19

□ 기대효과

- 노후 방음벽 교체 및 학교주변 도로포장을 정비하여 소음저감 및 통학로 정비로 면학분위기 및 도시경관 향상

□ 공사전·후사진



□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
287,000 (시비 287,000)	260,143	91%

☐ 사업개요

- 위 치 : 도림로143길 20, 영등포초등학교 앞
- 규 모 : 방음벽 교체(H=8m, L=55m)
- 기 간 : 2014. 8. 4 ~ 8. 20 (방학기간 공사시행)

☐ 기대효과

- 노후 방음벽을 교체하여 소음저감으로 면학분위기 및 도시경관 향상

☐ 공사전·후사진

공 사 전	공 사 후
	

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
120,000 (시비 120,000)	120,000	100%

□ 사업개요

- 위 치 : 여의대방로(원효대교 남단 ~ 구로디지털단지역)
- 규 모 : 방호울타리 설치 및 교체(L=1,639m)
- 기 간 : 2014. 3. 1 ~ 5. 31

□ 기대효과

- 여의대방로상 노후 안전휨스 정비 및 신설로 도시미관 향상 및 안전한 보행로 확보

□ 위치도 및 사진

휨스설치 위치도	휨스설치 사진
	

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
310,800 (시비 310,800)	310,535	99%

☐ 제설대책기간

: '13. 11. 15 ~ '14. 3. 15 (4개월)

☐ 강설 및 비상근무 현황

년 도 별	'07/08	'08/09	'09/10	'10/11	'11/12	'12/13	'13/14
강설일수 (일)	12	8	19	14	17	18	13
년 강설량 (cm)	31.0	18.1	66.9	36.4	13.4	53.7	27.5
일 최대강설량(cm)	6.1	5.1	25.8	9.4	6.2	9.0	5.8
첫눈일자 (월/일)	11/19	12/7	12/25	11/28	12/9	12/3	12/11
비상근무 (일)	38	44	79	39	34	38	37

☐ 인력·장비·자재 투입현황

- 인 력 : 총 4,316명 (공무원 1,610 / 작업인력 887 / 민간단체 1,819)
- 장 비 : 총 878대 (다목적제설차, 염화칼슘살포기, 덤프트럭 등)
- 자 재 : 염화칼슘 138톤, 소금 208톤, 모래 10m³

☐ 2014/15년 제설 개선계획

- 뒷골목 등 이면도로 제설작업 확대 시행
 - 민간위탁용역 확대 및 뒷골목 제설 소형장비 확보
- 환경피해 저감을 위한 친환경 제설재 사용 확대

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
404,312 (시비 13,000 / 구비 391,312)	343,000 (시비 13,000 / 구비 330,000)	85%

보라매역 주변 신풍로 양측의 보도상 투수콘 포장 불량으로, 안전사고 및 보행불편을 호소하는 민원이 많았던 구간에 대하여 서울시로부터 사업비 일부를 지원받아 정비공사 시행


☐ 사업개요

- 위 치 : 신길6동 보라매역 주변
- 규 모 : B=2~4m, L=340m, A=11.6a
- 기 간 : 2014. 3. 14 ~ 6. 14

☐ 기대효과

- 쾌적하고 안전한 보행환경 조성
- 친환경 투수블록 포장으로 도심환경 증진

☐ 공사전·후사진

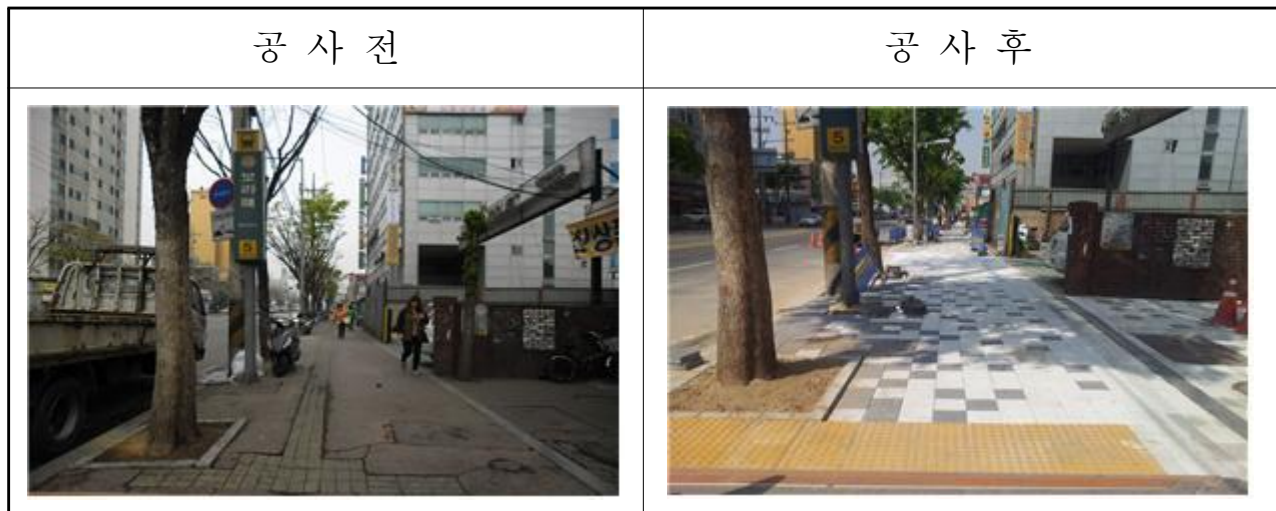

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
160,000 (시비 80,000 / 구비 80,000)	144,302 (시비 72,151 / 구비 72,151)	90%

우리 구 도로굴착사업계획에 대한 중복굴착 방지와 주요지하매설물의 안전 대책 심의·조정을 위해 개최하는 도로관리심의회를 다수의 이해관계인이 모두 참석토록 진행하여 투명한 행정 구현 및 규정 신뢰 구축

□ 추진방향

- 도로관리심의회 시 심의위원 외에도 신청관계자를 방청토록 하여 행정의 투명성 확보(한국전력, KT, 통신업체, 서울도시가스, 수도사업소, 지역 난방공사, CMB 등)

□ 추진계획

- 개최시기 : 2014년 상반기(2월), 하반기(8월) (연 2회)
 - 위원구성 : 16명(내부위원 6명, 외부위원 10명)
 - 심의내용 : 영등포구 관내에서 시행되는 도로굴착사업계획 심의·조정
 - 회의방식
 - 현 재 : 참석 대상자를 위원회 심의위원으로 한정하여 회의 진행
 - 개 선 : 상·하반기 도로관리심의회 개최 시 도로굴착 관련 유관기관 관계자 방청토록 유도하여 회의내용을 인지토록 함
- ※ 사업시행기관 간 굴착정보 공유

□ 추진실적

- 개최실적 : 상반기(2. 19), 하반기(8. 5)

□ 기대효과

- 회의운영의 공개 및 도로굴착 정보 공유로 행정의 투명성 확보
- 굴착불가 건에 대한 유관기관의 불만 해소

□ 소요예산 : 비예산

침하, 파손 등으로 도로의 기능 저하 및 안전사고의 위험이 있는 불량맨홀을 신속히 정비함으로써 도로교통의 원활한 흐름을 유지하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 상수도, 통신 등 각종 불량맨홀정비 N=89개소
- 사업기간 : 2014. 1월 ~ 2015. 2월

☐ 추진실적

맨홀종류	정비수량(개소)	비 고
계	79	
전 기	7	
통 신	37	
상 수 도	6	
소 화 전	19	
도시가스	10	

☐ 향후계획

- 맨홀뚜껑과 도로 포장면과의 단차 발생으로 인한 안전사고 예방을 위해 수시 도로 순찰 실시
 - 위험요인이 있는 맨홀에 대해서는 긴급 보수 조치

☐ 기대효과

- 도로교통의 원활한 흐름 유지
- 안전사고 예방 및 통행 불편 해소

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
90,000 (구비 90,000)	66,371	73%

15 다가가는 현장행정 주민참여 보안등 야간 순찰 강화 도로조명팀

야간 주민 생활과 밀접한 관계가 있는 보안등에 대한 야간 순찰 실시하여 현장 중심의 열린행정 구현 및 구정 신뢰 향상에 기여코자 함

□ 사업개요

- 기 간 : '14. 3. 16 ~ '14. 11. 14(제설기간 제외)
- 일 시 : 매주 화·목 19:30 ~ 22:00
- 순찰조 편성
 - 구성인원 : 국장, 도로과장, 각 동장 외 10명, 희망 주민(통장 등)
 - 조 편 성 : 2인 9개조(조원 : 도로조명팀 1, 희망주민 1)
- 운영방법
 - 주민참여순찰 : 매주 목요일 참여 주민 추천 지역 위주 순찰
 - 부서자체순찰 : 매주 화요일 1~2개동 취약지역 순찰
 - ※ 국장, 도로과장, 동장, 순찰은 매월 1회 시행(주민참여순찰시)
- 순찰결과에 따른 조치 : 적출사항 1~2일내 보수완료

□ 년도별 추진실적 및 민원감소 현황

구 분	2014년	2013년	2012년	2011년
순찰횟수	49	66	67	71
적출건수	445	706	802	1,437
전년대비 민원감소율(%)	21.1 (8월말 현재)	14.5	22.7	26.8

□ 향후계획

- 2014. 11. 14까지 야간 보안등 순찰 지속 추진

□ 소요예산 : 비예산

전기설비 기술기준 및 판단기준에 부적합한 가로등 시설물과 사고주 및 부점등 등 수시 민원이 발생하는 노후 가로등시설물에 대한 유지보수 및 정비를 위함

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28
- 규 모 : 가로등정비 22본, 분전함 정비 3면, 기타 정비 1식

☐ 추진실적

- 가로등 정비 16본, 분전함 정비 6면, 기타 정비 1식
- 공정율 : 50%

☐ 향후계획

- 노후 가로등시설물 정비 지속 추진
- 2015. 2. 28 공사 준공

☐ 기대효과

- 노후 가로등시설물로 인한 전기안전사고 예방
- 사고주 등 적기 처리 및 보수로 민원발생 최소화

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
222,000 (구비 222,000)	81,743	36.8%

야간 취약지역 골목에 보안등 신설 개량 및 부점등 등 유지보수를 실시하여 지역주민과 도로이용자의 야간 생활 편의 제공하기 위함

□ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 대 상 : 18개동 9,670등
- 기 간 : 2014. 3. 1 ~ 2015. 2. 28
- 규 모 : 보안등신설 8등, 개량 40등, 기타 고장등 보수 1식.

□ 추진실적

- 보안등 설치 개량 60등, 고장 보안등 보수 1,310등
- 공정율 : 50%

□ 향후계획

- 취약지역 보안등 설치 개량 및 고장 보안등 보수 지속 추진
- 2015. 2. 28 공사 준공

□ 기대효과

- 취약 지역 보안등 설치 개량을 통한 야간 주민 생활환경 개선
- 고장 보안등 신속한 보수로 민원발생 최소화

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
292,500 (구비 292,500)	53,152	18.2%

Ⅲ 중점사업 추진실적



1 당산동~샛강생태공원간 연결로 설치공사 도로계획팀

당산동~샛강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 샛강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하여 한강시민공원 및 여의도 공원 등의 휴식공간 및 문화 공간의 접근성 향상에 기여하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동 버드나루로14길 ~ 샛강생태공원
- 규 모 : 연결로 설치 폭 5.0m, 연장 138m
- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 총사업비 : 7,500백만원(시비 3,500, 구비4,000)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역(구비)	472	182	290				
	공사 시비	3,500		1,000	2,500			
	구비	3,528				3,528		
총사업비		7,500	182	1,290	2,500	3,528		

□ 추진실적

- '10. 2.17 ~' 10.14 : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행
- '10.12. 7 ~'11.02.10 : 보도육교 설계 현상공모 공고시행
- '13.10.10 : 투자심사 결과 통보(조건부)
- '14. 2. 7 ~ : 기본 및 실시설계 용역시행중

□ 향후계획

- '14.11 : 기본 및 실시설계 용역준공(예정)
- '15. 1 : 공사시행(예정)

□ 기대효과

- 여의도 샛강 생태공원으로의 접근성 확보로 이용 편의성 제공
- 자연생태계를 활용한 생활체육(자전거) 활성화로 시민 삶의 질 향상

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,290,000 (시비 1,000,000, 구비 290,000)	128,345 (구비 128,345)	9.9%

☐ 위치도



☐ 조감도



국가에서 추진 중인 지역 에너지절약사업 및 빛 공해 방지사업 일환으로 관내 노후 NH 100W보안등을 LED 50W이하 보안등으로 교체 설치하여 전기 에너지 절약에 적극 동참하고 예산 절감에 이바지하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : 2014. 7. 31 ~ 2014. 10. 28
- 규 모 : LED 50W이하 보안등 127등 설치

☐ 추진실적

- 보안등 철거/설치 : NH 100W 20등 / LED 50W 20등
- 공 정 율 : 15%

☐ 향후계획

- LED 50W보안등 지속 설치
- 2014. 10. 28 공사 준공

☐ 기대효과

- 빛 공해 방지 LED보안등기구 설치로 주민 삶의 질 향상에 기여
- 친환경 에너지절약 가로등기구 교체로 에너지절약을 통한 예산절감

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
142,000 (국비 30,000, 시비 32,000, 구비 80,000)	0	0%

15년 이상 된 노후 가로등시설물에 대한 개량을 실시하여 전기안전사고 예방 및 야간 교통 환경 개선

☐ 사업개요

- 위 치 : 경인로(영등포로타리 ~ 도림교)
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : 2014. 5. 26 ~ 11. 27
- 규 모
 - 개량 전 : 차도등 MH350W 138등, 보행등 70W 122등
 - 개량 후 : 차도등 LED등 155등(LED80W 104등, LED120W 51등)
보행등 LED50W 130등

☐ 추진실적

- 가로등기구 철거/설치 : MH350W 43등/ LED120W 43등
- 공정율 : 40%

☐ 향후계획

- 경인로 가로등시설물 개량공사 지속 추진
- 2014. 11. 27 공사 준공

☐ 기대효과

- 노후 가로등시설물 개량으로 전기안전사고 예방
- 친환경 에너지절약 가로등기구 교체로 에너지절약을 통한 예산절감

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
870,000 (시비 870,000)	0	0%
