

제265회 구의회 임시회

2025. 10. 17. ~ 10. 27.

희망 행복 미래도시 영등포

2025년 주요업무 보고



정원도시과

보 고 순 서

I . 일 반 현 황	· · · 1
II . 주요업무 추진실적	· · · 3
III . 2026년 주요업무 추진계획	· · · 12
IV . 2026년 신규·중점 추진사업	· · · 19

I . 일반현황

1 조 직

정원도시과

- (6)개팀

정원정책팀	가로정원팀	공원관리팀	생활정원팀	정원여가팀	수변생태팀
○ 구청장 공약사항 및 시책 역점사업 총괄 ○ 민간투자 유치에 관한 사항, 타기관 협력사업 추진 ○ 민간 재개발, 재건축 관련 공원 녹지분야 협의 총괄 ○ 장기미집행 도시공원 관리 ○ 지역거점공원 명소화사업 추진 ○ 국·공유재산관리 총괄 ○ 기간제 근로자 인력 채용 총괄 ○ 공원 안전점검 및 재난, 재해 관련 업무 총괄	○ 가로수 기본계획 수립 및 식재·유지관리 ○ 가로녹지대 조성·유지관리 ○ 수림대·시설녹지 조성 및 유지관리 ○ 가로변 꽃길조성 및 화분관리 ○ 가로정원 조성 및 관리(빛물, 천수 공간 등) ○ 도시구조물 벽면 녹화 ○ 공유재산관리(녹지) ○ 건축물 허가·승인 관련 조경분야 협의	○ 부서 중대재해 관련 업무 총괄 ○ 근린공원 조성 및 관리 ○ 수경시설 조성·관리 총괄(공원내 수경시설 관리) ○ 영등포 문래공원 주차장 사용수익 허가, 꽃살장운영 ○ 공유재산관리(근린공원) 및 공원점·사용허가 ○ 건강 맨발길(황톳길 등) 조성 및 관리 총괄 ○ 근린공원 및 꽃밭정원 황톳길 유지관리 ○ 공원내 야외체육 시설 설치 및 관리 총괄	○ 어린이공원조성·유지관리 ○ 소공원, 주제공원, 마을마당, 공공공지(문래동 꽃밭 정원 등) 관리 ○ 부서 전기시설 유지관리 총괄 ○ 옥상녹화 및 아파트열린녹지 조성 ○ 생활권 테마정원(스쿨가든, 실버가든, 키즈가든) 조성 ○ 생활밀착형 정원 조성(빈집활용, 골목길 정원) ○ 공유재산관리 및 공원 점·사용허가 ○ 지정보호수(노거수) 유지관리	○ 정원여가·문화 프로그램기획 및 운영 ○ 정원문화센터 운영 관리 ○ 마을정원사 관련 프로그램 전문화 및 양성 ○ 정원축제 개최, 계절별 정원행사 추진 ○ 도시텃밭 운영 및 관리(농정에 관한 사항) ○ 유아숲체험장 운영(영등포공원) ○ 반려식물 클리닉 및 운영활성화에 관한 사항	○ 자연환경·하천 생태복원 및 녹화사업 및 관리 ○ 야생동·식물수출 입허가 및 구조사업 ○ 안양천 철새보호 구역 지정 및 관리 ○ 수목 병·해충방제 총괄 ○ 안양천·도림천 특화사업 및 녹지관리 ○ 유수지 공원화 및 녹지관리에 관한 사항 ○ 안양천, 도림천 수변정원 조성 및 조경시설 관리 ○ 수변생태 프로그램 운영(안양천)

2 인 력

구 분	계	일 반 직						관리운영직				별정직·임기제			
		4급	5급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급	6급	7급	8급	9급
정 원	29	-	1	7	10	6	5	-	-	-	-	-	-	-	-
현 원	30	-	1	8	11	6	4	-	-	-	-	-	-	-	-
과부족	1	-	-	1	1	-	△1	-	-	-	-	-	-	-	-

3

주요시설 및 장비

구 분	명 칭	현 황	비 고
시 설	근린공원	11개소 522,227.2 ^{m²} (영등포구 관리 9개소 182,281.2 ^{m²} , 서울시 직영관리 2개소 339,946 ^{m²})	공원관리팀
	어린이공원	21개소 61,084.3 ^{m²}	생활정원팀
	소공원	19개소 27,981.1 ^{m²}	생활정원팀
	주제공원(역사공원)	1개소 2,962.8 ^{m²}	생활정원팀
	마을마당	29개소 17,566.1 ^{m²}	생활정원팀
	공공공지, 차없는 거리	10개소 23,908.7 ^{m²}	생활정원팀, 공원관리팀
	녹지대	427개소 825,959 ^{m²}	가로정원팀
	가로수	124개 노선 25종 18,144주	가로정원팀
	보호수	은행나무 1종 1주	생활정원팀
	체육시설	98개소 31종 1,001점	공원관리팀
장 비	중형승용차	쏘울EV 65로0530(2016)	공사현장 점검 및 순찰
	승합차	스타렉스 70루8982(2018)	공원분야 복합민원처리
	소형화물차	포터2(1t) 96저0103(2020)	공원 관리
	화물차	마이티(2.5t) 87루7056(2017)	가로수 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5244(2018)	녹지대 관리
	소형화물차	포터2(1t) 80모7630(2005)	뿌리윤기
	소형화물차	포터2(1t) 96저0106(2020)	녹지분야 복합민원처리
	승합차	스타렉스 70루8935(2018)	녹지대 관리
	소형특수	노바스스카이고소작업차 82소3550(2019)	가로수 전지 등 관리
	소형화물차	포터2(1t) 86우4171(2011)	안양천 관리
	화물차	마이티(2.5t) 84두5224(2018)	띠녹지 관리
	화물차	한성2톤 방역방제차 94저6897(2021)	병해충 방제
	소형화물차	포터2(1t) 982모 8508(2019)	정원 프로그램 운영

4

예산현황

(단위: 천원)

단위사업명	예산액	집행액	집행률(%) (9.30.기준)
계	23,162,630	15,270,571	65.9
공원관리 수준향상	10,309,286	6,345,410	61.5
정원 여가 문화사업	591,730	447,496	75.6
공원조성 수준향상	2,164,528	1,362,072	62.9
가로녹지 수준향상	6,794,440	4,897,843	72
자연생태 수준향상	1,290,642	881,027	68.2
안양·도림천 특화	1,243,214	841,461	67.6
쾌적한 녹색 힐링파크 만들기	293,323	179,718	61.26
도시농업 활성화	331,311	196,544	59.3
기본경비	144,156	119,000	82.5

Ⅱ . 주요업무 추진실적

연번	사 업 명	쪽
①	공원 편익시설 개선 및 수준향상	4
②	건강맨발길 조성사업	5
③	사계절 맞춤형 가로수 관리	6
④	쾌적한 가로환경 조성을 위한 가로정원 확충	7
⑤	주민이 함께 가꾸고 누리는 생활밀착형 정원 조성	8
⑥	수변도시 영등포 ‘수변감성 생태정원’ 조성	9
⑦	치유와 힐링의 ‘정원여가 문화’ 확산	10
⑧	도시농업 활성화	11

노후, 훼손된 공원시설 정비 및 확충을 통하여 주민들에게 안전하고 쾌적한 공원 환경을 제공함으로써 이용자 만족도 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 문래근린공원 등 도시 공원 50개소, 마을마당 29개소, 공공공지 및 차없는 거리 등 10개소
- 사업내용
 - 공원 내 노후 시설물 정비 및 교체
 - 공원 내 체육시설, 화장실 등 편익시설 정비 및 수목 관리

□ 주요 추진실적

- 도심 속 거점공원 명소화 추진
 - (자매공원) 물길정원과 연계한 특색있는 정원 조성 완료('25.8월)
 - (신길공원) 테마정원 조성 및 노후시설 1차구간 정비 완료('25.9월)
 - (영등포공원) 매력가든 조성 및 유아숲놀이터 숲놀이 공간 정비 완료('25.9월)
- 노후 공원 리모델링 통해 쾌적한 공원환경 조성
 - 양남어린이공원 및 선유봉마을마당 리모델링 정비 완료('25.5월)
- 공원 편익시설 정비 및 수목 관리
 - 다사랑어린이공원 시설물 정비 및 신우어린이공원 물놀이장 바닥 정비
 - 소나무 생육환경 개선(수관숙기 66주 등), 위험수목 제거 및 가지치기 46주

□ 향후계획

- 새말소공원 및 동산마을마당 정비 추진: 10월~11월
- 공원 전기시설물 유지관리 및 체육시설 수시 정비: 1월~12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
3,297,234 (국 464,659, 시 1,934,075, 구비 898,500)	2,842,076 (국 459,957, 시 1,851,776, 구비 530,343)	86.1

관내 공원 및 녹지대 내 유휴공간을 활용하여 황토, 게르마늄 등 지역에 맞는 다양한 소재와 형태를 도입하여 지역주민들이 어디서나 접근 가능한 건강맨발길 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 10월
- 사업규모: 신길근린공원 등 14개소
- 사업내용
 - 맨발길 조성 및 부대시설(세족장, 신발장 등) 설치, 맨발길 주변 수목 식재 등

□ 주요 추진실적

- 맨발길 조성(조성완료 5개소, 조성중 9개소)

구분	행정동	설치위치	주소	조성규모	조성현황	추진사항
	합계	총14개소		690m		
1	영등포동	영일어린이공원	영등포동 647-3	30m	황토	조성중
2	영등포동	역사공원	영등포동7가 155-30	70m	게르마늄	조성중
3	도림동	쌍용플래티넘 녹지대	도림동 277-2	65m	황토, 게르마늄	조성중
4	도림동	대방천 녹지대	도림동 263	50m	황토	조성완료
5	도림동	도림 16녹지	도림동 821-2	40m	황토	조성완료
6	신길1동	메나골근린공원	신길동 4934-4	80m	황토, 황토볼	조성완료
7	신길3동	신길바라기공원	신길동 374-2	45m	황토	조성중
8	신길4동	어울숲공원	신길동 243-58	50m	게르마늄	조성완료
9	신길5동	오순도순 소공원	신길동 4964-6	40m	게르마늄	조성중
10	신길5동	신길근린공원	신길동 341-3	100m	황토, 마사토	조성완료
11	신길7동	화담소공원	신길동 4950-1	30m	게르마늄	조성중
12	대림1동	조롱박어린이공원	대림동 870	40m	황토	조성중
13	대림3동	동십어린이공원	대림동 742	30m	게르마늄	조성중
14	대림3동	원지어린이공원	대림동 690	50m	게르마늄	조성중

□ 향후계획

- 건강과 힐링이 함께하는 맨발길 조성 공사 추진: 6월~10월
- 공사완료(10월) 및 유지관리 실시: 10월~12월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,625,000 (구비 1,625,000)	1,366,210 (구비 1,366,210)	84

관내 가로수에 계절별 적기의 가로수 가지치기를 통하여 고유수형 회복 및 생육상태를 개선하고, 불량목 및 고사목 등 위험가로수 정비를 통해 안전하고 쾌적한 가로환경 조성

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 가로수 (당산로 등 124개 노선, 18,144주)
- 사업내용: 가로수 가지치기 및 생육환경 개선, 가로수 바꿔 심기, 가로수 보식 및 보호시설 정비

□ 주요 추진실적

- 계절별 적기의 가로수 가지치기로 고유수형 조절 및 가로수 생육환경 개선
 - 영등포로, 노들로 등 약 3,553주 겨울철, 배전선로 근접 가로수 가지치기
 - 여의동·서로 가로수 토양관주 1,091주, 외과수술 48주
 - 대방천로 등 태풍 및 호우피해 대비 약 300주 가로수 가지치기
- 통학로 인근 및 한강버스 선착장 주변 가로수 아래 한뼘정원 조성
 - 당산로44길, 여의나루역 주변 가로수 55주 아래 정원 조성
- 은행나무 암나무 바꿔심기: 7월~ 9월
 - 여의공원로 은행나무 가로수 암→수 교체 약 89주

□ 향후계획

- 위험수목 정비: 10월~11월
 - 선유로44길 등 대형목 진단용역에 따른 위험 가로수 70주 정비
 - 생활 주변 위험수목 66주 정비
- 가로수 공분에 보식 및 보호시설 정비: 10월
 - 경인로 등 5개 노선 가로수 보식 및 보호판 약 300조 정비

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,678,300 (시 144,000, 구 992,000, 기타 542,300)	1,560,896 (시 142,510, 구 876,086, 기타 542,300)	93

기존 형식적인 녹지관리 방향에서 벗어나 영등포구만의 고유한 디자인과 컨셉을 마련하고, 영등포구만의 ‘길고싶은 숲길’ 가로정원을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 위 치: 관내 녹지대 및 떠녹지
- 사업내용
 - 가로변·도로변 녹지량 확충, 공유한뼀정원, 사계절 꽃길 정원, 그린아트길 조성, 여의도 봄꽃 축제장 정비사업, 녹지대 및 떠녹지 정비사업

□ 주요 추진실적

- 특색있는 계절 꽃모와 다년생 수종을 함께 배치한 화단 및 결이화분 설치
 - 특색있는 계절 꽃모와 다년생 수종을 함께 배치한 화단 및 결이화분 설치(2,000개)
- 여의도 봄꽃축제장 주변 고사된 왕벚나무 교체 및 휴게시설물 추가 설치
 - 고사된 왕벚나무 교체(50주) 및 휴게시설(전망데크) 설치 등
- 생활권 주변 쾌적한 가로환경 제공을 위한 시설녹지 가로정원 조성
 - 녹지대 정비(4개소) 관목 1,340주, 초화 7,945본 식재 등
- 가로변 녹지대 정비 및 확충으로 도시미관 개선 및 주민 휴식공간 조성
 - 도로변 녹지량 확충(3개소) 관목 2,119주, 초화 3,726본 식재 등

□ 향후계획

- ‘길고 싶은 숲길’ 가로정원 조성: 10월~12월
 - 가로변 녹지량 확충(3개소), 공유한뼀정원 조성, 그린아트길 조성(2개소), 녹지대 및 떠녹지 정비사업(3개소)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
4,807,000 (국 300,000, 시 2,513,000, 구비 1,994,000)	2,425,686 (국 20,900, 시 1,326,632, 구비 1,078,154)	50.5

5 주민이 함께 가꾸고 누리는 생활밀착형 정원 조성 생활정원팀

관내 자투리땅 등 주민생활 곳곳 유휴부지에 다양한 연령·세대가 소통할 수 있는 테마정원을 조성하여 다채로운 경관을 창출하고 일상 속 정원문화 확산

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 위 치: 생활 주변 자투리땅 등
- 사업내용: 주민과 함께하는 생활밀착형 정원조성
 - 우리동네 동행정원, 사회적약자 동행가든, 자녀안심 그린숲, 어르신 놀이터 조성
 - 생활 주변 건축물 벽면녹화 및 옥상녹화

□ 주요 추진실적

- 주민이 제안하고 조성하는 우리동네 동행정원 조성
 - 도림동 성당 공개공지 등 19개소, 교목·관목 등 9,506주 식재
- 생활주변 건축물 벽면녹화 및 옥상녹화 조성
 - 일자리지원센터 벽면녹화, 청사 별관 옥상녹화
- 사회적약자동행가든 조성사업(추진중)
 - 방치된 골목길 내 녹지대 정원조성, 노후시설물 교체(신길제5제1경로당 옆)

□ 향후계획

- 어르신 놀이터 조성사업 추진: 10월~11월
- 자녀안심 그린 숲 조성사업 추진: 10월~11월
 - 어린이보호구역 내 보도와 차도를 분리하는 그린숲 조성사업

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,133,000 (국 374,000, 시 224,000, 구비 535,000)	775,818 (국 292,460, 시 152,351, 구비 331,007)	68.5

도심 내 산책과 운동, 쉼이 있는 수변 휴식공간을 조성하고, 훼손된 하천경관의 생태적 복원을 통하여 주민들의 지친 일상을 치유할 수 있는 수변공원을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월~12월
- 사업위치: 안양·도림천 둔치내 녹지대, 제방산책로
- 사업규모: 총 8.9km (안양천 4.8km, 도림천 4.1km)
- 사업내용: 하천생태 복원, 안전한 산책로 조성, 우수지 생태공원 정비 등

□ 주요 추진실적

- 안양천 생태복원 및 녹화사업 추진(11월 준공 예정)
 - 농구장 근처 둔치, 제방사면 등(신정교~오목교 구간 2,000m²)
- 서울둘레길 정비사업(완료)
 - 목동교~양평1보도육교 중간산책로 포장 정비, 편의시설 정비, 정원 조성 등
- 안양천 황톳길 주변 안전울타리 조성사업(완료)
 - 목동교~양평교 일대 안전펜스 설치 161m, 사철나무 등 2,540주 식재 등
- 안양천 황톳길 환경개선 사업(완료)
 - 황토볼장 안전난간 설치 및 수도시설 연장 설치 등
- 양평유수지생태공원 정비사업 추진(완료)
 - 노후데크정비, 스마트쉼터 1개소, 그레이팅산책로 설치 및 수목 초화류 식재
- 안양천 왕벚나무 수세회복 사업(완료)
 - 산책로(신정교~목동교) 왕벚나무 외과수술, 수관정비, 영양공급 등 생육환경 개선

□ 향후계획

- 안양천 생태복원 및 녹화사업 공사 시행: 10월~11월

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
1,085,000 (시 500,000, 구비 585,000)	950,160 (시 389,887, 구비 560,273)	87.5

도심 속 꽃과 식물을 가꾸는 정원관리에 대한 주민 관심 증가에 따라 다양한 가드닝 프로그램 운영으로 정원에 대한 주민참여 기회를 제공하고 영등포 정원축제를 개최하여 다양한 볼거리 제공을 통해 정원문화 확산에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 위 치: 관내 공원, 정원문화센터 등
- 사업내용
 - 정원문화센터 운영(마을정원사 양성, 반려식물클리닉, 원데이 클래스 등)
 - 제2회 2025 영등포 정원축제(소풍) 개최
 - 달려라 정원버스 운영, 반려식물 보급 등

□ 주요 추진실적

- 영등포 정원문화센터(3개소) 운영('25.3.~12)
 - 정원문화센터 대림점(3호점) 개원
 - 영등포 마을정원사 양성과정 확대 운영(상반기 58명, 하반기 52명)
 - 정원여가 프로그램(85회, 869명) 및 반려식물 클리닉(201건) 운영 * 8.30.기준
- 달려라 정원버스
 - 식물 체험프로그램 및 정원버스 운영(25. 6. ~ 9)
 - 어린이집, 학교 및 경로당 등 정원문화 취약시설 방문(26회, 2,000명)
- 제2회 '2025 영등포 정원축제(정원소풍)' 개최
 - 개최장소: 영등포공원(5.23~5.25, 3일간)
 - 구민사랑콘서트(문화체육과) 협업을 통한 정원 속 문화행사 추진
 - 시민·기업참여 팝업가든 조성, 꽃과 정원을 이용한 다양한 체험프로그램 제공
- 도심 속 공원 팝업 물놀이장 행사 개최
 - 개최장소: 신길공원(8.15~8.17, 3일간)
 - 에어바운스 물놀이시설 및 유아·어린이 물놀이장, 그늘막 등 편의시설 등 제공

□ 향후계획

- 문래동 꽃밭정원 정원토크&그린시네마 행사 개최(10.18.(토) ~ 19.(일), 3일간)

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
591,730 (시 30,000, 구비 561,730)	447,496 (시 14,897, 구비 432,599)	75.6

도시텃밭 및 어린이 텃밭 운영으로 친환경 도시농업 참여 기회를 제공하고, 상자텃밭을 통해 가정에서 농작물을 재배해 먹고 먹을 수 있는 먹거리 제공 및 정서함양에 기여

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 구민
- 주요 추진내용
 - 문래동 공공공지 도시텃밭 운영 및 상자텃밭 보급
 - 어린이텃밭 조성 및 어린이 생태프로그램 운영

□ 주요 추진실적

- 문래동 공공공지 도시텃밭 운영
 - 위 치: 문래동3가 55-6 [면적: 5,400 m^2 , 실면적: 3,380 m^2]
 - 운영기간: 2025. 4. 1. ~ 11. 30. [약 8개월]
 - 분양결과: 340가구 [1가구당 6 m^2 내외], 2025년 신청: 2,565가구 [전산추첨]
- 상자텃밭 보급
 - 보급수량: 440가구 [1세트 구성: 상자(66*53*31cm), 50L상토, 모종, 씨앗]
 - 부 담 금: 총 비용(상자텃밭세트 43,000원)의 20% 수익자 부담
- 어린이텃밭 조성
 - 추진기간: 6월 ~ 7월
 - 조성대상: 관내 어린이집 15개소

□ 향후계획

- 어린이 생태프로그램 및 어린이텃밭 관리 사업 운영
 - 추진기간: 6월 ~ 10월
 - 대 상: 25년 조성예정 15개소 및 24년 기 조성한 어린이집 15개소
- 도심형 스마트팜 교육장 설치·운영
 - 추진기간: 10월 ~ 12월
 - 장 소: 선유로53길 20-7, 3층

□ 예산현황

(단위: 천원)

예 산 액	집 행 액	집행률(%)
331,311 (시 203,358, 구비 127,953)	196,544 (시 83,002, 구비 113,542)	59.3

Ⅲ . 2026년 주요업무 추진계획

연번	사 업 명	쪽
----	-------	---

①

쾌적하고 안전한 공원 환경 조성

13

②

주민친화형 생활권 공원 관리

14

③

기후위기 대응 도심 속 가로숲 조성 및 관리

15

④

수변감성 힐링공간 조성

16

⑤

자연과 문화가 함께하는 녹색 힐링 프로그램

17

⑥

국회대로 상부 공원화 사업

18

공원 내 야외운동기구, 휴게시설 및 편익시설 정비로 쾌적한 공원 환경을 조성하고, 고사되거나 가지치기가 필요한 수목에 대한 사전 정비로 우기 및 태풍시 안전사고를 예방하여 보다 안전한 공원환경 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 근린공원, 차없는거리 등
- 사업내용
 - 야외체육시설, 공원화장실, 수경시설 유지관리
 - 휴게의자, 바닥포장, 화단 등 근린공원 노후시설 정비
 - 고사목, 주택 인접 위험 수목, 생육 부진 소나무 등 공원수목 관리

□ 세부 추진계획

- 주민건강 및 여가 활동을 위한 공원 내 시설물 관리
 - 수경시설 노후 배관 등 교체 및 수경 유지관리
 - 노후된 야외체육시설 교체 및 공원 내 공중화장실 수도시설 등 정비
- 이용환경 개선을 위한 근린공원 노후시설 정비
 - 문래근린공원 게이트볼장 파고라 등 노후시설 교체
 - 메나골근린공원 노후배수로 및 산책로 정비, 수목·초화 등 식재 등 추진
- 안전하고 주민 불편 없는 공원 수목 관리
 - 공원 내 위험수목 정비 및 수목 식재
 - 공원 소나무 생육환경 개선사업(수관축기, 수간주사, 토양개량 등)

□ 추진일정

- 현장조사, 실시설계용역, 가지치기 공사 시행: 1월~3월
- 공사 시행 및 준공: 4월~12월

□ 소요예산: 총700,000천원(구비 700,000)

생활권 내 공원 및 녹지를 주민친화적으로 정비·재조성하여 일상 속 활력과 매력을 더하는 특색있는 생활정원 공간을 확충하고 쾌적한 이용환경을 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업대상: 관내 어린이공원, 소공원, 마을마당, 공공공지, 유희부지 등
- 사업내용
 - 공원 내 어린이놀이기구, 휴게시설, 바닥포장 등 시설정비 및 수목관리
 - 공원등 LED 조명 교체, 공원 전기 시설물 유지관리
 - 우리동네동행정원, 그린폴골목정원 조성 등 생활밀착형 정원 조성

□ 세부 추진계획

- 이용 만족도 및 환경 개선을 위한 어린이공원 및 소공원 정비 사업
 - 다사랑어린이공원, 중앙어린이공원, 화담소공원 노후 시설 정비 및 수목 식재 추진
 - 강마을어린이공원 물놀이장 조성 추진
- 친환경적이고 안전한 공원등 및 전기사설 유지관리
 - 공원등 1,261등, 공원등주 933본 등 전기사설물 유지관리
 - 공원등 LED 조명·분전반 교체 및 조도 개선
- 주민 커뮤니티 활성화를 위한 마을마당 공간 개선
 - 노후 마을마당 정비를 통한 도심 속 소규모 정원쉼터 조성
- 일상생활 속에서 쉽게 접하고 즐기는 생활밀착형 정원 조성
 - 아파트, 교회(성당), 유치원 등의 다양한 공간에 주민공모를 통한 동행정원 20개소 조성
 - 문래창작촌 내 그린폴 골목정원 '24년 조성구간(150m)과 연계하여 인근 골목으로의 확장 조성을 통해 문화·예술·자연이 흐르는 보행 특화정원 조성

□ 추진일정

- 현장조사, 실시설계용역, 가지치기 공사 시행: 1월~3월
- 공사 시행 및 준공: 4월~11월

□ 소요예산: 총2,125,400천원(시 100, 구비 2,125,300)

기후위기에 대응하여 가로수 보식·가지치기 등 탄소흡수원 조성·관리를 확대하고, 빗물저류형 떠눅지 및 사계절 꽃길 정원 조성 등 가로변 그린인프라 조성을 통한 도시 녹지축 연결 및 아름다운 도시경관 창출

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 사업규모: 관내 가로수 7,000주, 떠눅지 11,912 m^2 , 화단 12개소 정비
- 사업내용: 가로수 정비를 통한 도심 내 탄소저감, 가로변 그린인프라 조성 및 꽃 화단 조성을 통한 도시경관 향상

□ 세부 추진계획

- 가로수 정비를 통한 가로경관 품격 향상 및 도심 내 탄소 저감
 - 가로수 정비(가지치기, 위험수목 제거 등) 및 보식으로 안전한 보행로 조성과 도심 내 탄소 저감 기여
 - 관내 90개 노선 가로수 가지치기·보식·바꿔심기·보호시설 정비 등 약 6,400주, 위험가로수 제거 등 약 600주 정비
- 기후위기 대응 가로변 그린인프라 조성
 - 통학로 안전 확보와 빗물순환을 위한 떠눅지 조성 등 기후위기 대응형 도시 녹지축 연결 추진
 - 양평로, 대림동 707-40, 여의나루로2길 14(윤중초 인근), 도림천로, 양평가로눅지, 영등포로, 당산로
- 사계절 꽃길 정원 조성
 - 구청사 화단 및 관내 주요노선에 계절감을 느낄 수 있는 초화 식재
 - 주요화단 5개소(구청사 등), 주요노선 7개소(영중로 등), 유희공간 등

□ 추진일정

- 가로수 가지치기 및 보식 등 정비: 1월~10월
- 도로 주변 녹지대 및 떠눅지 조성: 2월~10월
- 사계절 꽃길 화단 조성: 2월~10월

□ 소요예산: 총 3,797,000천원(국 450,000, 시 1,555,000, 구비 1,792,000)

기존 산책로 중심 수변공간을 감성과 힐링 중심의 휴식 문화 공간으로 전환하고, 수변 식생환경 개선 등을 통해 하천 생태계 회복 및 매력정원을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 11월
- 사업위치: 안양·도림천, 양평유수지생태공원
- 사업규모: 안양천(1,200 m^2), 도림천(1,100 m^2), 양평유수지(3,800 m^2)
- 사업내용
 - 양평유수지생태공원 산책로(목재데크) 정비, 퍼걸러 등 노후시설물 정비
 - 사계절 꽃밭 조성 및 야간 경관조명 개선, 포토존 등 주민 체류형 공간 조성
 - 도림천 진입로 개선, 수변 힐링공간 및 편의시설물 확충
 - 안양·도림천 생태 복원 및 매력가든 조성

□ 세부 추진계획

- 양평유수지생태공원 노후 데크 정비 및 사계절 꽃밭 조성
 - 양평유수지생태공원 정비사업 추진
 - 사계절 꽃밭조성, 데크로드 정비, 경관조명 설치 등
- 안양·도림천 식생환경 개선 및 매력정원 조성
 - 안양·도림천 생태복원 및 녹화사업 추진
 - 오목교 장미원 및 양평교 주변(1,200 m^2) 매력정원 조성 및 사면녹화
 - 도림천교~신도림역 구간(1,100 m^2) 진입로 정비 및 휴게시설 확충

□ 추진일정

- 실시설계용역, 주민의견 수렴, 서울시 심의 등: 1월~4월
- 공사 시행: 5월~11월

□ 소요예산: 총2,000,000천원(국 200,000, 시 1,500,000, 구비 300,000)

주민들의 휴식과 치유에 대한 관심이 증가함에 따라 자연과 문화를 함께 체험할 수 있는 다양한 축제 및 정원 프로그램으로 이용대상 및 공간확대로 특색있는 기회 제공

□ 사업개요

- 사업기간: 1월~12월
- 대 상 지: 관내
- 사업내용
 - 2026 영등포 정원축제(정원소품)
 - 계절별 정원 행사(물놀이장, 정원토크콘서트&그린시네마)
 - 유아숲 가족축제, 도심형 생태체험 프로그램 운영
 - 문래동 공공공지 도시텃밭 운영 및 어린이 텃밭 조성, 반려식물 보급

□ 세부 추진계획

- 정원문화센터 운영 확대 ※ 정원문화센터 현황(4개소): 영등포점, 문래점, 대림점, 양평점
 - 1개소 추가 설치하여(양평점, '25.10월 준공) 정원여가문화 확산
- 2026 영등포 정원축제 봄·가을철 확대 운영
 - (기존) 5월 영등포공원 → (변경) 5월 신길공원, 9월 영등포공원
 - 정원전시(참여단체 20여개), 공원시장(플리마켓, 식물시장 등), 주민축제(거리예술제 등)
- 계절별 정원 행사
 - 여름철 물놀이장 및 가을철 그린시네마 개최로 계절에 따른 특색있는 프로그램 기획
- 영등포공원 유아숲 가족축제 운영
 - 아이들이 친구·가족과 함께 뛰어놀며 즐거운 추억을 만들 수 있는 놀이마당 제공
- 도심에서 즐기는 생태체험 프로그램 운영
 - 도심형 생태프로그램 특화를 통해 도시민들에게 차별화된 생태계서비스 제공
- 도시농업활성화 및 반려식물 보급
 - 문래동 공공공지 도시텃밭 운영 및 어린이 텃밭 조성, 반려식물 보급

□ 추진일정

- 추진계획 수립: 2월
- 체험프로그램 및 행사 운영: 3월~12월

□ 소요예산: 총795,340천원(시 30,000, 구비 765,340)


자동차 중심에서 사람 중심의 교통패러다임을 변화시켜 국회대로 도로 다이어트를 통한 가로정원 조성

□ 사업개요

- 위 치: 국회대로(영등포구간: 목동교~국회의사당 앞 교차로)
- 사업기간: 2022년 12월 ~ 2026년 6월
- 사업규모: 연장 2.66km
- 사업내용: 북측 도로 2개 차로 축소 후 인도 확장 및 가로정원 조성

□ 세부 추진계획

- 2구간: 목동교~경인고속입구 교차로
 - 왕벚나무 가로수 식재, 정원형가로조성, 보도교체(차로 축소 없음)
- 남측(3,4구간) 북측(5,6구간): 경인고속입구 교차로~ 영동초등학교 교차로
 - 북측 2개 차로 축소 및 보도확장 후 확보된 공간에 녹지 조성
 - 은행나무 가로수 → 왕벚나무 가로수 교체 식재(주민요구반영)
 - 남측 관공서(구청, 경찰서) 주변 담장개방 녹화 및 떠녹지 조성, 앓음벽 설치
 - 산책로(폭1.5m) 조성, 실개천(270m)조성, 왕벚나무 가로수 식재
- 7구간: 영동초등학교 교차로 ~ 국회의사당 앞 교차로
 - 왕벚나무 가로수 식재, 정원형가로조성, 보도교체(차로 축소 없음)

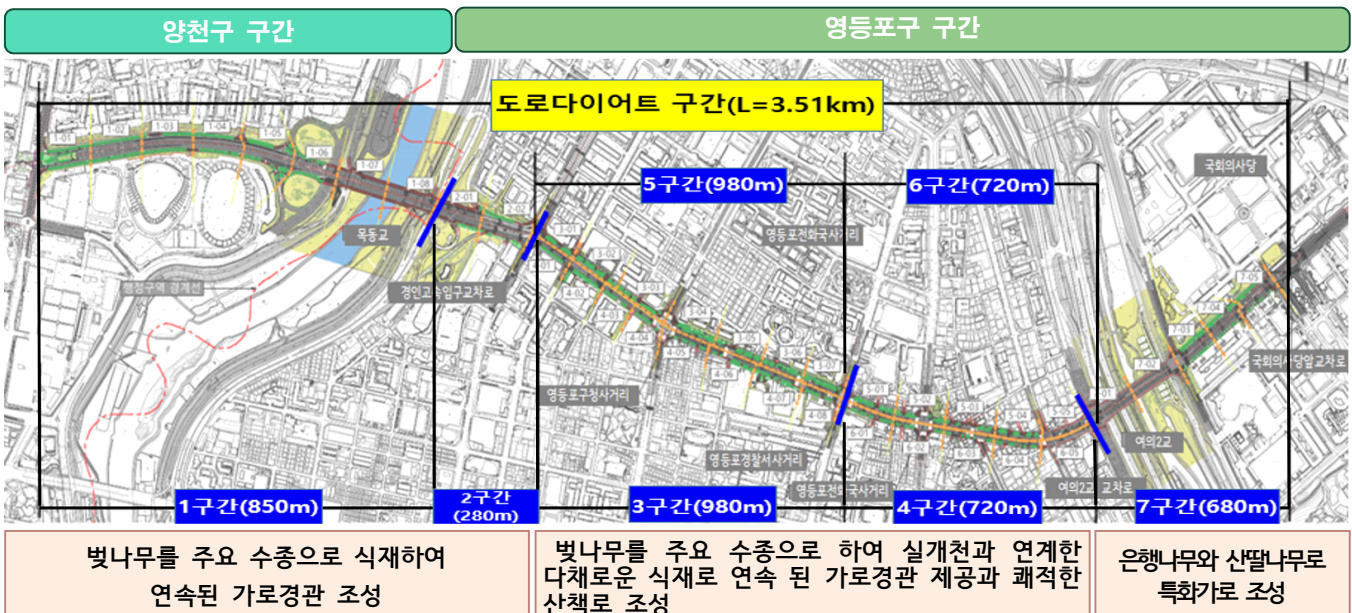

□ 추진일정

- 남측(3,4)구간, 북측(5,6)구간 공사: 1월~6월

□ 소요예산: 총6,700,000천원(시비 6,700,000)

IV. 2026년 신규 · 중점 추진사업

1 도심 속 거점공원 명소화

정원정책팀
공원관리팀

거점별 주요공원에 공원별 특징점을 반영한 특색있는 공간을 재조성하여 일상 속 재미와 즐거움을 선사하는 여가 공간을 확충하고 보다 안전하고 매력적인 공원으로 명소화 추진

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 대 상 지: 영등포공원, 문래공원, 신길공원, 어울숲공원
- 소요예산: 6,300,000천원(시 2,400, 구비 3,900)
- 사업내용: 공원 내 노후시설 재정비 및 테마정원 조성 등

□ 세부 추진계획

- 영등포공원 남측(2,800㎡) 리모델링 및 풋살장 조명 개선
 - 풋살장 조명개선 등 노후시설 정비 및 이용률이 낮은 공간에 쉼 정원 조성
- 문래공원 남측(11,000㎡) 리노베이션 사업
 - 공원 북측구간('25년 완료)과 연계하여 남측구간 리노베이션 사업 추진
- 신길공원 노후시설 정비 및 안전한 공원환경 개선
 - 1차 구간('25년 완료)과 연계하여 공원 내 노후 바닥포장 및 운동기구 정비를 통해 안전한 공원 환경 조성
- 어울숲공원 리뉴얼을 통한 다채로운 공간 조성
 - 사회공헌사업을 통해 공원 내 '숲도서관' 조성 및 공원 리뉴얼로 공간 재구성

□ 추진일정

- 추진계획 수립: 1월
- 실시설계용역 및 계약심사 등: 2월~4월
- 공사시행 및 준공: 5월~12월

□ 소요예산: 총6,300,000천원(시 2,400,000, 구비 3,900,000)

도로 보도녹지를 통합한 숲속 산책로형 가로정원 조성으로 시민들의 건강 증진 및 여가 활용 확대

□ 추진방향


- 고밀도 주거지역과 인접해 있어 주민들의 의견을 최대한 반영
- 기존 노후 떠죽지와 협소한 산책로를 정비하되 이용자의 불편을 최소화하기 위해 공사 구역 분할 및 단계별 진행

□ 사업개요

- 사업기간: 1월 ~ 12월
- 위 치: 대방천 가로녹지(신도림고가차도 앞~성락빌딩 앞 교차로, 신우어린이공원방면)
- 사업비: 15억원(시비)
- 규모: 4,000 m^2
- 조성내용: 가로·녹지·보도를 통합한 산책로 조성

□ 세부 추진계획

- 보도·녹지를 통합한 숲속산책로 조성
 - 기존 노후 떠죽지와 협소한 산책로를 정비하여 숲속을 걷는 듯한 산책로형 가로정원 조성
 - 산책로(1.7→2.5m), 녹지대(1.5→2.5m) 확장을 통한 보행 및 녹지경관 개선
 - ('25) 287m , ('26) 313m, ('27) 590m 순차적 조성 확대

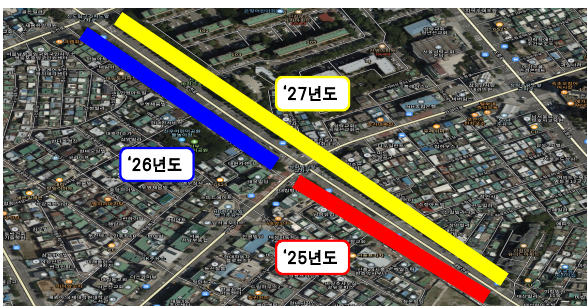

연차별 사업 구간



조성(안)

□ 추진일정

- 실시설계용역, 주민의견 수렴, 서울시 심의 등: 1월~4월
- 공사 시행: 5월~11월

□ 소요예산: 총1,500,000천원(시비 1,500,000)
