

제183회 구의회 제1차 정례회

국 보고자료

청렴 영등포

2014년 주요업무 보고



안 전 건 설 국

보고 순서

1. 일반 현황

2. 주요업무 추진실적

3. 중점사업 추진실적

I 일반 현황



1 조 직

안 전 건 설 국

- (6)개과 (26)개팀

건설관리과	도 로 과	안전치수과	교통행정과	자동차관리과	주차문화과
가 로 행 정 팀	도 로 계 획 팀	하 수 팀	교 통 행 정 팀	자동차등록1팀	주 차 행 정 팀
가 로 경 관 팀	도 로 개 선 팀	치 수 팀	운 수 안 전 팀	자동차등록2팀	주 차 세 입 팀
보 상 팀	보 도 관 리 팀	기 전 팀	건 설 기 계 팀	번호판영치팀	주 차 운 영 팀
광고물디자인팀	도 로 굴 착 팀	재난안전관리팀	교 통 개 선 팀	교통사법경찰팀	
광고물개선팀	도 로 조 명 팀	재난안전시설팀			

2 현 황

구 분	계	일 반 직					
		4급	5급	6 급	7 급	8 급	9급
정 원	189	1	6	40	65	67	10
현 원	182	1	6	42	81	34	18
과 부족	△7	0	0	2	16	△33	8

3

주요시설 현황

건설관리과

○ 가로 시설물 현황

(단위 : 개소)

보도상 영업시설물			광고물 시설물		
소 계	가로 판매대	구두 수선대	소 계	현수막 게시대	시민게시판
153	77	76	70	36	34

도 로 과

○ 도로 현황 : 주요간선도로 (경인로 외 27개 노선)

연장 387.794km		도 로 율
시도 76.0km	구도 311.9km	23.32% (서울시 : 22.32%)

○ 시설물 현황

(단위 : 개소)

구 분 계	교 량	고가차도	지하차도	지하보도	보도육교	입체교차로
50	20	6	12	1	6	5

○ 조명시설

가 로 등	보 안 등
8,576등	9,670등

안전치수과

○ 시설물 현황

구 분	빗물펌프장	간이펌프장	수 문	원격감시시설	하수관거	하 천
시설개요	8 개소	7 개소	21개소 (57문)	26 개소	473,220m	4 개소 (16.94km)

교통행정과

○ 교통시설물현황 (단위 : 개소)

구 분 계	도로안내 표지	보행자안내 표지	도로반사경	자전거보관대	무인자전거시설
845	457	57	205	123 (3,894대)	3 (302대)

○ 건설기계등록 (단위 : 대)

구 분 계	영 업 용	자 가 용	관 용	비 고
17,543	15,846	1,681	16	서울시 전체(45,821대)의 38%

자동차관리과

○ 자동차 등록 현황 (단위 : 대)

구 분 계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
155,560	108,731	6,795	21,999	556	17,479

주차문화과

□ 주차장 현황 (단위 : 개소)

구분	계	노상 주차장				노외 주차장				건축물 부설주차장				
		소 계	거주자 우선주차	공영 (구)	공영 (시)	소 계	공영 (구)	공영 (시)	민영	소 계	그린 파킹	일반 주택	공동 주택	일 반 건축물
개소	11,993	5,636	5,585	41	10	75	29	3	43	6,282	1,785	1,885	958	1,654
면수	161,467	6,906	5,585	933	388	6,772	2,664	1,235	2,873	147,789	2,916	4,418	67,697	72,758

○ CCTV 현황 (단위 : 대)

구 분 계	불법 지정차 단속용	그린파킹 계도용
200	108	92

☐ 부서별 예산 현황

(단위 : 천원)

부 서 명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
계	44,616,856	20,357,562	45.6
건설관리과	641,964	372,867	58.1
도 로 과	6,385,796	4,182,877	65.5
안전치수과	5,869,928	4,478,865	76.3
교통행정과	1,080,431	570,781	53
자동차관리과	392,833	206,189	52
주차문화과	30,245,904	10,545,983	34.8

□ 주요사업 예산 현황

(단위 : 천원)

주요사업	예산액	집행액	집행율(%)
도로·하천 등 재산관리	56,078	24,395	43.5
주민행불편 해소 및 도시미관 조성	356,754	202,280	56.7
도림로 확장공사	4,500,000 (시 4,500,000)	500,000	11.1
신도림역~도림동 연결로 개선공사	253,000 (시 253,000)	56,900	22.5
쾌적한 도로환경 조성 을 위한 도로정비	1,895,000 (시 80,000 구 1,8815,000)	1,604,383	84.7
안전한 도로환경 조성 을 위한 시설물 정비	2,079,800 (국 30,000 시 1,969,800 구 80,000)	715,308	34.4
사각형거 보수·보강 및 개량공사	16,522,000 (시 16,522,000)	14,203,812 (시 14,203,812)	86
하수관거 유지관리	2,428,000 (시 499,000 구 2,428,000)	2,180,490 (시 499,000 구 1,681,490)	90
재난 및 안전관리	64,661	15,261	23.6
교통시설물 설치 및 유지관리	432,973 (시 210,000 구 222,973)	268,244 (시 198, 398 구 69,846)	61.9
교통유발부담금 및 기업체교통수요관리	94,594	43,739	44.6
신속하고 친절한 자동차등록 서비스	38,434	21,189	51.1
저동차손해배상보장법 위반자 처리	14,328	9,383	65.4
공영주차장 건설 적극 추진	11,182,513 (시 3,018,000 구 8,164,513)	268,713 (시 0 구 268,713)	2.4
올바른 주차의식 고취를 위한 주차질서 확립	1,455,953	802,683	55.1

목 차

주요업무 추진실적

1. 도로·하천 등 재산관리(건설관리과)	8
2. 주민행불편 해소 및 도시미관 조성(건설관리과)	9
3. 도림로 확장공사(도로과)	10
4. 신도림역~도림동 연결로 개선공사(도로과) ..	12
5. 쾌적한 도로환경 조성을 위한 도로정비(도로과)	14
6. 안전한 도로환경 조성을 위한 시설물 정비(도로과)	16
7. 사각형거 보수·보강 및 개량공사(안전치수과)	18
8. 하수관거 유지관리(안전치수과)	20
9. 재난 및 안전관리(안전치수과)	21
10. 교통시설물 설치 및 유지관리(교통행정과) ...	22
11. 친환경 녹색교통 사업(교통행정과)	23
12. 신속하고 친절함 자동차등록 서비스(자동차관리과)	26
13. 자동차 손해배상보장법 위반자 처리(자동차관리과)	27
14. 공영주차장 건설 적극 추진(주차문화과)	29
15. 올바른 주차의식 고취를 위한 주차질서 확립(주차문화과)	30

중점사업 추진실적

1. 경인로 에너지절약형 LED간판 교체사업(건설관리과) 31
2. 당산동~샛강생태공원간 연결로 설치공사(도로과) 32
3. 국회 앞 도로 동공발생에 따른 사각형거 개량 추진(안전치수과) 34
4. 양평1유수지 악취저감 저류조 설치 공사(안전치수과) 36
5. 어린이 교통안전체험장 운영(교통행정과) 38
6. 영중로 보행환경개선 기본계획 수립 용역(교통행정과) · 39
7. 경부 제3녹지 지하공영주차장 건설(주차문화과) 40

II 주요업무 추진실적



1 도로·하천 등 재산관리

건설관리과

국·공유 행정재산의 사용자에게 대한 사용료 부과와 무단사용자에게 대해 권리보존 및 변상금을 부과하여 세원 발굴 및 체계적인 재산관리에 만전을 기하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2014.1.1 ~ 12.31
- 방 법 : 국·공유지에 대한 정기 및 수시 실태조사 → 사용료부과/변상금 사전통지 → 징수·체납자 관리
- 징수목표 (단위 : 천원)

계	도로사용료	하천사용료	과 태 료	징수교부금	가로판매대사용료
5,890,376	4,468,389	11,708	66,840	1,303,191	40,248

□ 추진실적

(단위 : 천원)

부 과	징 수	체 납	징수율
1,966건/4,799,913	1,790건/4,744,262	55,651	98.84%

- 도로사용료 부과 : 787건 3,085,050천원(징수 760건3,069,077천원)
- 도로변상금 부과 : 159건 129,932천원(징수 120건 110,939천원)
- 기타 부과 : 1,020건 1,584,931천원(징수 910건 1,564,245천원)

□ 향후계획

- 행정재산 무단점유 변상금 부과 자료조사(10월 ~ 11월)
- 국·공유 무단점용 예상지 실태조사를 통한 신규세원 발굴
- 고액 및 상습체납자에 대한 체계적인 관리로 세외 수입 증대

□ 기대효과

- 행정재산의 체계적이고 효율적인 관리
- 누락 세원 발굴로 재정의 건전성 확보

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
56,078	24,395	43.5

주민생활에 불편을 초래하고 있는 도로상 불법 거리가게 및 노상 적치물과 불법 옥외광고물에 대한 효율적인 정비와 지속적인 관리로 가로환경 수준 향상과 아름다운 도시 미관을 조성하고자 함

□ 사업개요

- 기 간 : 2014. 1. 1 ~ 12. 31
- 대 상 : 거리가게(402개소), 노상적치물, 불법광고물(고정·유동)
- 정비방법 : 자율정비 유도과 지역별 여건 고려하여 단계적으로 추진

□ 추진실적

- 거리가게 및 노상적치물 정비 실적
 - 특별정비 : 58회(마늘시장, 봄꽃축제, 공휴일·야간 등 특별가로정비)
 - 정비실적
 - 거리가게 및 노상적치물 정비 : 14,940건
 - 강제수거 : 646건(노점 392건, 노상적치물 254건)
 - 과태료 및 변상금 부과 : 177건 49,179천원(고발 : 4건)
- 불법광고물 정비 및 행정처분 현황

유동광고물					고정광고물			행 정 처 분					
계	현수막	입간판	에어 라이트	벽보 등	계	가로형 간판등	기타 (창문,지주)	합 계		이행강제금		과 태 료	
								건수	금액	건수	금액	건수	금액
30,613	29,690	763	83	77	300	148	152	771	712,959	53	52,530	718	660,589

□ 향후계획

- 대형·기업형 거리가게 집중 단속과 반복·상습 위반자 행정조치
- 지속적인 정비와 불법광고주에 대한 행정처분으로 불법행위 근절

□ 기대효과

- 도시미관 수준향상과 주민생활 불편해소
- 불법광고물 정비로 쾌적한 생활환경 조성 등

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
356,754천원	202,280	56.7

신길 재정비촉진지구 활성화 및 주택가 이면도로 진입로 확보로 지역 균형발전, 장기미집행 도로사업 시행으로 주민 숙원사업 해소

□ 사업개요

- 위 치 : 도림동 160-88(도림고가차도 남단) ~ 신길동421-16간(신길광장)
 - ※ 금회 工 공사 - 신길동 373-1(도림사거리) ~ 355-677(성락주유소)
 - ↳ 보상 - 신길동 401-11 ~ 399
- 규 모 : 도로확장 B=25→35m L=1,150m(기개설 710m, 미개설 440m)
 - ※ 금회 工 공사 - 도로확장 폭 25→35m, 연장 360m
 - ↳ 보상 - 토지 7필지(466㎡), 연장 90m
- 사업기간 : 2009년 ~ 2016년
- 총사업비 : 44,650백만원(시비:보상비 39,200 공사비 5,300 설계비 150)
- 연차별 투자계획

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진내용	용역	150	150					
	보상	39,200	29,100	3,500	500	6,100		
	공사	5,300	2,800	1,000	500	1,000		
총사업비		44,650	32,050	4,500	1,000	7,100		

□ 추진실적

- '14.2.27~12. : (성락교회측) 90m 실시계획인가고시 및 보상시행
- '14. 3. 5 : (성락교회측) 360m 공사착공
- '14. 12. : (성락교회측) 360m 공사준공(예정)

□ 향후계획


- '15. 1. : 공사 및 보상시행
 - 공사 : 도로확장 폭 25→35m, 연장 160m
 - 보상 : 토지 1필지(65㎡), 연장 17m

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
4,500,000 (시비 4,500,000)	500,000	11.1%

□ 위 치 도

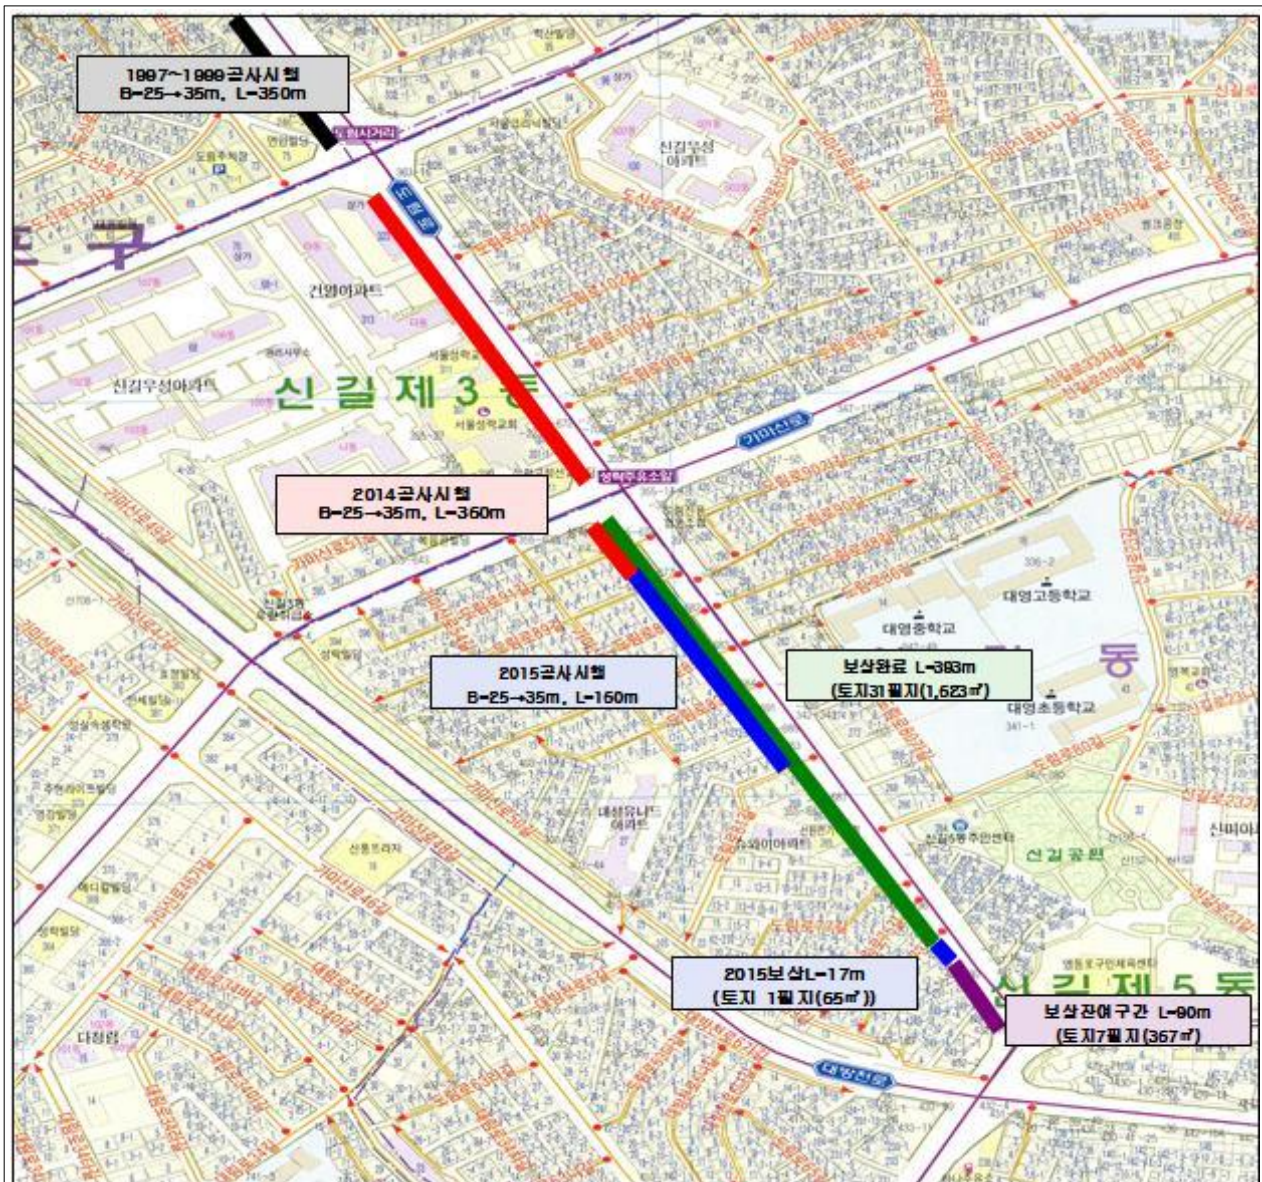

4 신도림역~도림동 연결로 개선공사

도 로 과

도림천으로 단절되어 있는 신도림역과 아파트 단지 간의 연결로의 설치로 보행로를 확보하여 신도림역의 보행접근로 및 편의성 향상을 도모코자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 신도림역 1호선 ~ 도림동 아파트단지간
- 규 모 : 연결로 폭 2.5m, 연장 102m
- 사업기간 : 2013년 ~ 2016년
- 총사업비 : 2,880백만원(시비)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역	180	50	130				
	보상							
	공사	2,700		123	2,577			
총사업비		2,880	50	253	2,577			

□ 추진실적

- '13. 5.13~10.24 : 타당성조사 용역 시행
- '14. 3.11~ : 기본 및 실시설계 용역 시행중

□ 향후계획


- '14.11 : 기본 및 실시설계 용역 준공 및 공사발주(예정)
- '15. 1 : 공사시행

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
253,000 (시비 253,000)	56,900	22.5%

□ 위치도

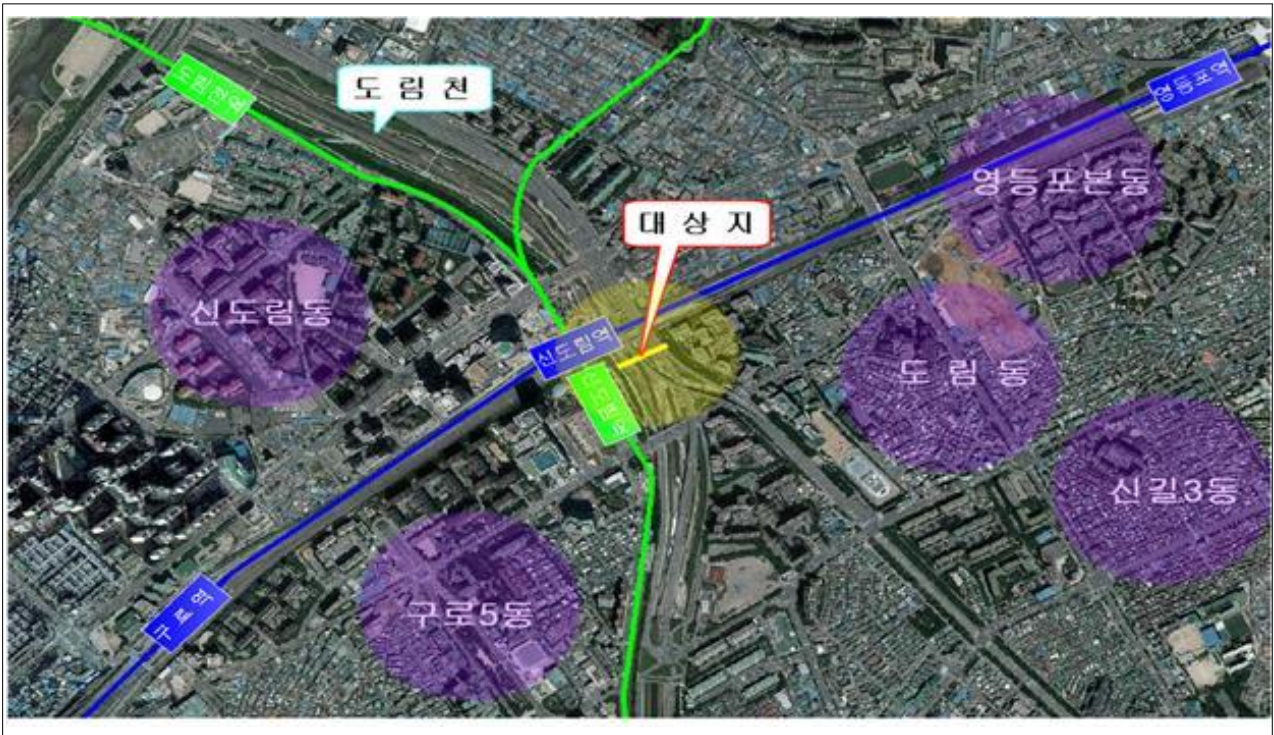

노후훼손 및 상태가 불량한 도로 및 도로시설물을 신속히 보수·정비하여 주민통행 불편을 해소하고 지속적인 도로 및 도로시설물 정비로 도로의 기능성 유지 및 안전사고를 사전예방 하고자 함

□ 포장도로정비 등 소파보수공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 아스팔트포장 190a, 콘크리트포장 9a, 보도포장 60a
- 기 간 : 2014. 3. 21 ~ 2015. 2. 28
- ※ “사회적 약자를 위한 도시환경 개선공사” 포함 시행
- 추진실적 : 포장도로의 노후·파손·침하 등 주민불편사항 해소 179개소
- 아스팔트, 콘크리트, 보도블록, 측구, 경계석 등 보수
- 소요예산 : 1,135,000천원 (구비)
- 집 행 액 : 1,092,927천원 (96%)

□ 도로시설물 설치 및 보수공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 규 모 : 보도육교, 과속방지턱, 안전웬스 등 도로시설물 유지관리
- 기 간 : 2014. 3. 5 ~ 12. 31
- 추진실적 : 보도육교 보수 14개소, 과속방지턱 신설 및 도색 등 220개소
지하보도·안전웬스 등 기타 도로시설물 유지관리
- 소요예산 : 500,000천원 (구비)
- 집 행 액 : 293,686천원 (59%)

□ 영등포동6가 35주변 도로포장공사

- 위 치 : 영등포동6가 35-1 ~ 32-8번지 간
- 규 모 : 아스팔트포장 7.6a
- 기 간 : 2014. 3. 3 ~ 5. 1
- 소요예산 : 100,000천원 (구비)
- 집 행 액 : 73,423천원 (73%)

□ 보라매역 주변 투수블록 포장공사

- 위 치 : 신길6동 보라매역 주변
- 규 모 : B=2~4m, L=340m, A=11.6a
- 기 간 : 2014. 3. 14 ~ 6. 14
- 추진실적 : 보도 정비 B=2~4m, L=340m, A=11.6a
- 소요예산 : 160,000천원 (시비50%:구비50%)
- 집 행 액 : 144,302천원 (90%)

□ 소요예산

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
합 계	1,895,000 (시80,000, 구1,815,000)	1,604,383	84.7%
포장도로정비 등 소파 보수공사(연간단가)	1,135,000	1,092,972	96%
도로시설물 설치 및 보수공사 (연간단가)	500,000	293,686	59%
영등포동6가 35주변 도로포장공사	100,000	73,423	73%
보라매역 주변 투수블록포장공사	160,000 (시80,000, 구80,000)	144,302	90%

□ 방음벽 교체공사

구 분 \ 공사명	여의도고등학교 앞	영등포초등학교 앞	비 고
위 치	여의도 국제금융로7길37	경인로77길3	
규 모	H=4~5m, L=56m	H=8m, L=55m	
사업기간	2014. 3.3 ~ 6.19	2014. 8.4 ~ 8.20	
사업예산	287,000천원 (시비)	121,000천원 (시비)	
집 행 액	260,143천원 (91%)	121,000천원 (100%)	

□ 여의대방로(시흥대로) 안전휰스 설치

- 위 치 : 여의대방로(원효대교 남단 ~ 구로디지털단지역)
- 규 모 : 방호울타리 설치 및 교체(L=1,639m)
- 기 간 : 2014. 3. 1 ~ 5. 31
- 소요예산 : 310,800천원 (시비)
- 집 행 액 : 310,535천원 (99%)

□ 오목교 엘리베이터 설치공사

- 위 치 : 양평동2가 오목교 앞
- 규 모 : 엘리베이터 설치, 주변 보행환경 개선
- 기 간 : 2014. 5. 8 ~ 11. 3
- 추진실적 : 엘리베이터 설치공사 중 (공정율 : 50%)
- 소요예산 : 350,000천원 (시주민참여예산)
- 집 행 액 : 24,630천원 (7%)

□ LED 보안등 설치공사

- 위 치 : 관내 전지역
- 기 간 : 2014. 7. 31 ~ 2014. 10. 28
- 규 모 : LED 50W이하 보안등 127등 설치
- 추진실적 : LED 50W 20등 교체 설치(공정율 : 15%)
- 소요예산 : 142,000천원 (국30,000, 시32,000,구비 80,000)

□ 경인로 가로등 개량공사

- 위 치 : 경인로(영등포로타리 ~ 도림교)
- 대 상 : 관내 가로등시설물
- 기 간 : 2014. 5. 26 ~ 11. 27
- 규 모 : 차도등 138등, 보행등 122등을 LED 155등으로 개량
- 추진실적 : 가로등기구 LED120W 43등 교체 (공정율 : 40%)
- 소요예산 : 870,000천원 (시비)

□ 소요예산

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
합 계	2,079,800 (국30,000, 시1,969,800 구80,000)	715,308	34.4%
여의도고등학교 앞 방음벽 교체공사(2차분)	287,000 (시비)	260,143	91%
영등포초등학교 앞 방음벽 교체공사	120,000 (시비)	120,000	100%
여의대방로(시흥대로) 안전휀스 설치	310,800 (시비)	310,535	99%
오목교 엘리베이터 설치공사	350,000 (시주민참여)	24,630	7%
관내 LED보안등 설치공사	142,000 (국30,시32,구80)	0 (원인행위 72,783)	
경인로 가로등 개량공사	870,000 (시비)	0 (원인행위 236,918)	

노후 불량 사각형거의 심각한 손상 부위를 보수·보강 및 개량하여 구조물의 내구성 및 안전성을 확보함으로써 안전사고를 사전에 예방하고 원활한 배수기능 및 관거 수명을 연장함

□ 사업개요 및 추진실적

공 사 명	규 모	사업비	추진실적	공정율
7건	총사업비	16,522		
신길동 400-17 ~ 355-698간 사각형거 보수·보강공사	하수박스 보수 ■2.0×1.5 ~ 2 ~ ■2.5×2.4m L = 853m.	800	○ 공사준공	100%
신길동 100-4 ~ 139-9외 7개소 사각형거 보수보강 공사	하수박스 보수 ■1.2×1.4 ~ 2■2.5×2.0m L = 2,144m.	1,500	○ 공사착공 ○ 보수·보강 950m 완료	45%
영등포7가 62-3 ~ 63-2외 3개소 하수관 개량공사	하수관개량 D600 ~ 1,200mm, L = 1,387m	1,600	○ 공사착공 ○ 지장물조사를 위한 줄파기 시행	10%
도림1배수분구 하수관거 종합 정비공사	하수관 신설,개량 D300~■2.0×2.0m, L=49.87km 보수·보강 ■1.0×1.0m ~ ■2.4×2.4m, L = 3.2km	9,272	○ 1,2구역 공사완료 ○ 5구역 공사착공	50%
양평동 77 ~ 265간 사각형거 개량공사	하수박스 보수 ■1.2×2.0 ~ 1.5m L = 750m.	1,400	○ 하수암거 부설 164m 완료	42%
신길동 도신로 하수관 개량공사	하수관개량 및 보수 D450 ~ 1,200mm L = 490m.	500	○ 공사준공	100%
신길역 주변 하수관 이설공사	하수관개량 D800 ~ 1,200mm L = 240m.	1,450	○ 하수관로 부설 55m 완료 ○ 노들길 가시설 설치	33%

☐ **향후계획**

- 2014년 11월 준공 : 3건
 - 신길동 100-4 ~ 136-9외 7개소 사각형거 보수·보강 공사
 - 양평동 77 ~ 265간 사각형거 개량공사
 - 신길역 주변 하수관 이설공사
- 2015년 준공 : 2건
 - 영등포7가 62-3~63-2외 3개소 하수관 개량공사(2월준공)
 - 도림1배수분구 하수관거 종합정비공사[5구역(3,5블럭)/4월준공]

☐ **소요예산**

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
16,522,000 (시 16,522,000)	14,203,812 (시 14,203,812)	86

노후·불량 하수도 개량과 빗물받이 등 하수시설의 철저한 유지관리로
수해예방 및 『구민의 삶의 질 향상』에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 노후·구배불량 하수도 개량
 - 하수관로 개량 : D300mm~D900mm, L=1,070m
 - 맨홀 및 빗물받이 개량 및 설치 : 185개소
- 하수도 준설 및 빗물받이
 - 하수관로 준설 : 총 연장 51.3km(중점관리구역 12.6km, 일반지역 38.7km)
 - 빗물받이 준설 : 총 15,571개소(간선 11,500, 지선 3,500)

□ 추진실적

- 하수관로 및 맨홀, 빗물받이 개량 및 신설(공정율 85%)
 - 하수관로 개량 : D300mm~D600mm, L=810m
 - 맨홀 및 빗물받이 개량 및 신설 : 136개소
 - 민원사항 처리건수 : 65건
- 하수관로 준설
 - 중점관리구역(대림동) : L=12.6km 5월말 준설완료(공정율 100%)
 - 일반지역(저지대 등) : L=33.4km 준설완료(공정율 90%)
- 빗물받이 준설
 - 중점관리구역(대림동) : 2,180개소 완료(공정율 100%)
 - 일반지역 : 간선 13,192개소, 지선 4,162개소 준설(공정율 100%)

□ 향후계획

- '14.12.30. : 하수관로(일반지역)준설 및 민원처리
- '14.12.30. : 빗물받이 준설 및 민원처리

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
2,428,000 (구 2,428,000, 시 499,000)	2,180,490 (구 1,681,490, 시 499,000)	90

실제 재난상황에 대응할 수 있도록 현장중심 위주의 훈련을 실시하여 재난 대응능력을 강화하여 국민의 안전에 최선을 다하고자 함

☐ 사업개요

- 재난 유형별 안전관리계획 수립으로 각종 재난 및 안전사고 사전대비
- 안전관리계획을 검증하고 재난위기대응 매뉴얼의 구체성 확보

☐ 추진실적

- 2014 영등포구 안전관리계획수립 및 책자 제작 배부 100부
- 영등포구 재난현장 통합지휘소 설치·운영에 관한 조례제정(2월)
- 지진가속도 계측기 설치 공사 중(10월 준공예정)
- 안전점검의 날 지정 운영(캠페인 실시 등) : 8회
- 저지대 주민 풍수해보험 지원 : 107세대
- 어린이 안전교육 순회 실시 : 41개소 1,545명
- 특정관리대상시설물 안전점검 실시 : 상반기 1,101개소
- 지역자율방재단 소양교육 : 1회 258명

☐ 향후계획

- 재난유형별 안전관리계획 및 재난대응 매뉴얼 정비 추진
- 안전문화운동 영등포구 안전문화운동협의회 구성, 선도과제 발굴 추진
- 2014 재난대응 안전한국훈련 실시
- 하반기 특정시설대상 일제(전수)조사 및 재난취약가구 안전점검 실시

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
64,661	15,261	23.6

우리구 관내에 교통시설물 중, 노후·파손된 시설은 교체 정비하고, 민원 요구사항이나 필요시에는 신규 설치함으로써 도로를 이용하는 주민들에게 편의를 도모하고자 함.

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 관내
- 기 간 : 2014년 년중
- 추진내용
 - 버스승차대 및 교통시설물 유지관리를 통한 구 이미지 개선
 - 도로안내표지판 정비를 통한 주변지역의 차량소통 원활
 - 봄꽃축제를 찾는 상춘객의 교통사고예방 및 원활한 행사운영 도모
 - 어린이보호구역 내 차량통행속도 저감을 통한 어린이 교통사고예방

□ 추진실적

- 버스승차대 유지보수 및 마을버스승차대 이전설치 7개소
- 도로안내표지판 문안수정 50개, 시선유도봉 정비 교체 50건
- 봄꽃축제 교통통제에 따른 입간판 설치 54개
- 스쿨존 과속 경보시스템 신설 1개소(여의도 초등학교)

□ 기대효과

- 스쿨존 과속 경보시스템 신설로 어린이 교통사고 예방
- 교통시설물 유지관리 정비로 교통사고 예방
- 버스승차대 유지관리를 통한 버스이용객들의 대중교통편의 증진

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
432,973 (시210,000, 구222,973)	268,244 (시198,398, 구69,846)	61.95%

자전거 이용 활성화로 환경오염을 줄이고 국민의 건강 증진 및 레저 문화 수준 향상을 위한 자전거 이용 시설물에 대한 관리를 철저히 함으로써 국민의 건강과 행복증진에 기여코자 함

□ 자전거이용 활성화

○ 사업개요

- 자전거도로 현황 : 총 19개구간 21.4km
- 무인 자전거 이용시설 : 3개소 (구청, 당산, 영등포역)
- 수리소 운영 현황 : 3개소 (구청, 당산, 대림)

○ 추진실적

- 2014. 3월 : 대림수리소 및 대여소 홍보물 제작 및 배포(비치)
- 2014. 6월 : 어린이 자전거 교통안전체험장 전기공사 시행
- 2014. 7월 : 자전거도로 시선유도봉 정비공사 시행
(설치 232개 철거/이전 168개, 반사지교체 67개)
- 2014. 8월 : 교통안전체험장 차량진입 방지공사 및 자전거도로 미끄럼방지 포장(L=130m, B=1.6m)

○ 향후계획

- 매월 1회 자전거도로 정기적 순찰 및 정비

○ 소요예산 : 49,000천원 (구비 100%)

□ 자전거 주차타워 운영

【 무인 자전거 이용시설 현황 】

구 분	운영규모	운영방법	설치연도/비용
영등포구청	120대	보관(80대) 대여(40대)	2008년/780백만원
당산역	20대	대여만	2009년/83백만원
영등포역	162대	보관만	2010년/762백만원 (구청-5억, 시비, 철도-262백만원)

- 사업개요
 - 영등포역 시설 구청과 철도 50:50으로 유지비용 분담
 - 영등포구청 및 당산역 이용시설은 유지보수 추진
- 추진실적 : 개인자전거 주차 4,884대, 대여자전거 이용 8,781대
- 향후계획
 - 무인자전거 이용시설 유지보수(연간단가) 추진 및 수리소 정상운영
- 소요예산 : 63,600천원 (구비 100%)

□ 방치 자전거 수거

- 사업개요
 - 관련근거 : 자전거이용활성화에 관한 법률 제20조 및 동법 시행령 제11조
 - 수거대상 : 10일이상 공공장소에 무단으로 방치되어 통행을 방해하는 자전거
 - 추진절차 : 방치자전거 스티커부착(10일) → 수거 → 고시공고(14일) → 매각
 - 매각업체 : 2014년 초 서울시로부터 통보된 우리구 지정업체
- 추진실적 : 415대
- 향후계획
 - 순찰반 구성 : 일자리사업 일환으로 배치되는 근무자 및 담당자
 - 수거일정 : 매월 25일까지 방치자전거 선정하고 매월말 일괄 수거
- 소요예산 : 3,000천원 (구비 100%)

□ 자전거보관대 유지관리

- 사업개요
 - 시설현황 : 관내 123개소 3,854대
 - 사업기간 : 2014년 년중
 - 사업내용 : 자전거 보관대 설치 및 유지관리
- 추진실적
 - 2014. 3월 : 자전거보관대 설치 및 유지관리 정비공사(연간단가) 시행
 - 2014. 7월 : 작업지시 (1차)
 - 2014. 8월 : 1차 작업완료 (신설 15대, 철거 40대 등) 및 2차 작업지시

○ 향후계획

- 자전거보관대 설치 및 이설 (웬스형, 스탠드형), 및 지붕 및 공기 주입기 교체, 난간 파손시 보수 등 지속 추진

○ 소요예산 : 13,000천원 (구비 100%)

☐ 소요예산

(단위:천원)

사 업 명	예 산 액	집 행 액	집행율(%)
합 계	128,600	40,597	31.57%
자전거이용 활성화	49,000	16,780	34.25%
자전거 주차타워 운영	63,600	21,205	33.34%
방치자전거 수거	3,000	2,612	87.06%
자전거 보관대 유지관리	13,000	0 (원인행위 11,900)	0%

전국 어디에서든 자동차 등록을 할 수 있게 됨에 따라 자동차 및 이륜자동차의 신규, 이전 및 변경에 관한 등록업무를 신속하고 친절하게 처리하여 신뢰받는 행정과 국민에게 감동을 주는 민원 서비스를 제공하고자 함

□ 사업목표

- 신속하고 친절한 자동차등록민원업무 처리로 등록민원 만족도 향상
- 자동차 등록 현황

계	승용차	승합차	화물차	특수자동차	이륜자동차
155,560	108,731	6,795	21,999	556	17,479

□ 추진실적

- 자동차 등록 민원 현황

2014.8월말 현재

(단위:건)

계	신규 등록	이전등록 (명의변경)	말소 등록	변경 등록	압류 등록	저당 등록	등록원부 발급·열람	이륜차	기타
396,154	4,949	25,457	6,630	18,744	118,237	4,031	212,249	4,461	1,396

* 1일 평균: 2,475건, 기타: 임시운행, 포털민원, G4C민원 등

□ 향후계획

- 자동차 및 이륜자동차 민원처리 통합 창구 운영
- 자동차 검사, 의무보험 가입 및 상속 이전등록 사전안내
- 불법 명의 자동차 자진신고 접수창구 운영

□ 기대효과

- 선진 자동차 문화의 구현
- 자동차 운전자의 준법정신 고취

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
38,434(구비)	21,189(구비)	51.1

13 자동차손해배상보장법 위반자 처리

자동차관리과

자동차손해배상보장법 제8조(운행의 금지)를 위반한 의무보험 미가입 차량 운행 위반자와 자동차관리법 제26조(자동차의 강제처리)를 위반한 무단방치 차량 소유자를 관련 법규에 의거 처벌함으로써 건전한 교통 문화를 정착시키고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 1. 1 ~ 12. 31
- 사업대상 : 의무보험에 미가입된 차량 운행 위반자
자동차를 무단 방치한 차량 소유자 또는 점유자

□ 추진실적

- 의무보험 미가입 적발 및 처리 추진내역

2014.8월말 현재

(단위:대,천원)

구분	적발 및 접수 내역				처리내역						처리 중
	계	전년도 이월	국토부 통보	타기관 통보	계	범칙금 부과		검찰 송치	자체 종결	타기관 이첩 (이송)	
						건수	금액				
계	1,455	932	332	191	555	34	12,300	187	-	334	912
승용차	1,423	903	332	188	540	24	11,300	187	-	329	895
이륜차	32	29	-	3	15	10	1,000	-	-	5	17

- 무단방치 차량 처리 추진내역

2014.8월말 현재

(단위:대,천원)

구분	접수 내역				처리내역						처리 중
	계	전년도 이월	120	전화	계	자진 처리	무등록 폐차	특사경 이첩	범칙금부과		
									건수	금액	
계	211	33	66	112	149	84	45	15	5	2,600	62
승용차	63	12	16	35	40	23	-	15	2	2,000	23
이륜차	148	21	50	77	109	61	45	-	3	600	39

☐ 향후계획

- 의무보험 미가입 적발 및 처리 추진
 - 2013년 전담팀 구성으로 공소시효(5년) 도래사건 우선 처리
 - 2011년 이전 발생 미처리건(2015년 공소시효 만료건): 104대
 - 2011년, 2012년 접수분 집중처리: 458대
 - 의무보험 미가입 차량운행 위반자(누적분) 중 공소시효(5년) 도래자 우선 처리
 - 불출석자에 대하여 주소지 거주 확인 등 소재수사 강화로 사건의 신속 처리
- 무단방치 차량 신고 접수 즉시 차량 소유자 확인 후 본인 연락처를 통해 자진 처리토록 유도

☐ 기대효과

- 자동차 관련 법규위반자에 대한 신속하고 공정한 수사업무로 행정의 신뢰감 고취
- 의무보험 미가입 차량으로부터 발생하는 피해자를 보호하여 건전한 교통문화 조성

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
14,328(구비)	9,383(구비)	65.4

주차난이 심각한 주택 밀집 지역 및 공영주차장 미설치 지역에 공영주차장을 건설하여 주차난을 해소하고 주민생활 편의를 증진하고자 함

□ 사업개요

- 사업기간 : 연중
- 사업위치 : 영등포구 전지역(뉴타운, 재개발사업구역 제외)
- 사업내용
 - 주택 밀집 지역 내 주차장 건설부지 확보
 - 주차 가능 도로 전수조사로 공영주차장 확보

□ 추진실적

- 별관청사 공영주차장 건설【완료】
 - 위 치 : 선유동1로 80
 - 규 모 : 평면식 61면(997.73 m^2)
 - 급 지 : 3급지
 - 운영일자 : 2014. 8. 11.
 - 운영방법 : 영등포구시설관리공단 위탁 운영
- 경부 제3녹지 지하공영주차장 실시설계용역 준공 : 2014. 8.22
 - 지하2층 자주식 143면(5,622 m^2)

□ 향후계획

- 경부 제3녹지 지하공영주차장 건설 추진
 - 2014. 9월 ~ 10월 : 공사발주 및 계약
 - 2014. 10월 ~ 2015. 12월 : 공사착공 및 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
11,182,513 (사비 3,018,000, 구비 8,164,513)	268,713 (사비 0, 구비 268,713)	2.4

15 올바른 주차의식 고취를 위한 주차질서 확립 주차문화과

차량증가로 인해 갈수록 심각해지는 주차질서를 바로잡아 도로에서의 위험을 방지하고 교통 및 보행자 안전을 확보하여 도로 본연의 기능을 유지하는 등 시민이 자발적으로 참여하는 올바른 주차질서를 확립하고자 함

□ 사업개요

- 단속지역 : 6개 지역(권역별 단속조 책임구역제 순환 지정 운영)
- 단속인력 : 31명(주차단속원 28명, 기동반 2명, 장애인주차단속 1명)
- 단속방법 : 일반·특별단속구역 제도 위주, 중점단속구역 단속 후 견인

□ 추진실적

- 불법주·정차 단속 실적 : 87,865건
 - 인력단속 54,105건/ CCTV 단속 33,760건
 - 주정차위반 의견진술 심의 : 3,118건
- 봄꽃축제 추진(4. 3 ~ 4.10(8일간))
 - 단속실적 : 2,077건(과태료·견인 1,272건, 제도 805건)
- 직무 및 친절교육 : 8회(주차단속공무원)
- 주정차단속 휴대폰 문자알림 서비스 시행

□ 향후계획

- 주차단속원 조별 책임구역제로 불법주정차 단속 전문성 제고
- 시민신고제 및 장애인전용주차구역 내 불법주정차 단속 실시
- 중점단속구역, 소통장애 유발 구간, 취약지역 집중 단속 실시

□ 기대효과

- 도로 기능을 유지하고 주민의 편의를 도모하는 등 올바른 주차의식 고취
- 시민이 자발적으로 참여하는 올바른 주차질서의식 공감대 형성

□ 소요예산

(단위 : 천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,455,953(구비)	802,683(구비)	55.1%

Ⅲ 중점사업 추진실적



1 경인로 에너지절약형 LED간판 교체사업 건설관리과

사람중심의 쾌적하고 아름다운 거리를 조성하고자 무질서하게 난립되어 있는 불법 광고물을 일제 정비하고, 작고 아름답게 디자인된 광고물로 교체 설치함으로써 가로경관을 개선하고자 함

☐ 사업개요

- 사업명 : 경인로 에너지절약형 LED간판 교체사업
- 사업구간 : 영등포역앞삼거리~영등포로터리 양쪽 0.5km구간
- 사업기간 : 2014. 6 ~ 11월
- 대상시설 : 125점포(1개 점포당 최대 2,500천원 지원)

☐ 추진실적

- '14. 7. 24 : 정비시범구역 지정 및 표시제한 고시
- '14. 7. 31 : 區와 경인로 간판개선주민위원회 간 사업추진 협약체결
- '14. 8. 11 : 간판디자인 및 제작·설치 업체 모집 공고
- '14. 8. 22 : 업체별 제안서 접수

☐ 향후계획

- '14. 9. 2 : 제안서평가위원회 개최 및 협상적격자 선정
- '14. 9~11 : 간판시공 및 사후정산

☐ 소요예산 - 기금

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
312,500 (시 187,500, 구비 125,000)	0 (원인행위 20,000)	0

당산동~샛강생태공원간 보행자 및 자전거 연결로를 설치하여 샛강생태공원 및 여의도 방면 이용에 편의를 제공하여 한강시민공원 및 여의도 공원 등의 휴식공간 및 문화 공간의 접근성 향상에 기여하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 당산동 버드나루로14길 ~ 샛강생태공원
- 규 모 : 연결로 설치 폭 5.0m, 연장 138m
- 사업기간 : 2010년 ~ 2016년
- 총사업비 : 7,500백만원(시비 3,500, 구비4,000)

(단위:백만원)

구 분		계	기투자	2014	2015	2016	장 래	비고
추진 내용	용역(구비)	472	182	290				
	공사 시비	3,500		1,000	2,500			
	구비	3,528				3,528		
총사업비		7,500	182	1,290	2,500	3,528		

□ 추진실적

- '10. 2.17 ~' 10.14 : 타당성 조사 및 기본계획 용역시행
- '10.12. 7 ~'11.02.10 : 보도육교 설계 현상공모 공고시행
- '13.10.10 : 투자심사 결과 통보(조건부)
- '14. 2. 7 ~ : 기본 및 실시설계 용역시행중

□ 향후계획

- '14.11 : 기본 및 실시설계 용역준공(예정)
- '15. 1 : 공사시행(예정)

□ 기대효과

- 여의도 샛강 생태공원으로의 접근성 확보로 이용 편의성 제공
- 자연생태계를 활용한 생활체육(자전거) 활성화로 시민 삶의 질 향상

☐ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
1,290,000 (시비 1,000,000, 구비 290,000)	128,345 (구비 128,345)	9.9%

☐ 위치도



☐ 조감도



3 국회 앞 도로 동공발생에 따른 사각형거 개량 추진 안전치수과

국회의사당 앞 동공발생에 대한 원인조사 결과, 노후 하수암거의 누수로 인한 것으로 판명됨에 따라, 조속한 시일 내 기존 사각형거를 개량함으로써 추가적인 동공 발생으로 인한 안전사고를 예방하고자 함

□ 동공발생 및 원인

- 위 치 : 여의도 국회의사당 정문 앞 국회대로(서강대교 진행방향)
- '14. 6.19. ~ 7.17. : 동공발생(총 3회)
- '14. 7.21. ~ 7.22. : 전문가 합동조사 실시(서울시 주관)
 - ※ 박창근 교수 외 2명 등 외부전문가 합동조사 실시
- 현장조사 결과 : 동공 발생원인은 하수관로(1.4×1.0) 노후로 균열이 발생하여 누수로 인해 점차 동공으로 확대.

□ 추진계획

- 【1단계】 최근 동공이 발생한 구간의 노후 하수관로 교체 시행
 - 규 모 : 사각형거 개량 □1.4×1.0m, L=80m → □1.5×1.5m, L=80m
 - 사업기간 : 2014. 09. ~ 2014. 12.
 - 총사업비 : 1,000백만원(시비) - 기 확보
- 【2단계】 여의도 지역 하수관로에 대한 보수·보강 시행
 - 규 모 : □1.4×1.0m ~ □2.8×1.5m, L=5.62km
 - 사업기간 : 2015.01. ~ 2015.12.
 - 총사업비 : 6,395백만원(시비)

□ 추진실적

- '14. 7.15. : '15년 서울시 예산요청(6,395백만원)
- '14. 8.06. : 실시설계용역 착수

□ 향후계획

- '14. 9.04. : 실시설계용역 준공
- '14. 9. ~ 12.30. : 공사시행

○ '15. 1. ~ 12. : 여의도지역 사각형거 보수·보강 시행

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
7,395,000 (시 7,395,000)	22,000	2.2

□ 현 황 도



유수지에서 발생하는 악취를 저감할 수 있는 저류조 및 주민편익 시설을 설치하여 쾌적한 생활환경 조성 및 하천수질 개선에 기여

□ 사업개요

- 위 치 : 양평1유수지 (선유로35길 22)
- 규 모
 - 지하 저류조 : 46,000 m^3
 - 상부체육시설 : 30,000 m^2 (축구장, 배드민턴 등11,000 m^2 , 천수공간 19,000 m^2)
- 유수지 현황

- 유역면적 : 4.525 km^2 (영등포동, 문래동, 양평동 일대)
 - 유수지 면적 : 52,000 m^2 (저수용량 : 115,000 m^3)
 - 활용현황
 - 부분 복개상태로 복개된 부분 주차장으로 사용
 - 미 복개부분은 생태공원으로 조성 활용
- 공사기간 : '14.01. ~ '16.12.
- 총사업비 : 31,194백만원(시비)

□ 추진실적

- '13. 7.04. ~ '14. 7.03. : 타당성조사 및 기본계획수립용역(서울시)

□ 향후계획

- '14.09. ~ '15.05. : 기본 및 실시설계용역 시행(서울시)
 - 기본설계(물관리정책과) + 실시설계(도시기반시설본부)
- '15.06. ~ '16.12. : 공사시행 및 완료(도시기반시설본부)


□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
1,000,000 (시 10,000,000)	서울시 추진중	-

□ 타당성조사 및 기본계획 수립용역(안)

■ 지하저류조(저류조면적 9,200㎡, 저수용량 46,000㎥)

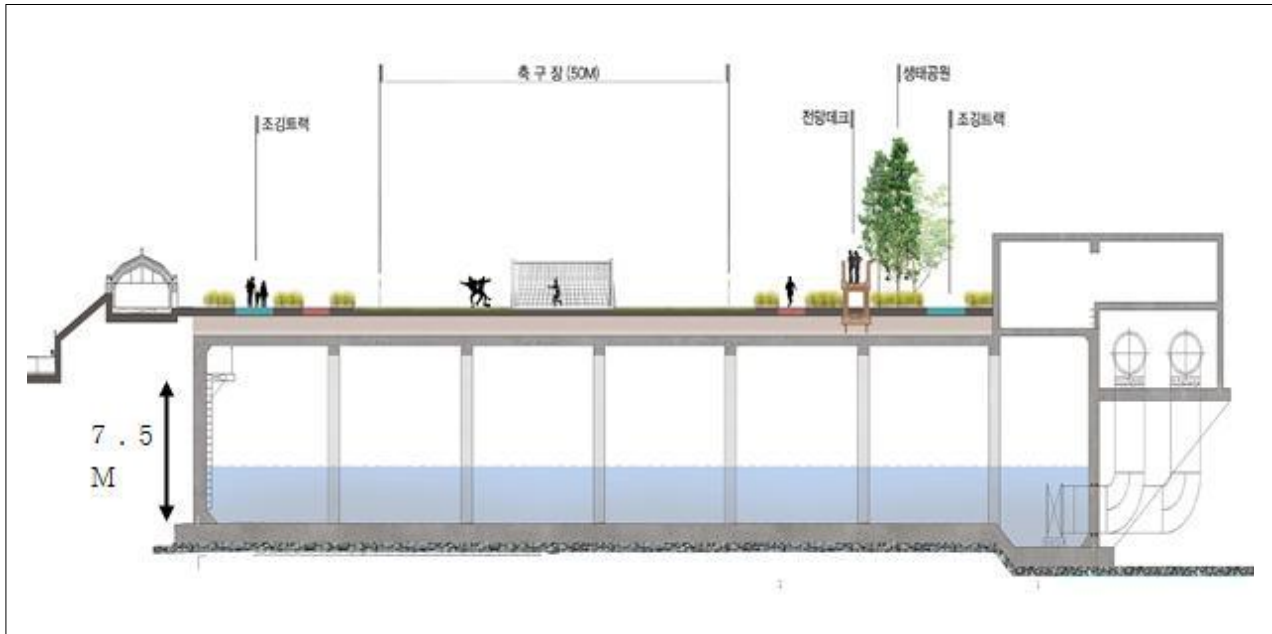

■ 체육시설 및 공원조성(안)



2013년도에 안양천에 조성된 어린이 교통안전체험장을 금년부터 전문 교육 기관에 위탁 추진하여 어린이 교통사고 예방과 올바른 교통문화 의식을 고취하고자 함

☐ 사업개요

- 위 치 : 영등포구 양화동 10-8번지 (안양천 갈대1구장 옆)
- 면 적 : 2,378 m^2
- 운영방식 : 위탁운영 (자전거문화발전연구소, 2014.5 ~ 2017.4)
- 교육기간 : 매년 7개월 (3월~6월, 9월~11월)
- 위탁사업내용
 - 어린이 교통안전체험장 홍보 · 안내 및 교육대상 모집
 - 교육프로그램 개발 및 운영 : 교통안전 자전거 타기 기본교육
- 교육대상 : 안전교육을 희망하는 단체(어린이집, 유치원) 등 개인
- 교육신청방법 : 교육 예약 사이트(www.riverbike.co.kr)에 신청

☐ 추진실적

- 2014.5. 1 : 정상 위탁 운영 개시
- 2014.8.30 : 19개 단체(시설) 및 개인 : 632명 교육완료

☐ 향후계획

- 우기로 인해 중단된 이후, 9월부터 정상 교육 시행

☐ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
39,500 (구비 39,500)	13,680 (구비 13,680)	34.6%

영등포역~영등포시장 사거리 구간에 대하여 현재의 열악한 보행환경을 개선하기 위하여 차로를 축소하고 보행공간을 확충하기 위한 대안을 마련하기 위해 타당성 기본계획 수립용역을 추진함

□ 사업개요

- 용역명 : 영중로 보행환경개선을 위한 타당성 기본계획 수립
- 위치 : 영중로 (영등포역 ~ 시장사거리) L=390m
- 용역기간 : 2013. 12. 5 ~ 2014. 7. 16
- 용역금액 : 20,900천원 (시비)

□ 추진실적

- 2013.10.30 : 용역비 시비확보
- 2013.12.05 : 용역 착수
- 2014.3 ~ 7월 : 보고회 2회 개최
- 용역결과 : 영등포역 → 시장사거리 방면 차로축소 및 보도확장
 - 개선내용 : 차로는 6차로 → 5차로 축소, 보도는 편도 1.6~2.4m 확폭
- 2014.8.26 : 2015년도 시비 확보요청(보행자전거과)
 - 소요예산 : 300,000천원(시비:50%, 구비:50%)

□ 향후계획

- 2014.10월 ~ 2015.2월 : 서울지방경찰청 교통규제 협의 추진
- 2015.3월 ~ 5월 : 실시설계 용역 추진
- 2015.7월 ~ 11월 : 공사 추진

□ 기대효과

- 보행공간 확보로 보행자통행 및 버스승객 보행환경 개선

□ 소요예산

(단위:천원)

예산액	집행액	집행율(%)
22,000 (시 22,000)	20,900 (시 20,900)	95%

경부 제3녹지 지하에 공영주차장을 건설하여 주택가 주차난을 해소하고 지하철 1호선 대방역 이용객들이 환승주차장으로 이용할 수 있도록 함으로써, 토지 이용의 효율성을 높이고 이면도로 통행권 확보로 지역 주민들의 생활 편의를 도모하고자 함

□ 사업개요

- 위 치 : 영등포로 407 일대(신길동 70-50호)
- 규 모 : 지하2층 자주식 143면(건축연면적 5,622 m^2)
- 대지면적 : 3,745 m^2
- 총사업비 : 9,040백만원(시비 6,018 구비 6,022)
- 사업기간 : 2014. 10월 ~ 2015. 12월

□ 추진실적

- 1978년 8월 : 도시계획시설 '녹지' 결정(서울시 고시 제429호)
- 2013년 5월 : 서울시 투자심사 완료
- 2013년 11월 : 서울시 2014년 예산 반영 (3,018백만원 중 1,600백만원)
- 2013년 10월 ~ 2014. 8월 : 실시설계용역 추진 완료

□ 향후계획

- 2014. 9월 ~ 10월 : 공사발주 및 계약
- 2014. 10월 ~ 2015. 12월 : 공사착공 및 준공

□ 소요예산

(단위:천원)

예 산 액	집 행 액	집행율(%)
9,040,000 (시비 3,018,000, 구비 6,022,000)	0 (2014.10월 발주예정)	0
